

H16名古屋第2合同庁舎耐震改修工事ニュースNO. 4

○防災拠点としての機能を確保するために、B1階の柱頭に免震装置を組み込む中間階免震工法を用いて改修を行います。

平成17年9月 発行

工事状況のお知らせ



南面掘削，基礎躯体工事中。



北面杭工事打設中。





東面掘削準備工事中。

8月1日より庁舎北側出入り口を閉鎖し、東・西側からの出入りとなりました。

9月の主な作業内容について

- ・南面の掘削、及び基礎躯体工事を行います。
- ・北面の杭打ち工事を引き続き行い、9月下旬完了見込みです。
- ・東面の山留め杭打ち工事を行い、10月下旬完了見込みです。
- ・B2階の躯体補強工事として西側より各書庫、倉庫、冷凍機室等の柱まわり壁を撤去後、柱壁の補強工事を引き続き行います。
- ・B1階の免震工事として外周部躯体の解体、柱の柱頭部に補強工事を引き続き行います。
- ・エレベーター工事、3・4号機は停止します。1・2号機はB2～8階稼働します。5・6号機は2～8階稼働します。
- ・新3号機 B2階～1階 EVシャフト内鉄骨工事を行います。
- ・下旬よりB1階免震装置取付予定です。(11月初旬見学会を予定しています)

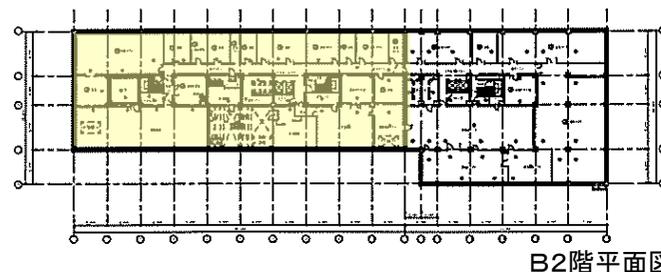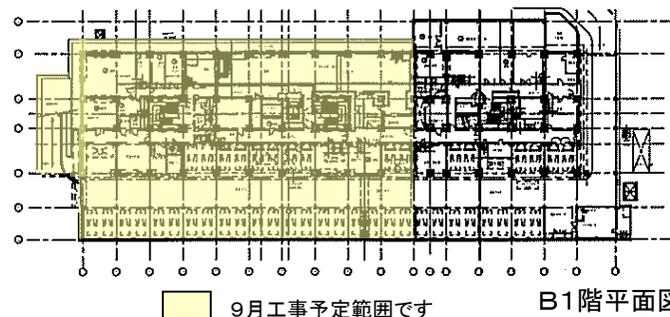

名古屋第2地方合同庁舎耐震改修建築工事

発注者 国土交通省中部地方整備局

設計 国土交通省中部地方整備局
(株)梓 設計

監理 国土交通省中部地方整備局

営繕部保全指導・監督室

(株)梓 設計

施工 建築 (株)竹中工務店

電気 東光電気工事(株)

機械 三機工業(株)

ELV 日本オーチス・エレベータ(株)

* 工事についての質問等は下記までご連絡下さい

中部地方整備局 営繕部

保全指導・監督室 細川 TEL 052-953-8196
