

H16名古屋第2合同庁舎耐震改修工事ニュースNO. 12-1

○防災拠点としての機能を確保するために、B1階の柱頭に免震装置を組み込む中間階免震工法を用いて改修を行います。

平成18年5月 発行

■ 5月の主な作業内容

- ・東面は、一部、杭打ち重機でH鋼を打設した後、地下外壁補強工事を行います。
- ・北面の東半分を工事範囲とし、免震工事を進めます。
- ・B2階は、柱・梁の補強工事を引き続き行います。
- ・B1階は、免震装置取付けを引き続き行います。
- ・エレベーター1、2号機の運転を取り止め、全階工事とします。

■ 設備等の利用制限

○庁内への出入口(図-2)

- ・庁内への出入口が変わりました。(4/18~11/中予定)

○エレベーターの運転状況(図-1)

- ・1、2号機は全階で運転停止(4/21~8/末予定)、新3号機はB2階~8階まで、5、6号機は1階~8階までの運転となっています。

○階段(図-1)

- ・東階段(~11/末予定)・中央階段(~10/末予定)の1階より下は、通行止めとなっていますので、地階へは西階段を利用して下さい。
- ・避難階段は、原則として西・中央階段を使い、東階段は使用しないで下さい。

○自転車置場(図-2)

- ・自転車置場が西側が変わりました。

* 工事についての質問等は下記までご連絡下さい

中部地方整備局 営繕部
保全指導・監督室 奥村 TEL 052-953-8196



東面 山留杭打状況



正面玄関庇 仕上状況



エレベーター5・6号機 工事完了



B1F 免震工事 庁舎中央列の柱
免震装置(球体転がり支承)取付

H16名古屋第2合同庁舎耐震改修工事ニュースNO. 12-2

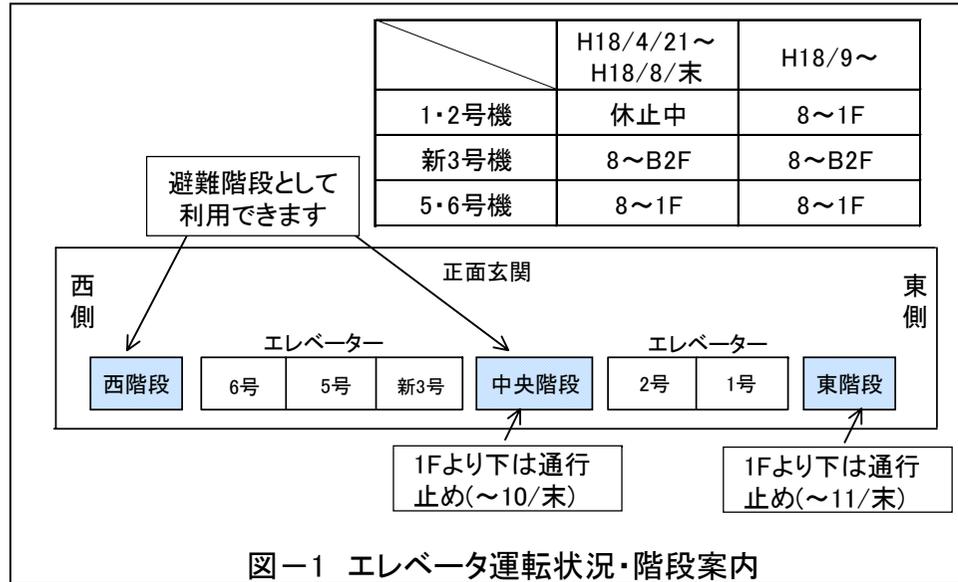


図-1 エレベーター運転状況・階段案内

平成18年4月18日からの庁舎出入口等通行可能時間

	平日				休日	
	5:00~ 8:00	8:00~ 18:00	18:00~ 22:00	22:00~ 5:00	5:00~ 22:00	22:00~ 5:00
① 正面玄関(庁舎1F北側)		○				
② 西 玄関(庁舎1F西側)		○				
③ 東 玄関(庁舎1F東側)	○		○		○	
④ 守衛室裏東口(庁舎1F東南側)				○		○
⑤ 東側出入口(庁舎敷地東南側)	○		○	○	○	○

○印 通行可

