

H16名古屋第2合同庁舎耐震改修工事ニュースNO. 14-1

○防災拠点としての機能を確保するために、B1階の柱頭に免震装置を組み込む中間階免震工法を用いて改修を行います。

平成18年7月 発行

■ 7月の主な作業内容

- ・北面の東半分は免震工事中で、正面玄関の庇・階段の工事が完了する予定です。
- ・B2階は、柱・梁の補強工事と湧水ピット内補強工事を行なっています。
- ・B1階は、免震装置取付けが最後の柱となります。
- ・エレベーター1、2号機は全階工事中です。
- ・階段は中央と東階段の地下階で工事中です。

■ 設備等の利用制限

○庁舎出入口等通行可能時間(NO.14-2)

- ・①正面玄関、②西玄関、③東玄関、⑤東側出入口の通行可能時間が、7月3日より18時から18時30分に変更になりました。

* 工事についての質問等は下記までご連絡下さい

中部地方整備局 営繕部
保全指導・監督室 奥村 TEL 052-953-8196



B1階 免震工事


エレベーター1・2号機前のホールに柱を新たに構築し、免震装置を取付ます。



B1階 免震工事

免震装置をそろばんのようなコロを使って、柱に据え付けます。

B1階 免震装置取付状況

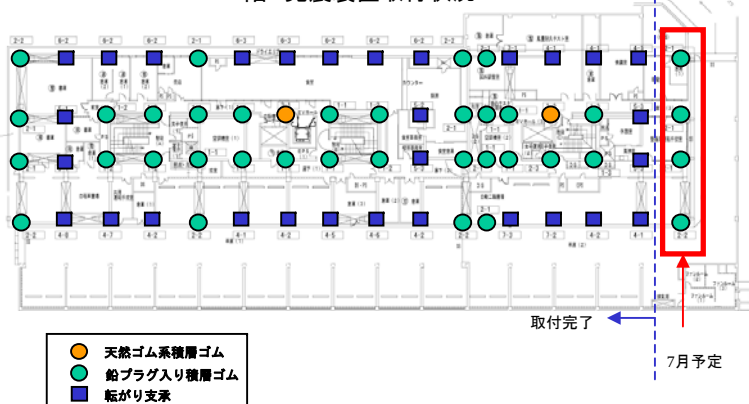

正面玄関 鉄骨底建方中



B1階 食堂

コンクリート工事は完了。
8月より内装仕上に着手します。

H16名古屋第2合同庁舎耐震改修工事ニュースNO. 14-2

平成18年7月3日からの庁舎出入口等通行可能時間

○印 通行可

	平 日				休 日	
	5:00～8:00	8:00～18:30	18:30～22:00	22:00～5:00	5:00～22:00	22:00～5:00
① 正面玄関(庁舎1F北側)		○				
② 西 玄関(庁舎1F西側)		○				
③ 東 玄関(庁舎1F東側)	○		○		○	
④ 守衛室裏東口(庁舎1F東南側)				○		○
⑤ 東側出入口(庁舎敷地東南側)	○		○	○	○	○

