

H16名古屋第2合同庁舎耐震改修工事ニュースNO. 15

○防災拠点としての機能を確保するために、B1階の柱頭に免震装置を組み込む中間階免震工法を用いて改修を行います。

平成18年8月 発行

■ 8月の主な作業内容

- ・B1階の免震工事は、仮固定材を外し、オイルダンパーの取付を8月中旬に完了して、免震の機能が発揮される予定です。
- ・B2階は、書庫・倉庫関係は今月でほぼ完了する予定です。
- ・エレベーター1、2号機は今月で完了する予定です。
- ・B1階の免震工事が完了したところから、内装仕上工事をはじめます。

* 工事についての質問等は下記までご連絡下さい

中部地方整備局 営繕部
保全指導・監督室 奥村 TEL 052-953-8196



B1階 中央階段


鉄骨の階段を取り付けました。



B1階 免震工事 柱切断

マイナス20℃の冷気でワイヤーを冷却しながら柱を切断する工法を採用してます。

B1階 免震装置取付状況

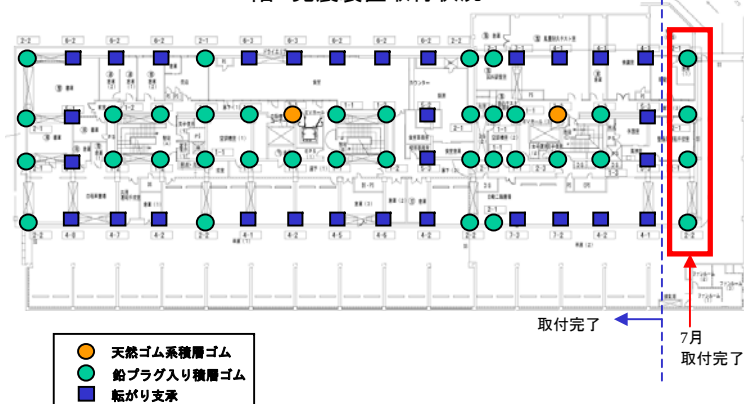

B1階 免震工事

最後の柱の免震装置を取付完了しました。



仮設工事

庁舎南側にあった重機作業用の仮設ステージを解体しました。
