

平成30年9月12日
国土交通省中部地方整備局
越美山系砂防事務所

(第2報) 揖斐川町坂内ナンノ谷で砂防堰堤が被災、 応急対策工事に着手

被災した砂防堰堤の被災拡大を防ぐため、堰堤付近にコンクリート製ブロックを設置する応急対策工事に11日から着手しました。

○応急対策内容

工事用道路及びクレーンヤードの造成後、本堤上下流に複数のコンクリートブロック（単体重量5t）を設置し、被災部分の拡大を防ぎます。

ブロックの設置は、概ね1週間以内に完了するよう予定しています。

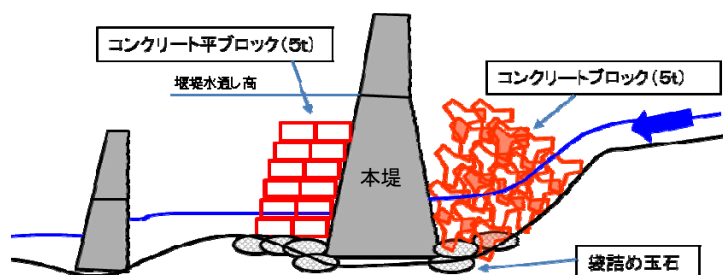


図1 応急対策工事イメージ

注) ブロックの配置等は現地状況により変更される場合があります

○9月11日の工事状況

町道から堰堤までの工事用道路（L=200m）を施工しました。

現場には照明車を配置し、夜間も工事を実施しています。



写真1 施工箇所を照らす照明車



写真2 工事用道路施工状況



写真3 完成した工事用道路

○問い合わせ先

越美山系砂防事務所

副所長

片桐知治

Tel0585-22-2161

工務課長

丹羽隆志

Tel0585-22-2162
