

三遠南信自動車道「引佐ジャンクション」(発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



Inasa Jct News

引佐ジャンクション便り

発行第3号
平成23年8月1日

磐田出張所安全協議会
責任者：土屋 直之
TEL 544-0660
FAX 544-0660

平成21年度 三遠南信四方浄舗装工事

大有建設株式会社 児嶋053-544-0985

工事進捗状況

7月末現在、本線部・ランプ部のアスファルト安定処理が終了しました。8月より基層工の施工に入ります。先月同様、材料運搬時には多くの大型ダンプの通行が予想されます。また、引六線では歩道整備のため排水構造物の施工を行っています。今後も安全第一で工事を進めてまいります。近隣の皆様、御通行中の皆様にはご理解とご協力をお願いします。



引六線施工は歩行者通路を設けておりますので御通行の際はこちらをお通り下さい。



本線 アスファルト安定処理施工状況



本線 アスファルト安定処理完了全景



平成22年度 三遠南信引佐JCTランプ橋床版工事

TSUCHIYA(株) 高木 053-544-0090



【ランプ橋全景】

当社は、引佐JCTのGランプ、Fランプの床版橋工事を担当しています。
*RC床版橋とは・・・鋼板にて構成された鋼桁・鋼箱桁等の上部に鉄筋とコンクリートを組合せ構築した床版で一般的な在来工法の橋梁です。

【進捗状況】

当工事の進捗率は約80%です。現在、壁高欄及び橋梁付属物の施工を行なっています。又、7月中旬から夜間施工にて橋梁足場の解体を行ない、交通規制の実施に伴う作業は完了しました。ご不便を掛けましたが、ご協力ありがとうございました。今後も何かとご迷惑をお掛けすることもあると思いますが、ご理解とご協力をお願いします。



【夜間での足場解体作業状況】

TSUCHIYA

平成22年度 三遠南信引佐地区整備工事

(株)鈴木組 松尾053-544-0212

工事進捗状況

本工事は、現在、立入防止柵工事を主に工事を進めています。供用後の道路に動物が侵入するのを防止するため、本線法面に設置しています。

施工状況



建柱状況



網張状況



施工完了箇所



平成22年度 三遠南信東黒田舗装工事

福田道路(株) 石田 053-544-1323

工事概要

本工事は、三遠南信自動車道 引佐ジャンクションのアスファルト舗装工事を行います。地域の皆様に役立つ道づくりを心掛け施工してまいります。

進捗状況



本線

本工事は現在、防火ブロックおよびGランプの剛性防護柵の施工を行なっております。9月上旬より本体工事の舗装工を着手いたします。これに伴い、ダンプトラックによる資材搬入がありますが、安全第一で通行いたしますので、ご協力をお願いします。



Fランプ

工事中は近隣の皆様へご迷惑がからぬように作業員一同、細心の注意を払い作業いたします。

FUKUDA ROAD CONSTRUCTION

平成22年度 三遠南信引佐JCT照明設備工事

明光電気(株) 土屋 053-544-0660

進捗状況

当工事では現在、東黒田高架橋において、橋梁点検車を使用し照明設備用の配管・プルボックスを壁高欄へ設置する作業及び低位置照明を設置するためのコンクリートアンカー打設作業を行っています。

明光電気株式会社

施工状況



橋梁点検車にて作業中



アンカー打設状況



壁高欄に設置した配管・プルボックス

三遠南信自動車道「引佐ジャンクション」の**工事完了**をお知らせします。
ご協力ありがとうございました。

平成21年度 三遠南信引佐地区道路建設工事

(株)中村組 新井



工事完成写真・切土工

側溝

ブロック積

側溝



工事完成写真・盛土工

函渠工

小段排水


植生工

平田2号線

NO25右側より終点側を望む

地域の皆様の御協力ももちまして無事故・無災害で工事を完了する事ができました。誠にありがとうございました。

株式会社 中村組

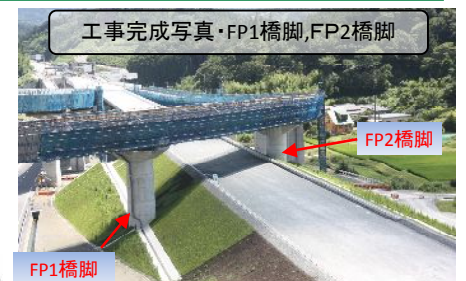

工事完成写真・FP1橋脚,FP2橋脚

FP1橋脚

FP2橋脚

NO30左側より終点側を望む
