

三遠南信自動車道「佐久間道路」(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



佐久間道路(川合工区)かわら版

発行第67号
(平成27年10月1日)
責任者:安全協議会
中村建設(株)
清水 颯夢
TEL 053-965-0082

① 平成25年度 佐久間道路佐久間第2トンネル工事 (株)安藤・間 上林 053-965-0685

工事概要 佐久間第2トンネル(浦川~川合間)を新設する工事です。川合地区側から約2.4kmのトンネルを施工します。

進捗状況 トンネル坑口部の掘削と、トンネルずりの判定、運搬を行っています。9/28時点進捗: 97.0m(上半)/2.408m

トンネル坑口



昼夜施工を開始しました。

トンネルずり判定場




② 平成26年度 佐久間道路川合道路建設工事 (株)中村組 間淵 053-965-1370

工事概要 佐久間道路橋梁の橋台・橋脚、佐久間IC(仮称)の盛土を行います。

進捗状況 2号橋下部工を10月中旬より着手します。佐久間IC(仮称)は引き続き盛土を行っています。

川合2号橋下部

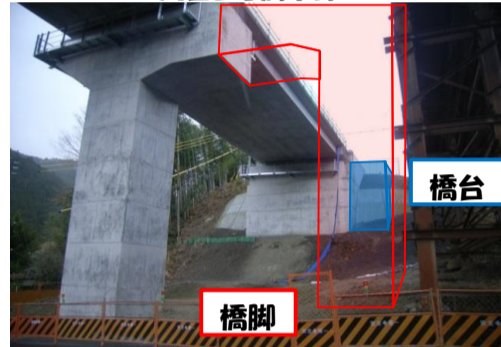

橋台

橋脚

佐久間IC(仮称)



③ 平成26年度 佐久間道路川合地区下部工事 中村建設(株)松永 053-965-0082

工事概要 佐久間道路橋梁の橋台及び橋脚を造る工事を行います。

進捗状況 1号橋は既設土留の撤去、土砂の搬出を行っています。10月から深礎杭の施工に入ります。2号橋は支持杭打設が終わり、仮橋移設を行っています。

川合1号橋 土留進捗状況



土留完了

川合2号橋 仮橋進捗状況



④ 平成27年度 佐久間道路川合地区整備工事 中村建設(株)清水 053-965-0082

工事概要 佐久間IC(仮称)付近の道路改良工事を行います。

進捗状況 防護柵基礎(ガードレール)の据付が一部完了しました。10月中旬より規制をかけての改良工事を開始します。

防護柵基礎 据付完了



国道473号線 規制箇所



施工箇所

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南進自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>
