




佐久間道路 (川合工区) かわら版 (1/2)

発行第106号
 (平成31年1月1日)
 責任者:安全協議会
 大成ロテック株式会社
 三條 直樹
 TEL 053-965-0909

① 平成29年度 佐久間道路佐久間第2トンネル舗装佐久間地区工事 大成ロテック(株) 三條 053-965-0909

工事概要 川合トンネル内のコンクリート舗装を行う工事です。

進捗状況 12月は、監査歩廊のコンクリート舗装が完了しました。1月は車道部の区画線及び中央分離ブロックを施工します。

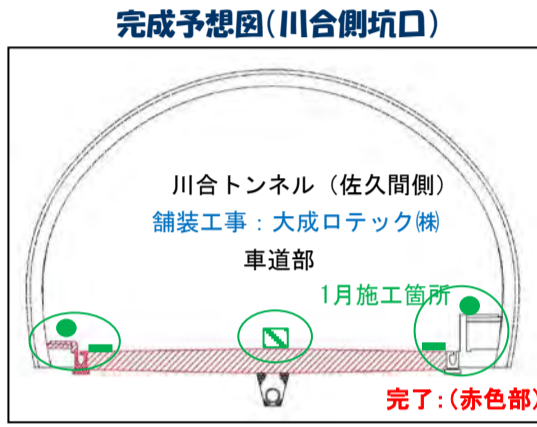

② 平成29年度 佐久間・三遠道路管内整備工事 (株)中村組 市川 053-965-1125

工事概要 川合工区にて法面工の施工を行います。満川工区にて電気室前水路の整備を行います。

進捗状況 川合工区:法面工の施工準備しています。満川工区:電気室前オープン水路を施工完了しました。



③ 平成29年度 佐久間道路佐久間地区道路建設工事 (株)中村組 鈴木 053-965-1125

工事概要 佐久間川合IC南側の造成地の整備と川合工区外周の立入防止柵を施工します。

進捗状況 1月も引き続き、造成地に耕作土の盛土と川合工区全体に立入防止柵と境界杭を設置します。



④ 平成29年度 佐久間道路佐久間地区舗装工事 岐建(株) 今野 053-965-0115

工事概要 川合トンネル坑口から佐久間川合IC及び国道473号までの舗装工事を行います。

進捗状況 川合トンネル坑口付近の橋の防水・舗装工事(2層のうち1層)が終わりました。1月中旬より表層(黒舗装3層目の一番上)を行っていきます。



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>



佐久間道路 (川合工区) かわら版 (2/2)

発行第106号
 (平成31年1月1日)
 責任者:安全協議会
 東芝通信インフラシステムズ
 株式会社
 藤田 茂
 TEL 053-967-3341

⑤ 平成30年度 佐久間道路整備工事 (株)中村組⑤ 湯野 053-965-1125

工事概要 佐久間川合ICの法面工事及び高架下の整備を行います。

進捗状況 1月からは、高架下の整備を行っていきます。ご理解ご協力をお願いいたします。

白沢川高架部



唐沢川高架部



⑥ 平成29年度 佐久間道路佐久間地区照明設備工事 三和電気土木工事(株) 林 053-966-0515

工事概要 川合トンネル内の照明設備および佐久間川合ICの道路照明灯を新設する工事です。

進捗状況 12月は川合トンネル内照明設備の電源元となる抗口分電盤を設置、ケーブルの配線をしました。1月は川合トンネル内照明器具の取付を行います。

川合トンネル抗口分電盤



川合トンネル内照明設備設置イメージ



⑦ 平成29年度 佐久間道路トンネル通信設備工事 東芝通信インフラシステムズ(株) 藤田 053-967-3341

工事概要 トンネルの中でも外と同じ様にラジオ放送を聴ける様になります。また、災害の際は、トンネル内と外で交信が出来るようにするための新設工事です。

進捗状況 12月は、浦川・奈根トンネルと川合トンネルの機器設置及びケーブルのつなぎ込みを行っています。1月から単体試験と総合試験に向け、丁寧に作業を進めています。



空中線柱、空中線設置状況



坑口操作器設置状況

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>
