



佐久間道路 (川合工区) かわら版 (1/2)

発行第106号
 (平成31年2月1日)
 責任者: 安全協議会
 株式会社 中村組
 市川 晃
 TEL 053-965-1125

① 平成29年度 佐久間道路佐久間第2トンネル舗装佐久間地区工事 大成ロテック(株) 三條 053-965-0909


工事概要 川合トンネル本坑内(川合側)のコンクリート舗装を行う工事です。

進捗状況 1月は区画線と道路付属物(車線分離標、視線誘導標、中央分離帯ブロック)が完了しました。2月はトンネル内の仮設照明を撤去し開通準備を行います。

トンネル坑内(浦川⇒川合)



完成予想図(川合側坑口)

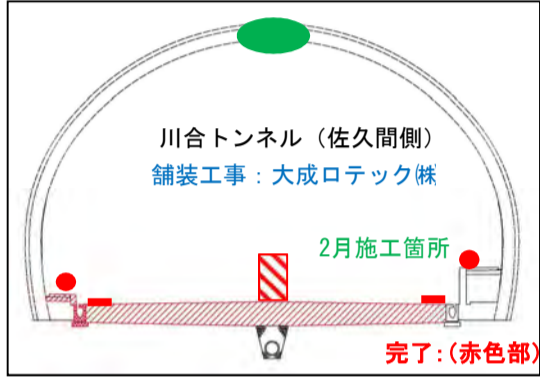

② 平成29年度 佐久間・三遠道路管内整備工事 (株)中村組 市川 053-965-1125

工事概要 川合工区にて法面工の施工を行います。浦川工区にてトンネル上部への階段の施工を行います。

進捗状況 川合工区: 施工完了しました。浦川工区: 浦川・奈根トンネル坑口上部への階段を設置しています。

川合工区法面工完了



浦川工区



③ 平成29年度 佐久間道路佐久間地区道路建設工事 (株)中村組 鈴木 053-965-1125

工事概要 佐久間川合IC南側の造成地の整備と川合工区外周の立入防止柵を施工します。

進捗状況 造成地の耕作土盛土は完了しました。現在は佐久間川合IC、ランプ周りに立入防止柵と境界杭を設置しています。

造成地耕作土盛土完了



④ 平成29年度 佐久間道路佐久間地区舗装工事 岐建(株) 今野 053-965-0115

工事概要 川合トンネル坑口から佐久間川合IC及び国道473号までの舗装工事を行います。

進捗状況 川合トンネル坑口から表層(黒舗装3層目の一番上)が終わりました。国道473号も表層が終わりました。1月下旬よりガードレール、区画線、車線分離標を行っています。



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>



佐久間道路 (川合工区) かわら版 (2/2)

発行第106号
 (平成31年2月1日)
 責任者: 安全協議会
 株式会社 中村組
 市川 晃
 TEL 053-965-1125

⑤ 平成30年度 佐久間道路整備工事 (株)中村組⑤ 湯野 053-965-1125

工事概要 佐久間川合ICの法面工事及び高架下の整備を行います。

進捗状況 2月は川合2号橋高架下の整備を行います。ご理解ご協力をお願いいたします。

川合2号橋高架下



川合2号橋高架下



⑥ 平成29年度 佐久間道路佐久間地区照明設備工事 三和電気土木工事(株) 林 053-966-0515

工事概要 川合トンネル内の照明設備および佐久間川合ICの道路照明灯を新設する工事です。

進捗状況 1月は川合トンネル内の照明設備の取付とケーブルの配線を行いました。2月は各照明設備の試験・調整を行います。

佐久間川合IC照明灯



川合トンネル内照明設備



⑦ 平成29年度 佐久間道路トンネル通信設備工事 東芝通信インフラシステムズ(株) 藤田 053-967-3341

工事概要 トンネルの中でも外と同じ様にラジオ放送を聴ける様にします。また、災害の際は、トンネル内と外で交信が出来るようにするための新設工事です。

進捗状況 2月中に実施予定の各設備会社との連動総合試験及び防災訓練のための準備を行います。また、供用開始に向け、工事品質の再点検を行います。

浦川・奈根トンネル浦川側坑口



浦川・奈根トンネル浦川側坑口(拡大)



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所
 ホームページで紹介されています。
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>
