


三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



佐久間道路 かわら版

発行第16号
 (平成23年6月1日)
 責任者: 安全協議会
 鈴木工業(株)
 TEL 0536-76-1151


① 平成21年度 佐久間道路建設工事 鈴木工業(株) 山本 0536-76-1151

工事概要

佐久間道路・東栄IC部 本線の法面掘削、残土運搬、連絡路で崩落部を復旧する工事です。また、国道側で床版工事を行います。

進捗状況

連絡路の床版でコンクリートが完了し、引き続き足場を解体していく予定です。崩落部復旧の工事用道路で、舗装が完了しました。

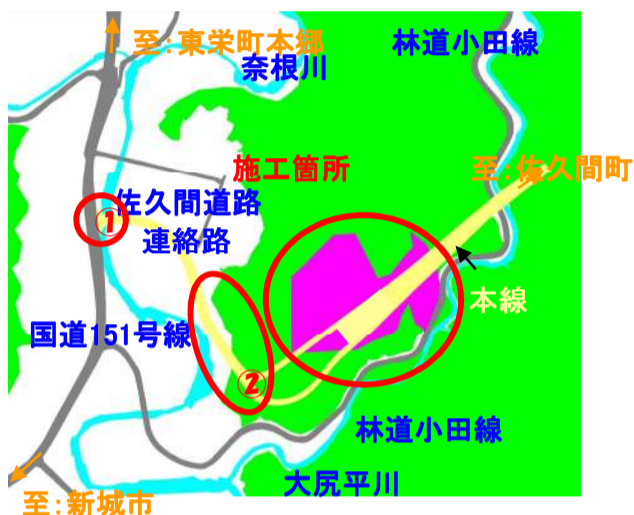

連絡路
①床版



崩落部復旧
②工事用道路



地域の皆様にご迷惑をお掛けしないよう安全第一で作業を進めていきますのでご理解・ご協力をお願いします。

② 平成21年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 (株)須山建設 大場 053-967-2587


工事概要

浦川地区における佐久間道路建設に伴う国道473号付替え工事の一部を行います。

進捗状況

1号函渠の築造を行っています。壁面のコンクリートを打設しました。この後、頂版の及び地覆のコンクリートを打設して構造物は完了となります。安全を第一に工事を進めていきますので、ご理解・ご協力をお願いします。


鉄筋組立状況

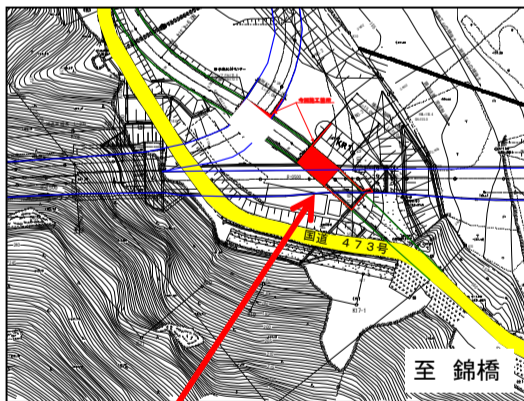

この部分の施工をしています



函渠工コンクリート打設順序と施工時期

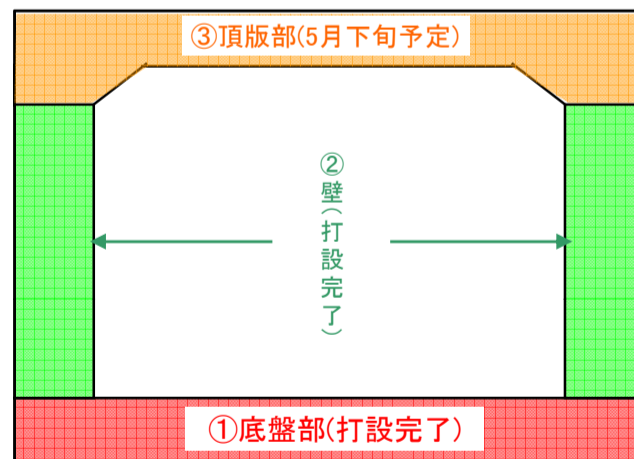

位置図

