



三遠道路(新城地区)かわら版

発行第19号
平成28年1月1日
責任者: 鈴木工業(株)
山口 典良
TEL: 0536-33-0035

平成26年度 三遠道路5号橋下部工事
神野建設(株) 彦坂 0536-33-5030
工期: H26年9月4日 ~ 平成28年1月29日

工事概 池場地区(亀淵川付近)にて国道474号(三遠道路)の橋梁下部工工事をしています。

工事状況 橋台2基と橋脚3基の下部工工事は完成です。トンネル入口付近の擁壁と壁高欄を橋台背面側に構築します。

施工箇所(西から撮影)



施工箇所(東から撮影)



平成26年度 三遠道路新城川合地区道路建設工事
神野建設(株) 梶原 0536-29-9234
工期: H27年3月26日 ~ 平成28年1月29日

工事概 川合地区において、トンネル工事に必要な工事用道路と本線橋の橋台を1基作ります。

工事状況 工事用道路(補強土壁・土砂運搬)と橋台躯体工については完成し、埋戻し作業を行います。

施工箇所(工事用道路部撮影)



施工箇所(橋台部撮影)



平成27年度 佐久間・三遠道路池場地区道路建設工事
鈴木工業(株) 山口 0536-33-0035
工期: H27年9月4日 ~ 平成28年3月25日

工事概 池場地区(亀淵川付近)で、本線盛土工事とトンネル工事に必要な工事用道路を作ります。

工事状況 擁壁工基礎地盤の床掘りが終わりました。擁壁工本体(補強土壁、重力式擁壁)の施工を行っています。

施工箇所(北から撮影)



施工箇所(東から撮影)



平成27年度 三遠道路鳳来地区道路建設工事
朝日工業(株) 吉田
工期: H27年11月19日 ~ 平成28年6月30日

工事概 川合地区において橋脚1基と、亀淵川の工事用道路の仮設構台と橋台1基・護岸を作ります。

工事状況 工事を行うための準備をしています。


施工箇所(P4橋脚)



施工箇所(仮設構台、橋台)



位置図

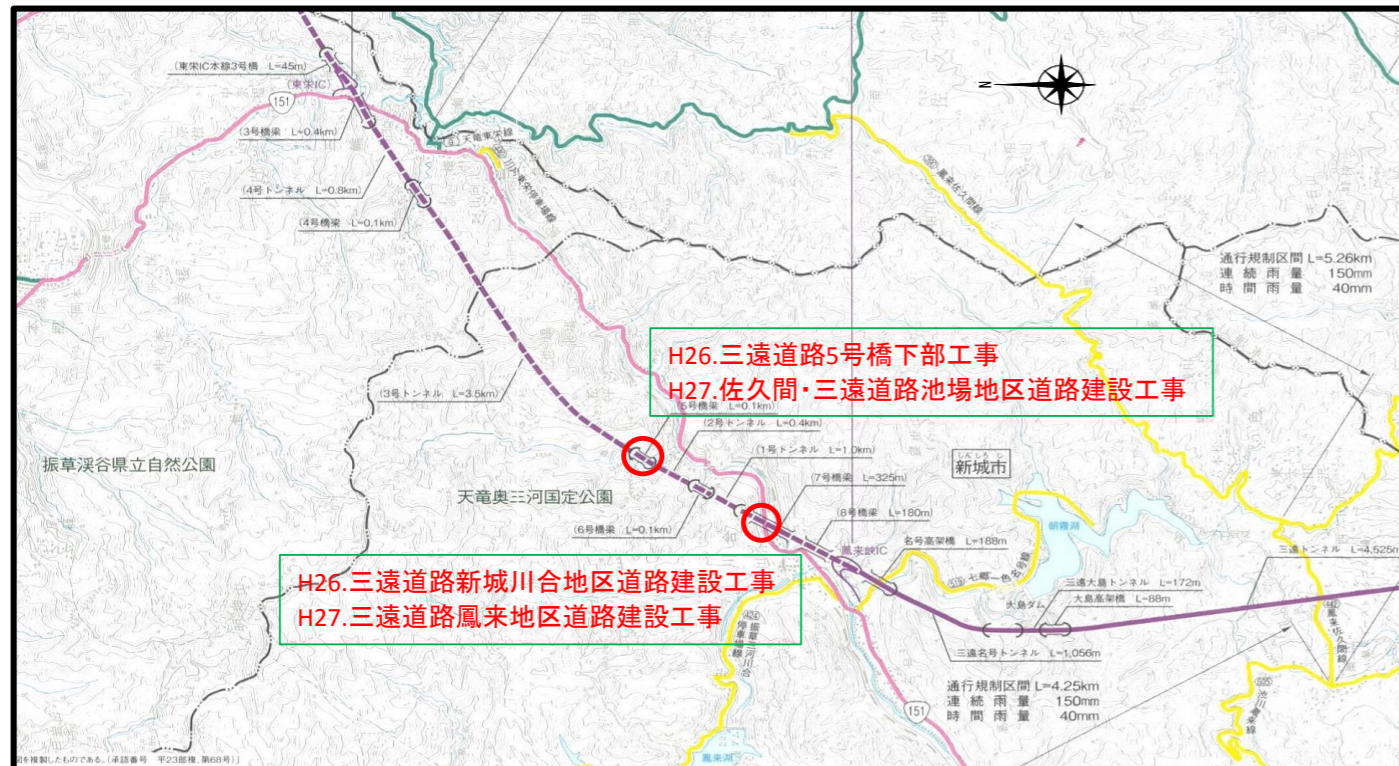

トピックス

1月

1月の別名は睦月(むつき)です。

親族が互いに往来し、仲睦まじく宴をする月であるからといわれています。また、稲の実を初めて水に浸す月を指す月「実月(むつき)」から転じたという説。



年中行事

- 1月 1日(金・祝日) - 元日
- 1月 4日(月) - 御用始め
- 1月11日(月・祝日) - 成人の日、鏡開き



国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所

ホームページアドレス

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/>



クリック



工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。
