



三遠道路 (新城地区) かわら版 (1/2)

発行第104号
 (平成30年11月1日)
 責任者:安全協議会
 鈴木工業(株)
 平野 真士
 TEL 0536-33-0053

① 平成29年度 佐久間・三遠道路東栄・新城整備工事 東海興業(株) 瀬野 0536-29-9420

工事概要

新城川合・名号地区で、三遠道路本線工事に必要な仮設用道路を作ります。吉沢地区においては佐久間・三遠道路トンネル工事の掘削土を受入れ、盛土する工事を行います。

進捗状況

新城川合地区・名号地区ともに仮設用道路が完成しました。先月に引き続き、吉沢地区にて佐久間・三遠道路トンネル工事の掘削土を受入、盛土する工事を行います。

新城川合地区

名号地区



仮設用道路

② 平成29年度 三遠道路鳳来峡IC道路建設工事 藤城建設(株) 田島 0536-29-9965

工事概要

鳳来峡ICにおいて、三遠道路本線工事に必要な仮設用道路を作ります。

進捗状況

今月からは六所川に仮排水管(φ1350)を設置する作業を設置する作業を行います。

現場平面図

仮排水管設置箇所



仮排水管設置箇所

③ 平成29年度 佐久間・三遠道路吉沢地区整備工事 小笠原マル昇(株) 山下 053-676-1011

工事概要

吉沢地区にて佐久間・三遠道路トンネル工事の掘削土を受入れ、盛土する工事を行いました。

進捗状況

工事が無事故・無災害で完了いたしました。地域の皆様には、ご理解ご協力頂きありがとうございました。

起点～終点を望む

終点～起点を望む



④ 平成30年度 三遠道路9号橋下部工事 藤城建設(株) 平井 0536-29-9939

工事概要

鳳来峡ICにおいて、三遠道路本線の橋台を作ります。

進捗状況

先月に引き続き、橋台施工のための進入路を作っています。11月より橋台(基礎杭)の施工に取り掛かります。



進入路

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>



三遠道路 (新城地区) かわら版 (2/2)

発行第104号
(平成30年11月1日)
責任者：安全協議会
鈴木工業(株)
平野 真士
TEL 0536-33-0053

⑤ 平成30年度 三遠道路新城川合地区道路建設工事 鈴木工業(株) 平野 0536-33-0053

工事概要


新城川合地区で、三遠道路本線工事に必要な仮橋と進入路を作ります。

進捗状況

中貝津地区に仮橋を架けました。今月中貝津地区と浅井平地区で盛土、伐採作業を行います。

現場平面図

新城市川合中貝津地区

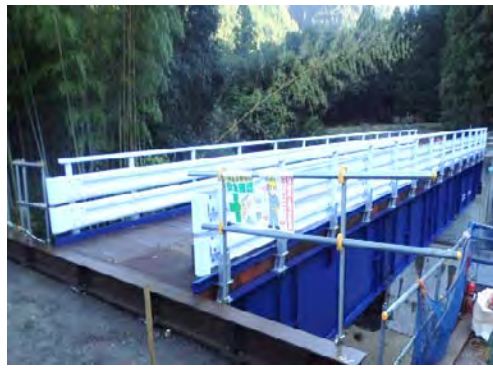

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>
