

三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(新城川合)

かわら版

発行第133号
(2021年4月1日)
責任者:安全協議会
清水建設(株)
森本 恵三
TEL 0536-33-0881

① 平成31年度 三遠道路1号トンネル工事 (株)熊谷組 成富 0536-76-1918

工事概要 三遠道路1号トンネル工事(L=642.0m)を行います。

進捗状況 3月はトンネルを600m奥まで掘り進めたのと、終点側は落石防止のためのワイヤー張工、アンカー工を施工しました。4月は中旬ごろにトンネルが仮貫通、終点側は落石雪害防止工を行います。

工事箇所全景



非常駐車帯区間 掘削状況



落石雪害防止工 厚ネット設置

② 令和元年度 三遠道路2号トンネル工事 清水建設(株) 森本 0536-33-0881

工事概要 三遠道路2号トンネル工事(L=436.0m)を行います。

進捗状況 3月はトンネルを坑口から約430m奥まで掘り進めました。3月末から4月初旬に導坑(小さな断面)で貫通させ、坑口部の切土工事に入ります。

工事箇所全景



鋼製支保工建込み



坑口から418m



トンネル坑口から坑内全景

③ 令和2年度 三遠道路7号橋下部工事 名工建設(株) 加藤 0536-29-0396


工事概要 三遠道路7号橋の橋梁下部工事(A1橋台、P1橋脚、P2橋脚)を行います。

進捗状況 3月はA1橋台の土工事と法面工事、P2橋脚の深礎工を行いました。4月はP1橋脚深礎工の掘削とP2橋脚深礎工のコンクリート工を行います。

工事箇所全景



A1橋台施工箇所

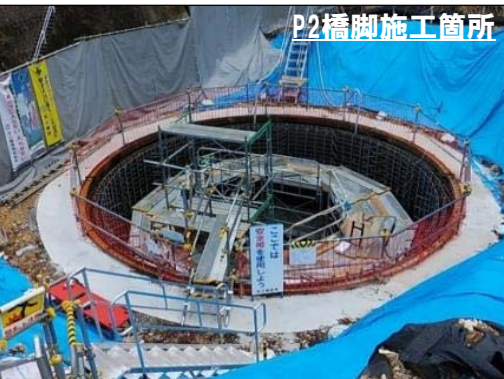

P2橋脚施工箇所

④ 令和2年度 三遠道路8号橋下部工事 あのみ建設(株) 岸 0536-33-0033

工事概要 三遠道路8号橋の橋梁下部工事(P2橋脚)を行います。

進捗状況 3月は地盤改良を行いました。4月は竹割土留工を行います。

工事箇所全景



P2橋脚

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所: 〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号: 053-542-3877
- 受付時間: 08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>
