



三遠道路
(新城川合)

かわら版(1/2)


発行第134号
(2021年5月1日)
責任者：安全協議会
名工建設(株)
加藤 靖裕
TEL 0536-29-0396

① 平成31年度 三遠道路1号トンネル工事 (株)熊谷組 成富 0536-76-1918


工事概要 三遠道路1号トンネル工事(L=642.0m)を行います。

進捗状況 4月はトンネルが導坑断面で仮貫通しました。一ツツ沢の落石防止対策工を施工した後、本貫通する予定です。5月はインバート工と覆工コンクリートの段取りを行います。

工事箇所全景

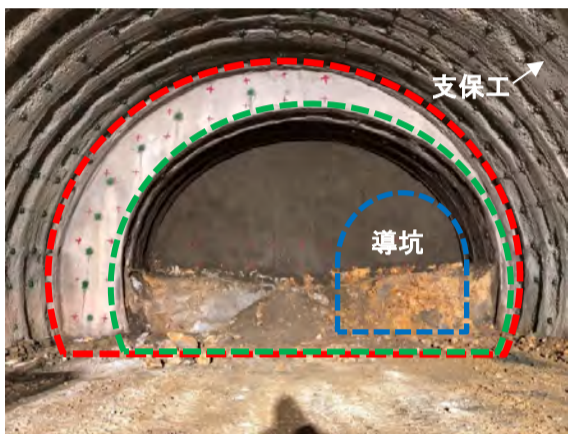

非常駐車帯(赤)と標準部(緑)

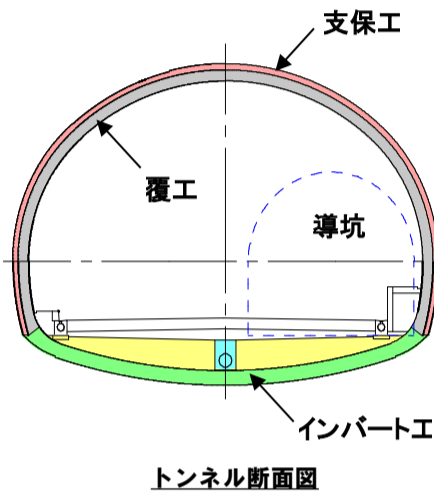

トンネル断面図

② 令和元年度 三遠道路2号トンネル工事 清水建設(株) 森本 0536-33-0881

工事概要 三遠道路2号トンネル工事(L=436.0m)を行います。

進捗状況 4月2日に導坑(小さな断面)で貫通、その後坑口部の切土工事を実施、トンネル坑内ではインバート工を行いました。5月は引き続き法面工事とトンネル坑内ではインバート工・防水シート工を行います。

工事箇所全景



③ 令和2年度 三遠道路7号橋下部工事 名工建設(株) 加藤 0536-29-0396

工事概要 三遠道路7号橋の橋梁下部工事(A1橋台、P1橋脚、P2橋脚)を行います。

進捗状況 4月はA1橋台の土工事、P1、P2橋脚の深礎工を行いました。5月はP1橋脚深礎工の掘削土留とP2橋脚深礎工のコンクリート工を行います。

工事箇所全景



④ 令和2年度 三遠道路8号橋下部工事 あのみ建設(株) 岸 0536-33-0033

工事概要 三遠道路8号橋の橋梁下部工事(P2橋脚)を行います。

進捗状況 4月で地盤改良工が完了致しました。5月は竹割土留工を行います。

工事箇所全景




三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

○住所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
○電話番号：053-542-3877
○受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(新城川合)

かわら版(2/2)

発行第134号
(2021年5月1日)
責任者:安全協議会
名工建設(株)
加藤 靖裕
TEL 0536-29-0396

⑤ 令和2年度 三遠道路新城川合地区改良工事 鈴中工業(株) 大竹 0536-29-0111

工事概要

三遠道路7-8号橋間土工部の施工をし、三遠道路8号橋の橋梁下部工事(A2橋台)を行います。

進捗状況

4月は事前測量を行いました。5月中旬から仮設物の工事を行います。

工事箇所全景

施工箇所(着手前全景)




三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>
