

三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(新城川合)

かわら版(1/2)

発行第147号
(2022年6月1日)
責任者：安全協議会
あおみ建設(株)
岸 邦雄
TEL 0536-33-0033

① 平成31年度 三遠道路1号トンネル工事 (株)熊谷組 成高 0536-76-1918

工事概要 三遠道路1号トンネル工事(L=642.0m)を行います。

進捗状況 5月は終点側のトンネル掘削とA1橋台床付掘削を行いました。6月は引き続きA1橋台の床付掘削、置換コンクリートの施工をします。

工事箇所全景

終点側トンネル掘削状況

終点側坑口状況



② 令和元年度 三遠道路2号トンネル工事 清水建設(株) 森本 0536-33-0881

工事概要 三遠道路2号トンネル工事(L=436.0m)を行います。

進捗状況 5月は仮設備撤去・片付け・清掃等を取り行い、工事完了となりました。工事期間中は皆様のご理解ご協力をいただき、ありがとうございました。

工事箇所全景



発進側坑口 全景



貫通側坑口 全景

③ 令和2年度 三遠道路8号橋下部工事 あおみ建設(株) 岸 0536-33-0033

工事概要 三遠道路8号橋の橋梁下部工事(P2橋脚)を行います。

進捗状況 5月は橋脚躯体工(柱部5ロット)が完了しました。6月は橋脚躯体工(足場撤去)及び片付けを行います。

工事箇所全景

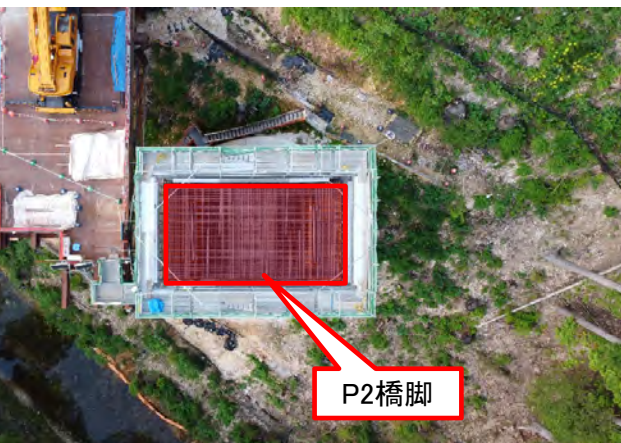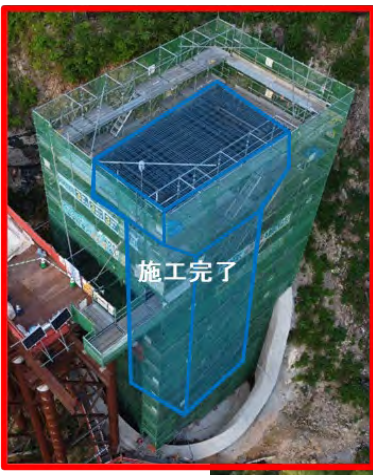

P2橋脚

④ 令和2年度 三遠道路新城川合地区改良工事 鈴中工業(株) 大竹 0536-29-0111

工事概要 三遠道路7-8号橋間土工部の施工をし、三遠道路8号橋の橋梁下部工事(A2橋台)を行います。

進捗状況 5月はA2橋台の躯体壁部の施工を行いました。6月はA2橋台の躯体上部の施工を行います。

工事箇所全景

6月施工
予定箇所



三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(新城川合)

かわら版(2/2)

発行第147号
(2022年6月1日)
責任者:安全協議会
あおみ建設(株)
岸 邦雄
TEL 0536-33-0033

⑤ 令和3年度 三遠道路7号PC上部工事 (株)安部日鋼工業 藤井 0536-29-9502


工事概要

三遠道路7号橋の橋梁上部工事(L=335mのうち247m)を行います。

進捗状況

5月はP4片持箱桁製作工の準備、P2柱頭部2回目のコンクリート打設が完了、P3脚頭部の足場を施工しました。6月はP4片持箱桁製作工、P2は柱頭部工の継続、P3は脚頭部工を施工します。

工事箇所全景

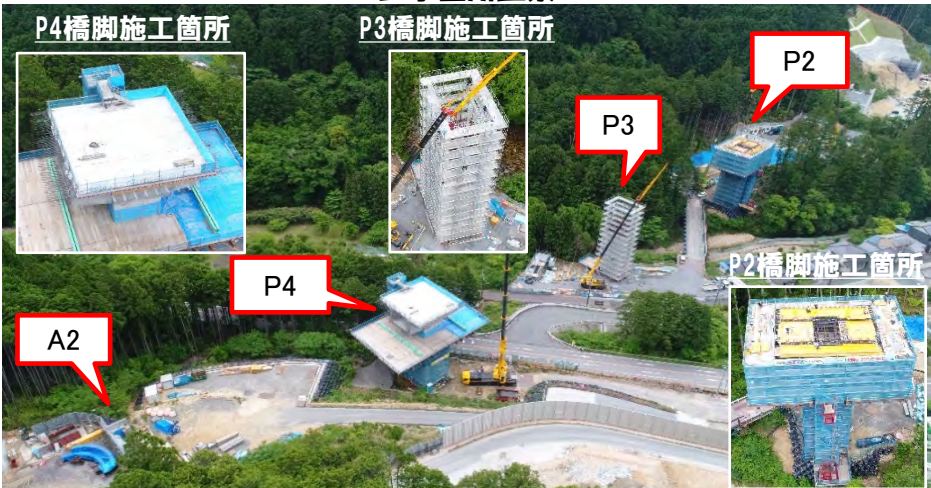

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所: 〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号: 053-542-3877
- 受付時間: 08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>
