



三遠道路
(新城川合)

かわら版 (1/2)

発行 第 153 号
(2022年 12月 1日)
責任者:安全協議会
(株)中村組
鈴木 貴太
TEL 053-412-1122

① 平成31年度 三遠道路1号トンネル工事 (株)熊谷組 成瀬 0536-76-1918

工事概要 三遠道路1号トンネル工事(L=642m)を行います。

進捗状況 11月は覆工コンクリート工及び中央排水工を行いました。また、北側坑門工を施工しました。12月は覆工コンクリート工及びトンネル仮設備撤去を行います。

工事箇所全景

非常駐車帯覆工施工状況

北側坑門工施工状況



② 令和3年度 三遠道路7号橋PC上部工事 (株)安部日鋼工業① 藤井 0536-29-9502

工事概要 三遠道路7号橋の橋梁上部工事(L=335mのうち247m)を行います。

進捗状況 11月はP2の片持架設、P3の架設準備、P4の架設後の片付けを行いました。12月はP2・P4の架設後の片付け、P3の架設準備、A2付近の架設用足場支保工の設置を行います。

工事箇所全景



③ 令和4年度 三遠道路3号トンネル新城地区舗装工事 (株)佐藤渡辺 小柳 050-5527-4650

工事概要 三遠道路3号トンネルの舗装工事(L=1766.3m)を行います。

進捗状況 11月は残った側のコンクリート打設、フレキャスト監視員通路壁の施工を行いました。12月は歩道の舗装、縁石の設置、ケーブル配管の設置を行います。

工事箇所全景

ケーブルの配管を設置します。



縁石の設置、歩道の舗装を行います。

④ 令和4年度 三遠道路新城地区整備工事 (株)中村組① 鈴木 053-412-1122

工事概要 三遠道路7号橋～8号橋間における法面工及び補強土壁、場所打擁壁の施工を行います。

進捗状況 11月は法面の掘削及び、場所打擁壁の深礎杭基礎の施工を行いました。12月は法面のアンカー工と7号橋橋台背面の施工を行います。

工事箇所全景



三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住 所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所 ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>



三遠道路
(新城川合)

かわら版(2/2)


発行第153号
(2022年12月1日)
責任者:安全協議会
(株)中村組
鈴木 貴太
TEL 053-412-1122

⑤ 令和4年度 三遠道路PC上部工事
(株)安部日鋼工業② 大澤 0536-29-9502

工事概要 三遠道路6号橋の橋梁上部工事(L=27.5m)を行います。

進捗状況 11月は橋台間にワイヤーブリッジを設置し、主桁架設の準備を行いました。
12月は引き続き架設準備を行い、下旬頃に主桁を架設します。

工事箇所全景

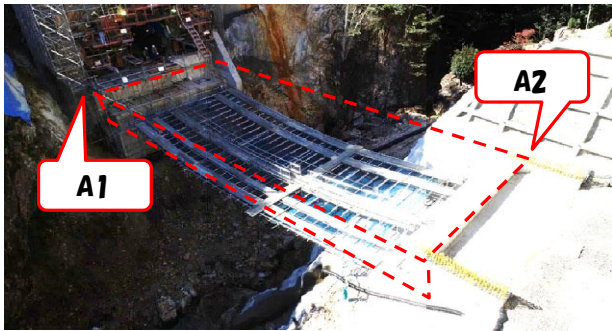

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所: 〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官話所
- 電話番号: 053-542-3877
- 受付時間: 08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>
