



三遠道路
(新城川合)

かわら版(1/2)


発行第161号
(2023年8月1日)
責任者:安全協議会
神野建設(株)
増田 遼太
TEL 050-5527-3743

① 令和3年度 三遠道路7号橋PC上部工事 (株)安部日鋼工業① 藤井 0536-29-9502

工事概要 三遠道路7号橋の橋梁上部工事(L=335mのうち247m)を行います。

進捗状況 7月は、P3橋脚の架設、P3橋脚～P4橋脚径間の壁高欄工を行いました。
8月は、P2橋脚～P3橋脚径間の結合、P2橋脚～P4橋脚径間の壁高欄工を行います。

工事状況

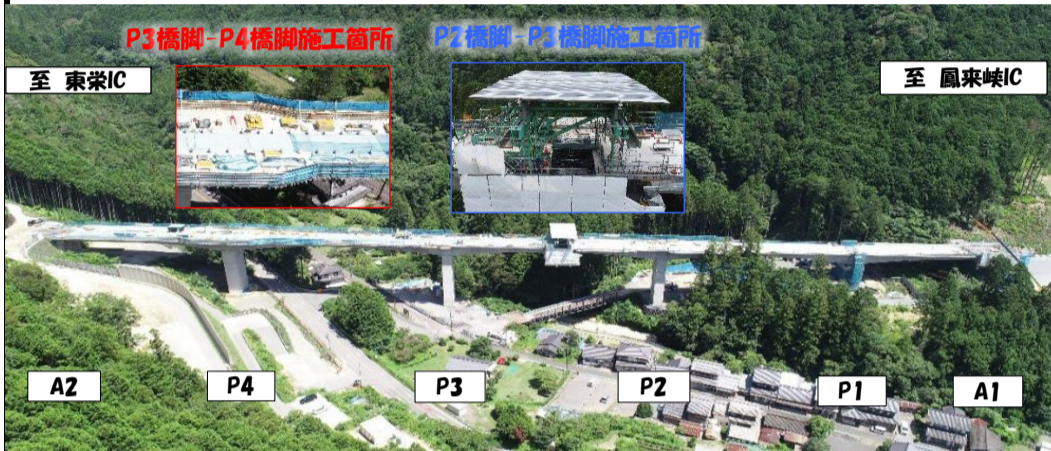

② 令和4年度 三遠道路1号トンネル舗装工事 (株)佐藤渡辺 小柳 050-5527-4650

工事概要 三遠道路1号トンネルの舗装工事(L=642m)を行います。

進捗状況 7月は、コンクリート舗装の準備及び、上層路盤、中間層の施工を行いました。
8月は、連続鉄筋コンクリート舗装の施工を行います。

工事状況




③ 令和4年度 三遠道路新城地区整備工事 (株)中村組③ 鈴木 053-412-1122

工事概要 三遠道路7号橋～8号橋間における法面工及び、補強土壁工、場所打擁壁工の施工を行います。

進捗状況 現在、7号橋付近で隣接工事(JR発注)があり、施工箇所が重なるため、一時工事(施工)が全面中止となります。隣接工事が終わり次第、再開予定です。

工事状況

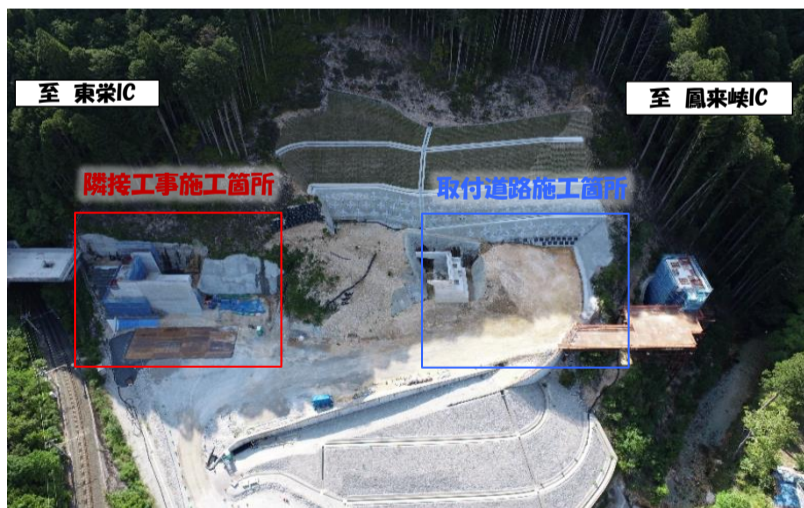

④ 令和4年度 三遠道路3号トンネル新城地区整備工事 神野建設(株) 増田 050-5536-7159

工事概要 三遠道路3号トンネル内の新城地区(一部東栄地区)の整備工事(内面塗装・配水管・防護柵・舗装・監視員通路)を行います。

進捗状況 7月は、避難坑のコンクリート舗装工を行いました。
8月は、本坑の監視員通路工の施工を行います。

工事状況




三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所: 〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号: 053-542-3877
- 受付時間: 08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

三遠南信自動車道「三遠道路」(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(新城川合)

かわら版(2/2)

発行第161号
(2023年8月1日)
責任者:安全協議会
神野建設(株)
増田 遼太
TEL 050-5527-3743

⑤ 令和4年度 三遠道路新城東栄地区道路建設工事 長坂建設興業(株)② 山田 090-6334-8683

工事概要

新城地区では、1号、2号トンネル北側の法面工事、落石雪害防止工を行います。東栄地区においては、横見発生土受入地の工事用進入路を造成します。

進捗状況

7月は、各工区の準備工を行いました。
8月は、新城地区では、1号、2号トンネル坑口法面への仮設モ/レールの設置を行います。

工事状況

1号トンネル北側



モルタル吹付、
落石防護工、
階段工を行います。

2号トンネル北側



法枠工、
落石雪害防止工、
落石防止網工を行います。

⑥ 令和5年度 三遠道路2号トンネル舗装工事 (株)佐藤渡辺② 森内 050-5527-4650

工事概要

三遠道路2号トンネルの舗装工事(L=436m)を行います。

進捗状況

7月は、現地測量及び、仮設照明の設置を行いました。
8月は、排水構造物の設置、ケーブル配管の布設準備を行います。

工事状況



仮設照明設備を
設置しました。

排水構造物設置、ケーブル配管の
準備を行います。

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所: 〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号: 053-542-3877
- 受付時間: 08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>
