



# 佐久間道路(東栄工区)かわら版

発行第48号  
(平成26年3月1日)  
責任者:安全協議会  
中村建設(株)  
鈴木 大輝  
TEL053-965-1525

## ① 平成24年度 佐久間道路東栄連絡路整備工事 鈴木工業(株) 溝口 0536-76-1701

**工事概要** 佐久間道路・東栄IC(仮称)連絡路の盛土工事および奈根川の護岸工事を行います。

**進捗状況** 連絡路の法面吹付工事を行い、今回工事の完成となります。

国道より連絡路を望む



連絡路より国道を望む



## ② 平成24年度 佐久間道路東栄地区第1トンネル新設工事 西松建設(株) 大林 0536-32-7122

**工事概要** 佐久間道路のうち、佐久間第1トンネルを東栄町側から約1.9km掘削する工事です。

**進捗状況** 2月末現在、発破工法により避難坑掘削が約210m完了しました。今後も避難坑掘削を進めていきます。また、この掘削土を下田スリ仮置場および川合ICに運搬しています。

トンネル施工状況



下田スリ仮置場状況



## ③ 平成25年度 佐久間道路東栄地区整備工事 (株)鈴木組 杉山 0536-76-1273

**工事概要** 横見地区において、各工事で発生する残土の処理(盛土)を行う工事です。また、周辺施設の整備工事を行います。

**進捗状況** 工事の着手に向けて、計画・準備を行っています。

盛土予定箇所(横見)



## ④ 平成24年度 三遠道路1号橋西下部工事 藤城建設(株) 伊與田 0536-76-0097

**工事概要** 国道474号(三遠道路)において、橋の基礎となる橋脚を作る工事を行います。

**進捗状況** 橋脚の基礎となる箇所を、安全に掘削できるように地盤を改良します。3月末頃完了の予定で、4月より基礎部分の施工を開始する予定です。

橋脚施工箇所



地盤改良施工箇所

## ⑤ 平成24年度 三遠道路1号橋東下部工事 鈴木工業(株) 細井 0536-76-1701

**工事概要** 東栄地区において国道151号と奈根川に架かる三遠道路の橋梁の橋脚を作る工事を行います。

**進捗状況** 工事を始めるための準備を行っています。

施工予定箇所写真(南から撮影)



施工予定箇所写真(北から撮影)



## ⑥ 平成25年度 佐久間道路東栄地区道路建設工事 神野建設(株) 小島 0536-76-1580

**工事概要** 佐久間道路・東栄IC部において、ランプ及び連絡路の土砂(岩)掘削・残土処理と法面保護工事を行います。

**進捗状況** ランプの土砂(岩)掘削と運搬作業を行っています。土砂の運搬は川合及び横見へ搬出していきます。また、法面保護工事にも着手しました。

掘削作業箇所写真(東から撮影)



法面施工箇所写真(南から撮影)




## ⑦ 平成25年度佐久間道路東栄地区本線道路建設工事 藤城建設(株) 山口 0536-76-0097

**工事概要** 佐久間道路・東栄IC部において、本線及びランプの土砂(岩)掘削・残土処理と法面保護工事を行います。

**進捗状況** 工事を始めるための準備を行っています。

施工予定箇所写真

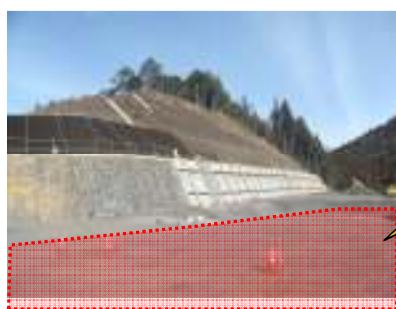

本線及びランプの掘削を行い、掘削箇所の法面保護を行います。

今回施工予定箇所

## 位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。  
【[http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo\\_douro/gaiyo\\_sanen\\_index.html](http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html)】
