



三遠道路 (東栄)

かわら版 (1/2)

発行 第159号
(2023年6月1日)
責任者:安全協議会
須山建設株式会社
鈴木 肇
TEL080-1553-5990

① 令和2年度 三遠道路4号トンネル工事 三井住友建設(株) 大原 053-966-6030


工事概要

三遠道路4号トンネル(トンネル延長L=841m)の新設工事を行います。下深谷地区から海老嶋地区へ向けて掘削します。

進捗状況

5月は北側坑門工及び覆工コンクリート工の施工を行いました。6月は南側における坑門工及び覆工コンクリート工の施工を行います。

工事状況

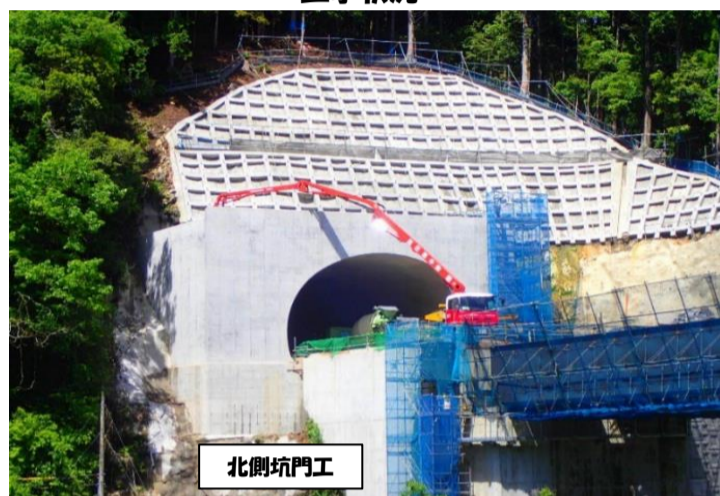

北側坑門工

② 令和3年度 三遠道路東栄地区道路建設工事 (株)中村組② 鈴木 080-8252-9435

工事概要

三遠道路1号橋A2側の東栄IC構築工事(東栄地区)を行います。

進捗状況

5月は東栄ICでは排水工事を行いました。6月は引き続き東栄ICでは排水工事をを行います。

工事状況



至 鳳来峠IC

排水工施工箇所

東栄IC

③ 令和3年度 三遠道路1号橋鋼上部工事 日本車輛製造(株) 井上 090-1419-2190

工事概要

三遠道路の東栄町における橋梁上部工3橋(本線L=44.9m BランフL=39.1m CランフL=53m)の架設を行います。

進捗状況

5月は足場組立、塗装を行いました。6月は引き続き現場塗装を行います。林道小田線を8:00~17時まで規制して作業します。

工事状況



Bランフ橋

本線橋

Cランフ橋

林道小田線

至 鳳来峠IC

④ 令和4年度 三遠道路東栄地区床版工事 須山建設(株) 鈴木 080-1553-5990

工事概要

三遠道路4号トンネル~1号橋間(L=228m)の床版工事及び橋梁付属物の工事を行います。

進捗状況

5月はコンクリート床版の型枠組立を行いました。6月は引き続き床版型枠、鉄筋組立を行います。

工事状況



至 鳳来峠IC

コンクリート床版の型枠組立状況

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所: 〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号: 053-542-3877
- 受付時間: 08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(東栄)

かわら版 (2/2)

発行 第159号
(2023年6月1日)
責任者:安全協議会
須山建設株
鈴木 肇
TEL080-1553-5990

⑤ 令和4年度 三遠道路3号トンネル東栄地区整備工事
長坂建設興業(株) 畔柳 (クロヤナギ) 090-1312-9903

工事概要

三遠道路3号トンネル(東栄地区約1.8km)本坑の整備工事
及び避難坑の舗装工事を行います。

進捗状況

5月は起工測量等の準備工を行いました。
6月から避難坑の舗装工事を行います。

工事状況



三遠南信自動車道位置図



事業者連絡先

- 住所: 〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号: 053-542-3877
- 受付時間: 08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>
