

三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(東栄)

かわら版

発行 第153号
(2022年12月1日)
責任者:安全協議会
(株)中村組
鈴木 雄祐
TEL080-8252-9435

① 令和2年度 三遠道路4号トンネル工事 三井住友建設(株) 大原 053-966-6030

工事概要 三遠道路4号トンネル(トンネル延長L=841m)の新設工事を行います。下深谷地区から海老嶋地区へ向け掘削します。

進捗状況 11月はトンネルの掘削を行いました。
12月はトンネルの掘削とスリの搬出作業および覆工コンクリート作業を行います。

工事箇所全景



トンネル掘削ずり積込状況

② 令和3年度 三遠道路東栄地区道路建設工事 (株)中村組② 鈴木 080-8252-9435

工事概要 三遠道路1号橋A2側の東栄IC構築工事(東栄地区)を行います。

進捗状況 11月は擁壁工事をを行いました。
12月も引き続き擁壁工事をを行います。

工事箇所全景



三遠道路(新城方面)

東栄IC

擁壁施工箇所

三遠道路(佐久間方面)

③ 令和4年度 三遠道路3号トンネル東栄地区舗装工事 大林道路(株) 大東 0536-76-0607

工事概要 三遠道路3号トンネル本坑内(東栄側)において、コンクリート舗装および排水構造物等付属施設の施工を行います。

進捗状況 11月は舗装工事(中間層、コンクリート舗装)の施工を行いました。
12月は舗装工事(コンクリート舗装)の施工を行います。

工事箇所全景




④ 令和4年度 三遠道路PC上部工事 (株)安部日鋼工業② 大澤 080-1610-2711

工事概要 佐久間道路東栄IC(東栄2号橋)におけるフレテンション単純T桁橋(L=23m)の架橋を行います。

進捗状況 11月は、コンクリート桁のクレーン架設を行い、その後施工用吊足場の設置を行いました。
12月は吊足場内で床版と横組の工事をを行います。

工事箇所全景

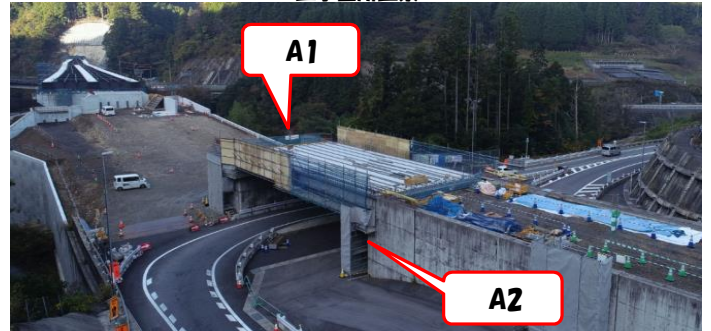

A1

A2

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所: 〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号: 053-542-3877
- 受付時間: 08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

※裏面につづく
