

三遠南信自動車道「佐久間道路」(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



# 佐久間道路(浦川工区)かわら版

発行第39号  
(平成25年5月1日)  
責任者:安全協議会  
現場技術員  
中西 義将  
TEL 0536-76-0316

## ① 平成24年度 佐久間道路大千瀬川橋下部工事 大日本土木 松久 053-967-2680

**工事概要** 大千瀬川橋下部工事のうちP1橋脚の基礎部分をニューマチックケーソン工法(圧気工法)で施工する工事です。

**進捗状況** 4ロットの構築(昼間)と3ロットの沈下掘削(夜間)を、24時間フル稼働で施工しております。近隣の方にはご迷惑をお掛けしておりますがご理解の程宜しくお願ひします。

左岸側から見た現




右岸側から見た現




## ② 平成24年度 佐久間道路浦川地区航路建設工事 須山建設(株) 清水 053-545-0551

**工事概要** 佐久間道路建設に伴う国道473号付替え工事、盛土工事、佐久間道路本線上部の法面の補強を行います。

**進捗状況** 国道473号付替えのための擁壁工事を行っています。

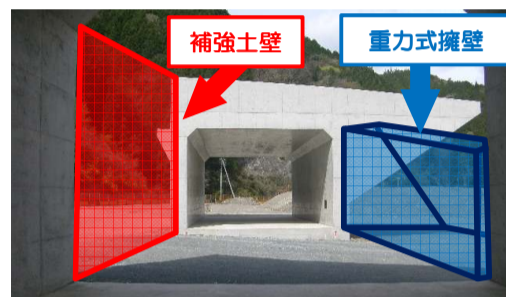

473号線ボックス間 擁壁工事施工箇所

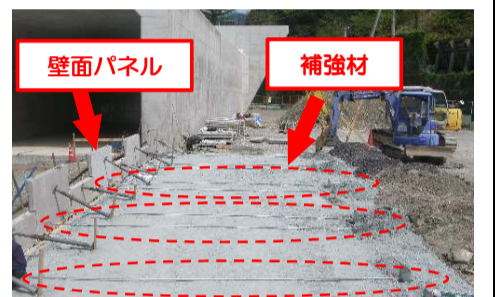

補強土壁の背面の様子

## ③ 平成24年度 佐久間道路浦川連絡路道路建設工事 (株)早野組 熊谷 053-967-3266


**工事概要** 大千瀬川左岸側にて、佐久間道路・浦川連絡路道路の橋台および補強土壁の施工を行います。

**進捗状況** 市道小田敷線内で伐採作業を行なっています。

市道小田敷線内の様子



伐採作業の様子

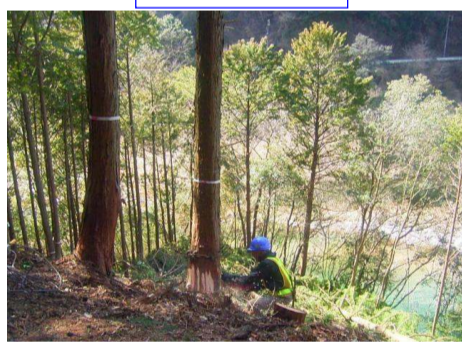

## ④ 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口

**工事概要** 佐久間道路浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。

**進捗状況** 工事を始めるための計画・準備を行っています。

対岸からトンネル坑口を撮影



佐久間町と東栄町を結ぶトンネルをつくります。トンネルは両方の町から掘ります。私たちは浦川地区側の工事を担当します。今は、品質の高いトンネルをつくるための計画・準備をしています。安全第一で工事を行ってまいります。ご理解・ご協力賜りますようよろしくお願いいたします。

## ⑤ 平成24年度 佐久間道路浦川地区連絡路建設工事 (株)早野組 高根 053-967-3266

**工事概要** 大千瀬川左岸側にて、佐久間道路・浦川地区連絡路の橋台および補強土壁の施工と、大千瀬川に架かる小田敷橋の補強を行います。

**進捗状況** 工事着手に向け、作業計画をたてています。

【浦川連絡路】右岸より望む



★新規工事です★  
このたび、佐久間道路浦川地区連絡路建設工事を施工します株早野組です。浦川の自然の中で地域の皆様方とふれあいながら、安心・安全施工に取り組んでまいります。今後ともご理解・ご協力をお願い致します。

私が現場担当の高根です



## 位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。  
([http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo\\_douro/gaiyo\\_sanen\\_index.html](http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html))
