




佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行第57号
(平成26年12月1日)
責任者:安全協議会
株大林組
出口 大輔
TEL053-966-6011

① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

工事概要 浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。トンネルは浜松市から東栄町へ向けて約1.6km掘り進めます。

進捗状況 引続き、本坑(本線トンネル)と避難坑(避難用トンネル)を掘削しています。本坑の坑口の準備をしています。現在進捗(11/22時点) 本坑 241.8m/1,555m 避難坑 854.5m/1,575m

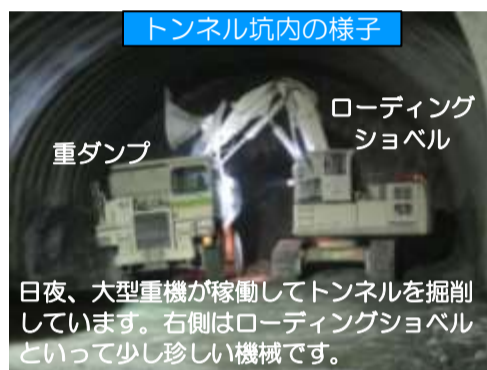

日夜、大型重機が稼働してトンネルを掘削しています。右側はローディングショベルとって少し珍しい機械です。

② 平成25年度 佐久間道路浦川連絡路建設工事 須山建設(株) 藤田 053-967-3951

工事概要 大千瀬川左岸側にて、佐久間道路の橋台と浦川連絡路道路の施工を行います。

進捗状況 現在橋台の深礎杭の工事完了してこれから橋台躯体工事を行います。また、連絡路の施工は通行止めになっている佐久間小田敷線を利用して工事をします。



③ 平成25年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 (株)鈴木組 山下 053-967-2511

工事概要 大千瀬川左岸側にて、下流側(国道473号線側)より佐久間IC連絡路(仮称)の拡幅工事を行います。

進捗状況 引続き道路拡幅部分の法面掘削をロッククライミングマシン工法(RCM工法)にて行っています。掘削完了後は、仮設土留工の撤去を行います。



【大千瀬川下流錦橋より左岸側を望む】 【工事起点側(錦橋側)より終点側を望む】

④ 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋P C上部工事 鹿島建設(株) 川岸 053-966-6253

工事概要 大千瀬川の上空を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。

進捗状況 11月21日より、現場の準備作業を開始しています。また同日、浦川の柏古瀬地区に現場事務所が建ちました。ご近所の皆様、宜しくお願ひします。



【終点(飯田)側から起点(浜松)側を望む】 【橋脚周り整地状況】

位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。【http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html】
