



佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行第58号
 (平成27年1月1日)
 責任者：安全協議会
 須山建設(株)
 藤田 司
 TEL053-967-3951

① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

工事概要 浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。トンネルは浜松市から東栄町へ向けて約1.6km掘り進めます。

進捗状況 引続き、本坑と避難坑を掘削しています。巻立てのコンクリートの準備をしています。
 現在進捗(12/20時点) 本坑 357.0m/1,555m
 避難坑 950.5m/1,575m



② 平成25年度 佐久間道路浦川連絡路建設工事 須山建設(株) 藤田 053-967-3951

工事概要 大千瀬川左岸側にて、佐久間道路の橋台と浦川連絡路道路の施工を行います。

進捗状況 現在橋台躯体工事を行っています。また、連絡路の施工は通行止めになっている佐久間小田敷線を利用して連絡路の法面保護工事を行っています。



③ 平成25年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 (株)鈴木組 山下 053-967-2511

工事概要 大千瀬川左岸側にて、下流側(国道473号線側)より佐久間小田敷線の道路改良工事(拡幅工事)を行ないます。


進捗状況 施工範囲の変更により、追加の簡易土留工、伐採工・落石防止網撤去工を行います。その後、法面掘削工を再開します。



④ 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋PC上部工事 鹿島建設(株) 川岸 053-966-6253

工事概要 大千瀬川の上空を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。

進捗状況 シートで囲った足場の中で、橋脚上部のコンクリートを打つための鉄筋・型枠の組立を行っています。

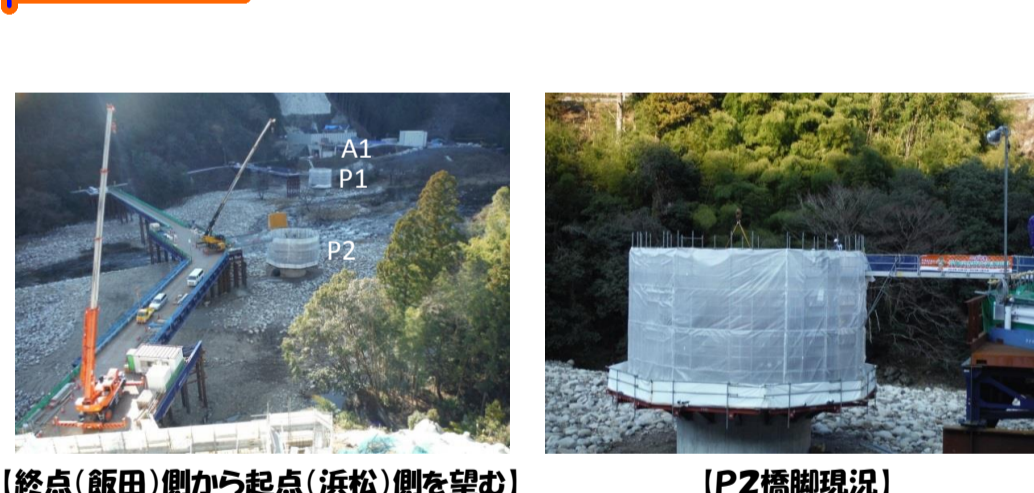

位置図

