



佐久間道路（浦川工区）かわら版

発行第75号
（平成28年6月1日）
責任者：安全協議会
鹿島建設(株)
川岸 誠知
TEL053-966-6253

① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

工事概要

浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。
トンネルは浜松市から東栄町へ向けて約1.6km掘進します。

進捗状況

本坑、避難坑とも掘削完了しました。引続き、本線トンネルのコンクリートの施工を進めています。
5/25現在の覆工コンクリート進捗 902.5m/1.555m



大きなトンネルを支えるために、コンクリートの中には沢山の鉄筋棒が配置されています。



坑口の様子

② 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋P C上部工事 鹿島建設(株) 川岸 053-966-6253

工事概要


大千瀬川を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。

進捗状況

橋がつながりました。今後は、排水等付属設備の施工を順次行っていきます。
5/25時点での全体工事進捗 94%



【下流側から側面を望む】

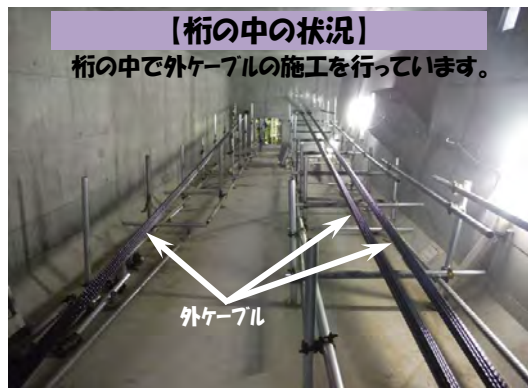

【桁の中の状況】

桁の中で外ケーブルの施工を行っています。

外ケーブル

③ 平成27年度 佐久間道路吉沢整備工事 須山建設(株) 鈴木 053-967-2276

工事概要

吉沢工区において、発生土を受け入れて盛土工を行っています。

進捗状況

対策土受入のため、遮水シートの敷設作業を行っています。
また、谷部へ雨水排水管の敷設準備を進めています。



【遮水工施工状況】

【排水管敷設箇所】

雨水排水管敷設位置

④ 平成27年度 佐久間・三遠道路工事用道路整備工事 須山建設(株) 村松 053-471-3162

工事概要

天竜東栄線(県道9号線)、引佐地区において三遠南信自動車道建設に伴う工事用車両通行道路の舗装機能回復を目的とした舗装工事です。

天竜東栄線 L=4.56km アスファルト舗装工A=23,030㎡
引佐地区 L=0.40km アスファルト舗装工A= 2,000㎡
区画線工 N=1式

進捗状況

現在、工事未着手で地域の皆様及び各所関係機関様と打合せ調整した後、工事着手します。昼間施工もありますが主に夜間工事となります。地域の皆様方には期間中、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力よろしくお願いいたします。



ここから4.5km程度舗装を補強します

天竜東栄線



①ASフィニッシャー

②マカダムローラー

③タイヤローラー

作業状況イメージ

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。
ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。

明日を創る
～建設モノづくりの最前線～

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>
