

三遠南信自動車道「佐久間道路」(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行第85号
(平成29年4月1日)
責任者:安全協議会
株鈴木組
高林 俊一
TEL053-967-2740

① 平成28年度 佐久間道路吉沢地区整備工事 (株)早野組 熊谷 0536-76-0722

工事概要 吉沢地区にて佐久間・三遠道路トンネル工事で発生した掘削土を受入、盛土する工事です。

進捗状況 平成28年8月より工事着手し、全て完了しました。地域の皆様には、工事にご理解・ご協力頂き、大変感謝しております。ありがとうございました。

終点から起点を撮影



起点から終点を撮影



対策土受入ヤード

② 平成28年度 佐久間道路浦川右岸道路建設工事 中村建設(株) 瀧本 053-967-2870

工事概要 浦川地区において、三遠道路浦川IC(仮称)の補強土壁コンクリートの基礎工事を行っています。

進捗状況 補強土壁基礎、水路ボックスの施工共に完成しました。地域の皆様には温かいご支援とご協力を頂きありがとうございました。



補強土壁基礎



水路ボックス内部

③ 平成28年度 佐久間道路浦川左岸道路建設工事 (株)鈴木組 高林 053-967-2740

工事概要 市道「佐久間小田敷線」の道路拡幅及び(仮称)「浦川連絡路橋」の橋梁の下部工事です。

進捗状況 「錦橋」側には橋台と軽量盛土が完成しました。「2号法面」側は仮設土留壁が完成しました。地域の皆様におかれましては、工事へのご理解とご協力を頂きありがとうございました。



「2号法面」側





「錦橋」側

④ 平成28年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 正光建設(株) 竹下 053-967-3766

工事概要 浦川地区において、三遠南信浦川IC(仮称)のオフランプ部の補強土壁を行います。

進捗状況 現在は準備中です。4月上旬から施工を開始します。

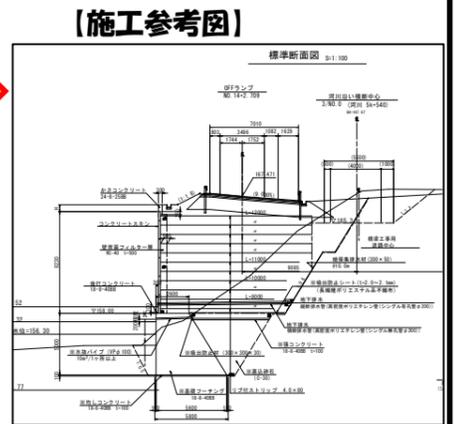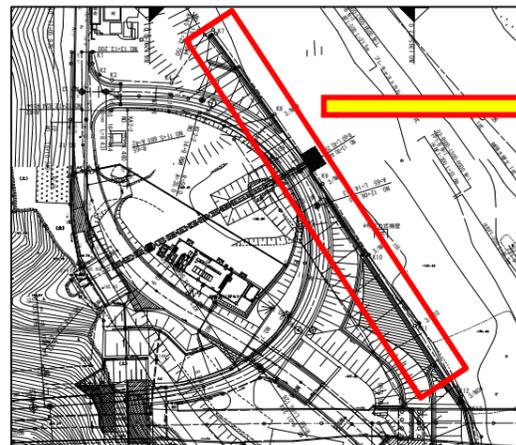

【施工参考図】

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>
