



佐久間道路 (浦川工区) かわら版 (1/2)

発行第 93号
 (平成 29年 12月 1日)
 責任者:安全協議会
 須山建設(株)
 加茂 伸太郎
 TEL 053-967-3561

① 平成29年度 佐久間道路佐久間第1トンネル監査路浦川地区工事 中村建設(株) 瀬本 053-967-2870

工事概要 浦川地区にて、佐久間道路佐久間第1トンネル本坑内において監査路及び道路付属施設の設置を行います。

進捗状況 現在、監査路下に道路設備管の施工を行っています。また、並行して監査路のコンクリート舗装を行っています。12月初旬より坑口周辺、排水の施工を行っていきます。

坑口



監査路上のコンクリート舗装施工完了



② 平成29年度 佐久間道路浦川右岸道路建設工事 須山建設(株) 加茂 053-967-3561


工事概要 浦川地区にて、佐久間道路佐久間第1トンネル上部の地山安定化と浦川IC(仮称)の盛土を行う工事です。

進捗状況 12月よりトンネル上部の法面施工に入ります。引続き浦川IC(仮称)オフランプ部の盛土を行います。

法面施工エリア



盛土施工エリア

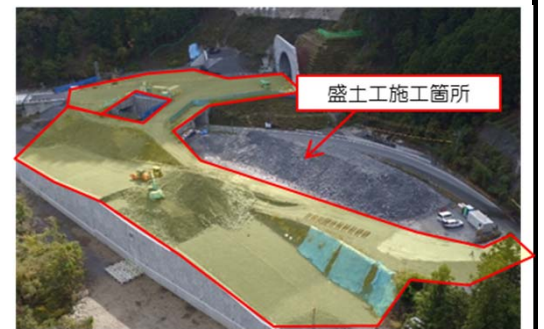


③ 平成29年度 佐久間道路佐久間第1トンネル舗装浦川地区工事 日本道路(株) 狩野 053-463-1850

工事概要 佐久間第1トンネル本坑内(浦川側)において、コンクリート舗装および排水構造物の施工を行います。

進捗状況 12月初旬は施工準備のため測量を行い、排水構造物(側溝)を搬入します。12月中旬より排水構造物(側溝)の施工を開始します。

トンネル本坑口(浦川側)

完成予想図

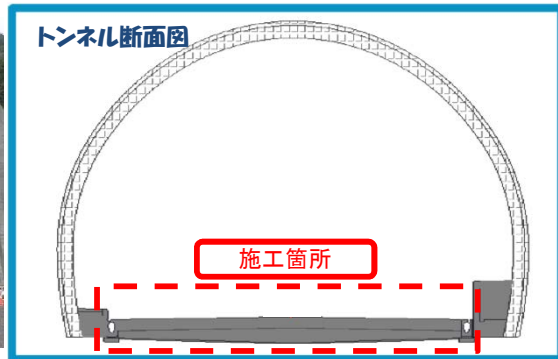

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
 ホームページで紹介されています。
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>



佐久間道路 (浦川工区) かわら版 (2/2)

発行第93号
 (平成29年12月1日)
 責任者：安全協議会
 須山建設(株)
 加茂 伸太郎
 TEL 053-967-3561

④ 平成29年度 佐久間道路浦川左岸道路建設工事 (株)早野組 川端 050-5306-6021

工事概要

浦川地区にて、浦川IC(仮称)のアクセス道路となる市道佐久間小田敷線の落石防止対策及び連絡路橋の橋台工事をを行います。

進捗状況

橋台工事の施工が完了しました。引き続き法面上部の落石対策工事をを行います。

橋台工施工完了



落石対策工事



⑤ 平成29年度 佐久間道路浦川左岸連絡路橋鋼上部工事 (株)アルス製作所 春本 053-967-2737

工事概要

浦川左岸連絡路橋の上部工事です。浦川IC(仮称)へのアクセス道路となる橋梁を架設します。本橋梁は鉄製で工場で製作した桁を現場に搬入して大型クレーンで架設します。

進捗状況

工場で橋梁の製作を行っています。12月中旬より架設用構台の設置を予定しています。1月中旬より国道473号の片側交互通行を行い、架設工事をを行う予定です。ご迷惑をおかけしますがよろしくご協力のほどお願いします。

鋼桁製作中(溶接)



鋼桁製作中
(溶接)

現地測量



現地測量

⑥ 平成29年度 佐久間道路吉沢地区整備工事 鈴木工業(株) 溝口 0536-76-1703

工事概要

吉沢地区にて佐久間・三遠道路トンネル工事で発生した掘削土を受入れ、盛土する工事をを行います。

進捗状況

トンネル工事で発生した掘削土を受入れて盛土を行っています。

盛土箇所



盛土箇所

盛土箇所



盛土箇所



・工事の状況は、浜松河川国道事務所
 ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>
