


R5.8.31 現在 坂部トンネルの掘削進捗は94%※です。

※坂部トンネル総延長に対する

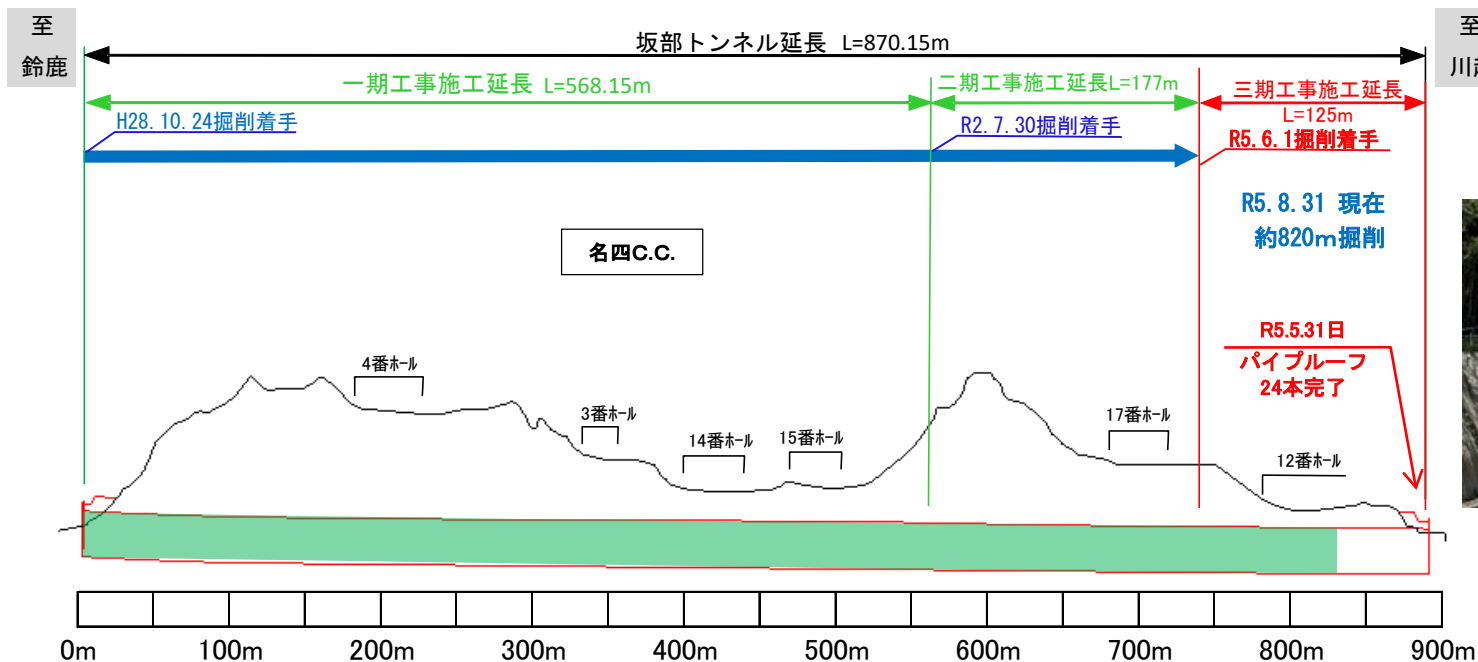

施工状況（令和5年8月度）



至
川越

ゴルフ場の直下、最小土被りが3.4mのため、地表への影響を考慮してパイプルーフ工法でトンネル掘削のための屋根（パイプルーフ）を施工しています。



パイプルーフ全景
川越方から鈴鹿方を望む

平面図

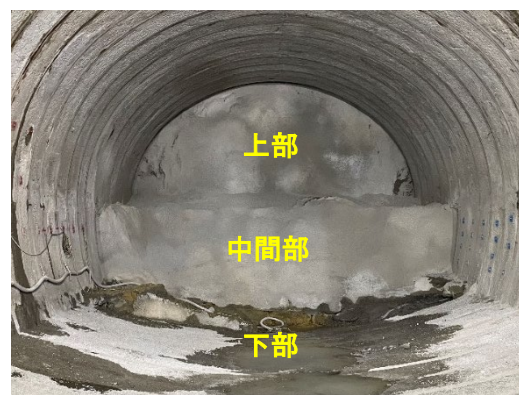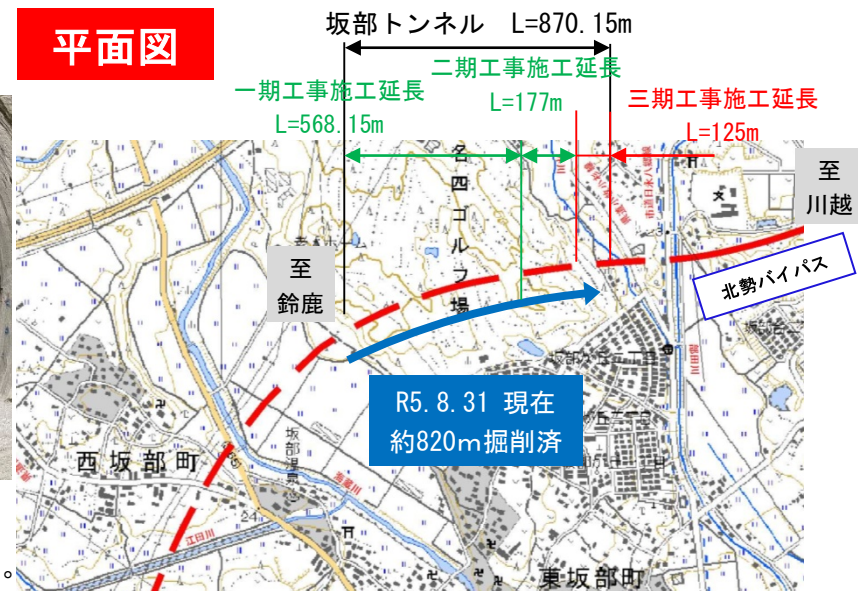

上部掘削状況

R5.5.31日にパイプルーフが完了し、トンネルの掘削を開始しました。
土被りが薄く、崩れやすい地層のため、トンネルを1断面ずつ3分割して掘削しています。
8/31現在、三期工事としては75m掘削し、全体では約820mの掘削が完了しています。
