



ちゅうばす通信

中勢B P連絡協議会

珍風景



うらかな秋晴れが続いておりますが、皆様お変わりございませんでしょうか。

最近、ほとんど雨が降らないので工事は順調に進んでおります。一部本格着工できない工事もありますが近々問題が解決し本格的に動き始められそうです。中勢バイパス工事にも新たな工事が3工事決定しました。今月紹介する「平成27年度23号越知地区道路建設工事」の他に「平成27年度23号中勢B P整備工事」「平成27年度23号中ノ川高架橋下部左岸工事」です。「B P整備工事」は鈴鹿市から松阪市までの範囲で実施します。

工事開始の際には、地元自治会長を通じてお知らせします。ご不便をおかけすると思いますがよろしくお願いします。

冒頭の写真は、7月号に掲載した「かかし」です。9月、10月と変化がありました！「ちゅうばす通信7月号」の掲載直後から展示がなくなったので、どうしたのか心配していたのですが9月に復帰！また、通行する人を楽しませてくれています。「釣り」バージョンは男の人の手が祈っているようにみえます。もしかして、ラグビー日本代表の五郎丸選手の話のポーズからヒントを得たのでしょうか？



左の写真は国土交通省が災害時などに派遣する照明車の写真です。よく見てもらうと違いに気づくとは思いますが右はミニカーです。小さく見えませんが「国土

交通省」と車体の側面に描かれています。よく再現されているので皆様にも見てもらいたくて載せました。

それでは、朝晩寒くなりますが風邪など引かぬようご自愛下さい。

① 平成26年度 23号中ノ川高架橋下部工事

市道栄天名線から津方面を望む



津方面から鈴鹿方面を望む



昨年の12月から着工しました本工事でも平成27年9月末に無事完成することができました。
工事中、近隣住民及び市道利用者の方々には大変ご迷惑をおかけしたかと存じます。
無事故無災害で工事が完成できたことは皆様のご協力の賜物です。
本当にありがとうございました。

施工者 日本土建株式会社

TEL:059-389-7223

現場代理人 伊藤 憲一

監理技術者 中川 基司



② 平成26年度 23号鈴鹿・津地区道路建設工事

本線NO.1315～1319左(高茶屋工区)



鈴鹿市御園工区(中ノ川左岸)



中勢バイパス津市高茶屋工区及び津市久居野村町工区において、側道整備工事を行っております。
11月上旬頃に舗装が完了する予定です。


鈴鹿市御園町(中ノ川左岸)において、10月中旬から場所打杭の施工をしています。
場所打杭終了後、橋台及び橋脚の施工に入ります。ご協力よろしくお願いします。

施工者 三重農林建設(株)
Tel059-232-0603

現場代理人 大家 裕貴

監理技術者 小島 久典

3ヶ月予定工程



③ 平成26年度 23号鈴鹿・津地区整備工事

本線NO.495付近(終点側)

10月14日現在



本線NO.467付近(起点側)

ボックスカルバート施工箇所




中勢バイパスの整備工事をします三重農林建設(株)です。工事は安全第一で進めていきますので、
よろしくお願いします。工事内容は三行地区で区間約0.6kmの工事用道路作る作業していきます。
現在、ボックスカルバートの作業ヤード及び仮設道路の整備行っています。
11月初旬以降に掘削・土の搬出を予定しています。

施工者 三重農林建設(株)
Tel059-232-0555


現場代理人 内田 啓介

監理技術者 青木 則正


3ヶ月予定工程



④ 平成26年度 23号鈴鹿地区道路建設工事

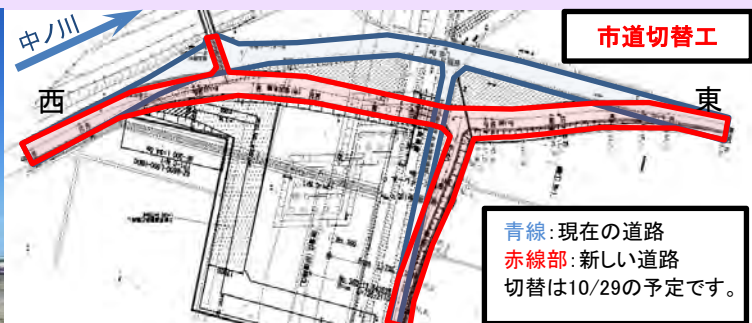

(株)アイケーディです。軟弱地盤の改良工事と市道栄天名線(中ノ川の右岸堤防道路)の切替えを行っていきます。地盤改良工は現在高さ28mの大きな機械で深いところの改良を行っています。おおむね半分が完了しており、引き続き来年1月頃まで行う予定です。改良にあたっては粉塵の抑制等につとめて施工してまいります。市道の切替えは10/29に行う予定です。しばらくの間、新しい道で通行していただく予定ですので、ご協力のほどよろしくお願いします。

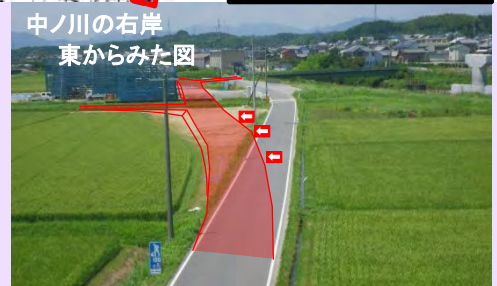

施工者 (株)アイケーディ
Tel 059-225-7117

現場代理人 石田 義信

監理技術者 後藤 博伸

3ヶ月予定工程

	平成27年10月	11月	12月
市道切替工		10/29切替(予定)	
地盤改良工・仮設工			

⑤ 平成27年度 23号中勢道路整備工事

12工区野村街道交差点 遮音壁



整備内容は、交差点から側道へ向いて遮音壁を設置し、道路周辺の整備を行います。平成28年1月末ごろからの施工に向けて10月中旬より現地を調査する作業を行います宜しく申し上げます。

11工区県道久居線 スロープ



整備内容は、車道と歩道を分離するブロックを設置し道路の整備を行います。平成27年10月末ごろから整備を行う予定です。

施工者 (株)松本組
Tel 0598-42-2266

現場代理人 川口 直也


監理技術者 羽根 俊幸

3ヶ月予定工程

	平成27年10月	11月	12月
11工区雲出野田線			
11工区県道久居線スロープ			
11工区相県道久居線乗入れ			
13工区木造市道擁壁			

⑥ 平成27年度 23号越知地区道路建設工事

主な工事内容

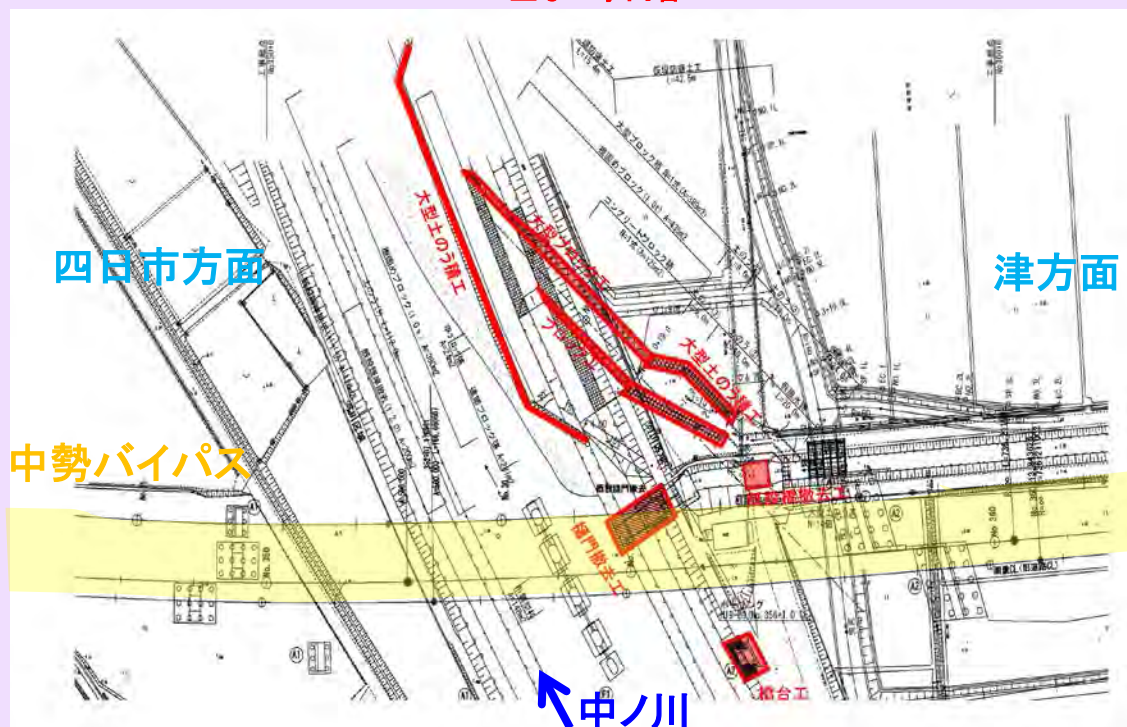

河川土工



構造物撤去



この度、平成27年度23号越知地区道路建設工事を行う事となりました三重農林建設(株)です。
 主な工事としては、水路の付け替えを行います。
 10月中旬より工事を行っていく予定となっています。隣接する工事もありますので、調整しながら進めていきます。
 安全には十分注意して進めていきますので、宜しくお願い致します。

施工者 三重農林建設(株)

Tel 059-395-6582 (現場事務所)

現場代理人 榎原 義之

監理技術者 西川 保


3ヶ月予定工程

準備工

仮設工

構造物撤去工

平成27年10月 11月 12月



旬な現場をご案内します。

「近大高専の学生が中勢バイパスの現場を見学！！」

平成27年10月20日（火）に（一社）三重県建設業協会の主催で土木・建築を学んでいる近畿大学工業高等専門学校の4年生47名が中勢バイパスの鈴鹿市御園町から越知町地内で工事を行っている地盤改良工、場所打ち杭の現場を見学しました。

見学の様子について、三重テレビで見学会当日の夕方のニュースで紹介されました。また、翌日の中日新聞（鈴鹿・亀山版）にも掲載されました。

引き続き、見学会が多数行われますので、ちゅうばす通信で紹介をしていく予定です。



地盤改良工の説明を聞く学生



最新測量機器の説明を聞く女子学生

三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所では、現場見学会を行っております。普段は、なかなか目にする事の出来ない工事現場を公開します。道路と皆さんの暮らしの関係を現場で実感していませんか？詳しい情報・お問い合わせは、三重河川国道事務所ホームページをご覧ください、お電話下さい。

中部地方整備局 ホームページ「現場へ行こう 旬な現場」


<http://www.cbr.mlit.go.jp>

また、今後の予定は下記の通りとなっております。

実施済

平成27年10月20日	(火)	近畿大学工業高等専門学校 4年生	様
10月30日	(金)	三重県市町工事検査担当者	様
11月9日	(月)	三重県立昂学園高等学校 2・3年生	様
11月19日	(木)	三重県立相可高等学校 2年生	様
平成28年1月16日	(土)	鈴鹿市立天名小学校	様

施工箇所見取図

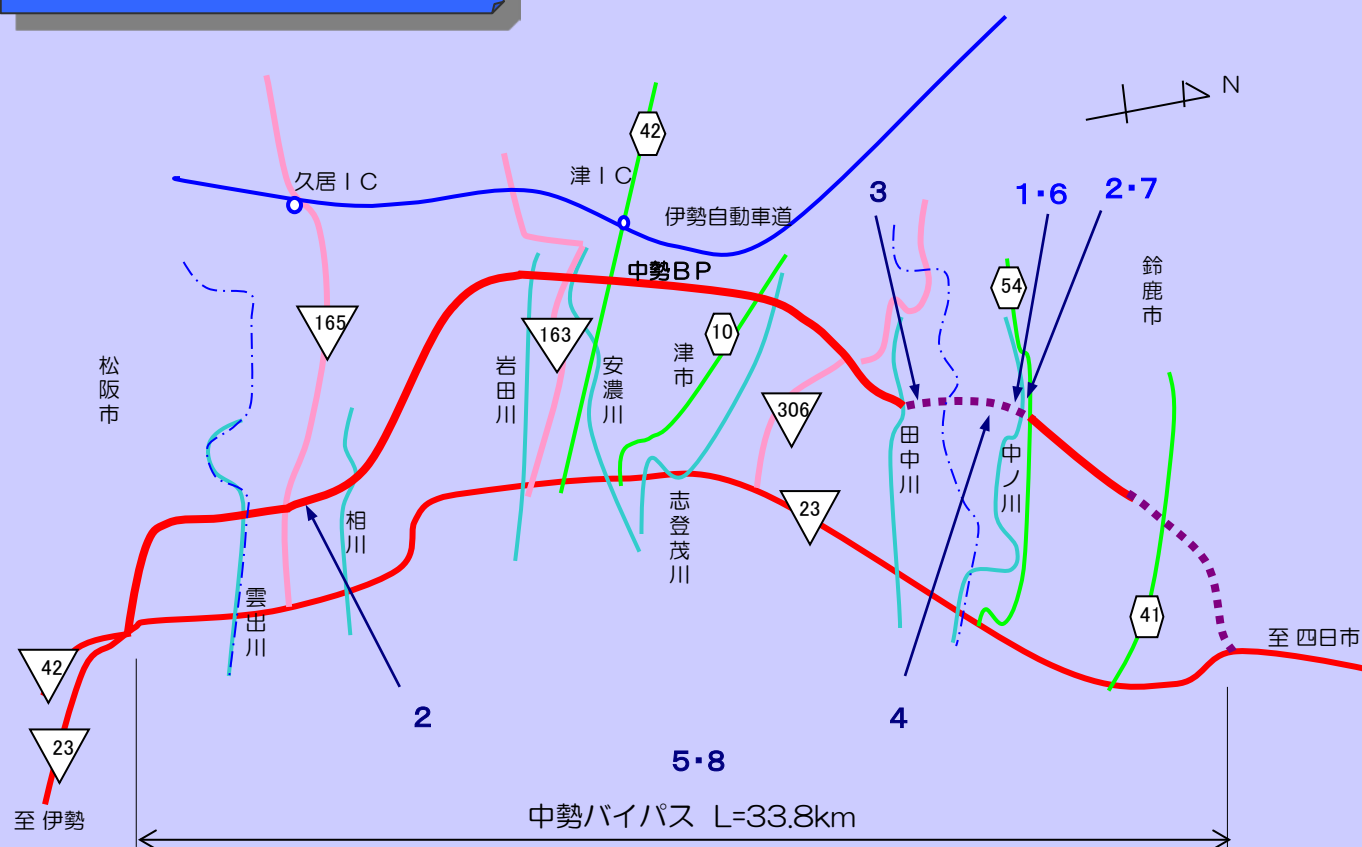

【工事一覧表】

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
1	H26 23号中ノ川高架橋下部工事	H27.10.30	橋梁下部工	日本土建(株)
2	H26 23号鈴鹿・津地区道路建設工事	H28.3.18	橋梁下部工・排水工・除草	三重農林建設(株)
3	H26 23号鈴鹿・津地区整備工事	H28.2.29	道路土工・加幅工	三重農林建設(株)
4	H26 23号鈴鹿地区道路建設工事	H28.2.29	地盤改良工	(株)アイケーディ
5	H27 23号中勢道路整備工事	H28.3.18	遮音壁工・排水工・土工	(株)松本組
6	H27 23号越知地区道路建設工事	H28.11.30	水路付替え工・歩道橋下部工	三重農林建設(株)
7	H27 23号中ノ川高架橋下部左岸工事	H28.12.15	橋梁下部工	日本土建(株)
8	H27 23号中勢BP整備工事	H28.3.25	法面工・排水工・防護柵工・除草	東海土建(株)

【連絡先】

三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
tel 059-387-8470 fax 059-387-8471

または

中勢BP工事連絡協議会事務局 (三重農林建設(株)内)
tel 059-232-0603

中部地方整備局 三重河川国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>



※本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、天候その他の事情により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
