

津国道維持通信

2019年1月号 VOL. 36



平成30年12月26日 23号BP久居野村交差点4車線化

皆様お元気で新年をお迎えのことと存じます。昨年は国道23号の管理にご協力いただきありがとうございました。本年も利用される方が、安心・安全に通行できますように管理していきますのでよろしくお願い致します。

新年を迎え昨年を振り返って津国道維持出張所の5大ニュースを考えてみました。

- ・久居相川交差点4車線化(2月)
- ・伊勢内宮周辺の石灯籠撤去(4月～11月)
- ・全国高校総体に伴う行事(7月)
- ・台風襲来(出張所停電)
- ・久居野村交差点4車線化(12月)

初めてのことも多くバタバタと対応していた記憶があります。これを教訓に今後も速やかで正確な対応をしていきたいと決意を新たにしました。



11月末に植えたチューリップの球根は順調に育っているのか、腐ってしまったのかよくわからない状態です。少し、覆土が足りなかったのも、ホームセンターに走り継ぎ足しました。3月末にはきれいに咲くでしょうか？



① 平成29年度 津北部地区維持修繕工事



23号線の防草対策工事



凍結注意看板の設置



23号の転落防止柵復旧

津北部地区維持修繕工事を施工している田中土木 株式会社です。

23号担当区間は四日市市中里町～津市雲出島貫町、中勢バイパス担当区間は鈴鹿市野町～津市木造町です。担当区間の除草、剪定、路面補修をしながら、落下物の処理や交通事故後のガードレール復旧等を行っています。今は、中勢バイパスの除草をメインに維持工事を行っています。

また、夜間工事で痛んだ路面を補修していきます。

工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解と御協力を賜りますようお願いいたします。

施工者 田中土木(株)
Tel.059-253-5260
現場代理人 カナイ ケンタ
金井 健太
監理技術者 ヒラノ タカシ
平野 崇

3ヶ月予定工程

応急維持工
除草工
交通安全施設復旧

1月 2月 3月

② 平成30年度 津南部地区維持修繕工事



路面凍結注意の看板を設置しています。



法面の除草作業を行っています。



今年も凍結防止剤を散布します。
(昨年度 作業状況)

津南部地区維持修繕工事を施工している株式会社 田村組です。

1月の主な作業内容としては、国道23号の除草作業、路面補修、交通事故後の安全施設復旧作業を行います。だんだん気温も低下し、本格的な冬の気温になってきました。

車両の冬装備を万全にし、路面凍結には十分に注意して車の運転を行ってください。

本線規制を伴い作業を行いますので皆様に大変ご迷惑をおかけすることもあります。ご理解とご協力を頂きますようよろしくお願いします。

施工者 (株)田村組
Tel.0598-21-2563
現場代理人 ササキ タカノリ
佐々木 孝典
監理技術者 トミタ トモユキ
富田 智之



↑ 作業エリア

③ 平成30年度 三重管内道路照明維持修繕工事

三重管内道路照明維持修繕工事を施工しているシーキューブ株式会社です。
先月に引き続き、照明の消えている所の修繕やLED化を行っております。
今月は道路照明建替の施工写真です。



施工前



施工中



施工後

3ヶ月予定工程

施工者 シーキューブ(株)
Tel052-563-5073

現場代理人・監理技術者
チュウマケント
中馬 健登

	1月	2月	3月
維持工			
修繕工			

④ 平成30年度 三重中南部路面管理工事

凍結防止作業



凍結防止剤の散布状況。
(昨年度 作業状況)



凍結防止剤の散布状況。
(昨年度 作業状況)

三重中南部路面管理工事を施工している 東海管清興業 株式会社です。
降雪が予想される場合又は降雪中は、巡回パトロール及び凍結防止剤の散布を行います。
安全には十分注意して進めていきますのでご理解とご協力の程、宜しくお願いいたします。

3ヶ月予定工程

施工者 東海管清興業(株)
Tel059-226-2151

現場代理人 コジマ エイチ
小島 英一
主任技術者 ナカムラ マサミ
中村 正美

	1月	2月	3月
凍結防止作業			

⑤ 平成29年度 津北部橋梁補強補修工事

国道23号 26.0kp 付近 塔世橋



国道23号塔世橋における下部工の補強・補修をしています株式会社 眞建です。
1月にかけて鋼矢板打設による土留・仮締切を行い、2月、3月で下部工の補強・補修を行います。
工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解と御協力を賜りますようお願い致します。

施工者 (株) 眞 建

TEL05979-2-3090

現場代理人 フナハシ カツヒコ
舟橋 克彦

監理技術者 キタムラ ユキヒロ
北村 幸彦

3ヶ月予定工程


塔世橋 仮締切工

塔世橋 橋脚巻き立て

H31.1月

H31.2月

H31.3月



⑥ 平成29年度 23号宮川大橋補強補修工事

P1橋脚底板打設完了(養生中)



P4橋脚アンカー設置完了



宮川大橋の補強・補修工事を担当している、宮本建設 株式会社です。

1月のP1橋脚部は、PCM吹付保護塗装に始まり埋戻し→護岸基礎工を行う予定です。

P4橋脚は、桁補強材・仮受けブラケット設置後、桁をジャッキアップし沓座の取替えを行う予定です。
安全第一で工事を進めていきますので、ご理解と御協力をお願いいたします。

施工者 宮本建設(株)

TEL0596-28-6131

現場代理人 ヤギユウ ナオシ
柳生 直司

監理技術者 フクナガ タツヤ
福永 達也


3ヶ月予定工程

P4橋脚 橋梁補修工
P4橋脚 工場製作工
P1橋脚 橋脚巻立て
P1橋脚 法覆護岸
P1橋脚 仮設工

1月

2月

3月



⑦ 平成29年度 23号新愛宕橋右岸耐震補強工事

道路照明設置完了



落橋防止装置工



23号新愛宕橋右岸耐震補強工事を施工している株式会社 田村組です。
今後の施工は、年明けから 落橋防止装置・チェーン下部ブラケットの取付及び対傾構の復旧を行います。
気温もグッと下がり体調管理の難しい時期なので、現場関係者には体調管理の徹底を周知し、工事完成に向けて作業員一団となって安全作業で進めていきます。

施工者 (株)田村組
Tel0598-67-9396
(現場事務所)

現場代理人 オカダ カズヒデ
岡田 一秀
監理技術者 オノ サトシ
小野 悟嗣

3ヶ月予定工程

P3橋脚 落橋防止装置工

P3橋脚 橋梁付属物工

P3橋脚 仮設工

1月

2月

3月

⑧ 平成29年度 23号中勢久居野村交差点改良工事

4車線化供用しました



供用前



供用開始

工事内容は中勢バイパス久居野村交差点付近での4車線化工事です。皆様のご理解とご協力のおかげで、無事平成30年12月26日に4車線供用開始しました。年明け以降は交通安全施設の施工を予定しております。

施工者 日本道路(株)
Tel050-5212-5745
(現場事務所)

現場代理人 ムネスエ マサタカ
宗末 正剛
監理技術者 ヤクワ マコト
八鍬 誠

3ヶ月予定工程

準備工・片付け
信号移設工
舗装・区画線工
防護柵・標識工
中央分離帯工
交通安全施設工

1月

2月

3月

⑨ 平成30年度 三重管内道路照明設置工事

建替対象ポール姿図



建替対象ポール姿図



建替対象ポール姿図



国道23号線沿いの道路照明設置工事を行っております(株)大三洋行です。

1月も道路照明柱のLED化建替工事を行います。

工事期間中は、中央分離帯の交通規制があり、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めていきます。

ご理解と御協力を賜りますようお願い致します。

施工者 (株)大三洋行
Tel052-321-8107

現場代理人 シンヤ ショウゴ
渋谷 尚吾

監理技術者 カマタ ヨシテル
鎌田 嘉輝

3ヶ月予定工程

準備工

立替工

路面復旧

1月

2月

3月

⑩ 平成30年度 津管内交通安全施設工事



横断図
40.0kp

下り車線

上り車線

工事箇所

中央分離帯

切削オーバーレイ

側道

車道

歩道

平成30年度津管内交通安全施設工事を行います松阪興産(株)です。

現在、既設の中央分離帯の撤去を終え、新しい中央分離帯の工事に入っています。既設舗装版の撤去の際、舗装の破片が通行車両に当たらない様、上下線の追越し車線を規制して作業を行っています。ご通行の際はご不便をおかけすると思いますが、安全第一での作業を行っていますので、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

施工者 松阪興産(株)
Tel0598-50-1260

現場代理人 キタガワ コウジ
北川 晃司

監理技術者 ヤマモト ヨシヒロ
山本 桂弘

3ヶ月予定工程

準備工

中央分離帯工

舗装工

1月

2月

⑪ 平成30年度 三重管内法面防災対策工事



三重管内法面防災対策工事を施工している東進産業(株)です。

12月から、中勢BPに隣接する法面を直す工事を行っております。工事期間中は、沿線及び地域住民の方々には、ご迷惑をお掛けすることとなりますが、安全第一に細心の注意を払い、早期完成を目指して行いますので何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


施工者 東進産業(株)
Tel.059-230-1200

現場代理人・監理技術者
にしだ よしあき
西下 佳明

3ヶ月予定工程

津地区① 中勢BP(下)
津地区② 中勢BP(下り)29.7kp
津地区③ 中勢BP(下)
津地区④ 中勢BP(上下)35.2kp
伊勢地区23号(上り)61.0kp

1月 2月 3月



⑫ 平成30年度江戸橋歩道橋撤去工事



平成30年度江戸橋歩道橋撤去工事を施工します宇野重工株式会社です。
工事内容は、国道23号津市江戸橋歩道橋の撤去工事です。横断歩道橋の上部・下部工の撤去に伴い、夜間規制を行って作業をしていきます。
1月は歩道橋の基礎部分の撤去を予定しております。
地域住民の皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。


施工者 宇野重工株式会社
Tel.0598-51-5321

現場代理人 オカモト ヒデキ
岡本 英樹
監理技術者 オカモト ヒデキ
岡本 英樹

3ヶ月予定工程

横断歩道橋撤去工

1月 2月 3月



⑬ 平成30年度 松阪地区橋梁補強補修工事

新愛宕橋




松阪地区橋梁補強補修工事の施工を行っている株式会社 田村組です。
12月上旬に工事用道路盛土が完了し、12月下旬に橋脚巻立て工の床掘り作業が完了し、1月から薄肉モルタル巻立て工へと現場を進めていく予定です。
工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解と御協力を賜りますようお願いいたします。



施工者 株式会社 田村組
Tel 0598-67-9396
(現場事務所)
アラキ ダイシ
現場代理人 荒木 大司
ナカムラ ミツノブ
監理技術者 中村 充延

3ヶ月予定工程

橋脚巻立て工 薄肉モルタル巻
橋脚巻立て工 鞘管工



⑭ 平成30年度 相川橋耐震補強補修工事

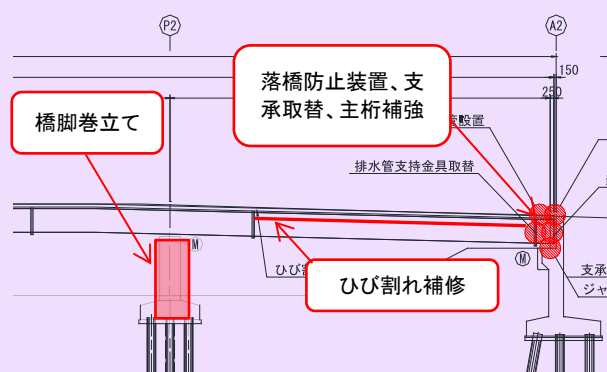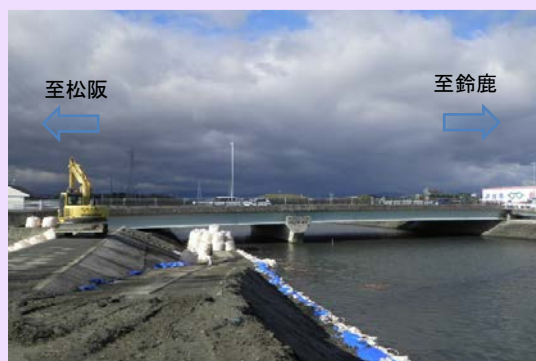


23号相川橋耐震補強補修工事を施工するアイトム建設株式会社です。
12月中旬に工事用道路工が完了し、引き続き河川内に鋼矢板を2月下旬頃まで行い、橋脚巻立て工を施工する予定です。並行して1月初旬より足場を設置し、橋のひび割れ補修、落橋防止装置工、支承取替工の調査等を行う予定です。期間中は安全第一で施工を行いますのでご理解、ご協力の程ようお願いいたします。

施工者 アイトム建設(株)
Tel 059-355-6000

現場代理人 パンノ タカシ
坂野 貴志
ヒガシデ コウスケ
監理技術者 東出 康助

3ヶ月予定工程

仮設工(矢板打込)
橋脚巻立て工
仮設工(足場工)
支承取替工
ひび割れ補修



⑮ 平成30年度 津地区橋梁耐震補強工事

国道23号 26.0kp 付近 塔世橋




国道23号線塔世橋の橋脚の耐震補強を行っております株式会社丸昇建設です。
工事用の道路が完成して12月末より仮締切工（鋼矢板打込み作業）を行っていきます。
工事期間中、周辺住民の方々には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力の程、お願いいたします。

施工者 株式会社 丸昇建設
TEL0597-22-0075

現場代理人・監理技術者
オオカワ ミツジ
大川 光二

3ヶ月予定工程

土留・仮締切工
橋脚巻立て工（床掘り）
橋脚補強工（底版補強）
橋脚巻立て工



⑯ 平成30年度 津管内事故対策工事




平成30年度 津管内事故対策工事を行っております、株式会社田村組です。
主な工事内容は、国道23号線津管内の逆走防止対策や中央分離帯の安全対策、カラー舗装等による交差点付近の事故対策となります。
工事中は、交通規制を伴い、夜間施工が大半となります。沿線及び地域住民、道路利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、安全優先にて工事を進めてまいります。何卒、ご理解と御協力を賜りますようお願い致します。

施工者 株式会社 田村組
TEL0598-21-2563

現場代理人 なかす のぶゆき
中須 伸行
監理技術者 みちした けいた
道下 敬太

3ヶ月予定工程

津地区③
津地区①
津地区②
松阪地区
明和地区
伊勢地区



⑪ 平成30年度 笹笛川橋耐震補強工事

国道23号 52.8kp 付近 笹笛川橋




笹笛川橋の耐震補強工事を施工しています宮本建設株式会社です。
1月から、河川内に入るための進入路と作業ヤードを作っていきます。そして、川に影響が出ないように仮締切を行います。その後、橋脚巻立てと落橋防止装置の施工を行う予定です。工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めていきますので、ご理解と御協力を賜りますようお願い致します。

施工者 宮本建設(株)
TEL0596-28-6131

現場代理人 カネダ ヤスヒト
金田 靖人
監理技術者 オマ ケンゴ
尾間 賢吾

3ヶ月予定工程

仮設進入路・仮締切工
P2橋脚 橋脚巻立て
P2橋脚 落橋防止装
A2橋台 落橋防止装



～まちかど散策～



今回はかかしシリーズ第4弾にして、史上最強、津のナマハゲバージョンです。来訪神行事がユネスコの無形文化遺産に平成30年11月29日に登録されたのをうけてでしょうか。なく子はイネが〜！わるい子はイネが〜！とさけんでおります。前回の第三弾では満面の笑みを浮かべていた女性もあまりの怖さに顔を覆ってしまいました。これをみたら神様が訪れ今年一年いい年になるような気がしますね。

江戸橋歩道橋撤去



平成30年11月29日津市江戸橋の歩道橋撤去作業が行われました。夜間の作業にもかかわらず、近隣の住民の方も見に来てくださいました。近くに住む女性は「長年この場所にあり、慣れ親しんだ歩道橋がなくなるので最後を見届けたかった」と話されていました。夜間2:30～3:30まで国道23号上下線を通行止めにしての作業となりましたが、大きな混乱も無く皆様のご理解、ご協力のもと、無事に作業が終わりましたこと、厚く御礼申し上げます。

雪氷出陣式



雪氷対策期間を迎えるにあたり、平成30年11月30日に国道25号(名阪国道)守田基地において、三重県内の国道事務所(三重河川・紀勢・北勢)、三重県警、雪氷・維持業者と合同で出陣式を行いました。「道の駅いが」にて、大雪により立ち往生車両が放置され緊急車両の通行に支障をきたした、との想定で車両を移動するという訓練を行いました。国土交通省は12月10日、今冬の大雪時からタイヤチェーン装着を義務付ける高速道路や国道13区間を発表しました。県内には該当区間はありませんが、三重県では、ノーマルタイヤの車両がわずかな積雪で立ち往生し、交通障害を引き起こすことがあります。ドライバーの皆さんには、なれない雪や路面凍結に備えてノーマルタイヤからスタッドレスタイヤへの交換など、冬装備をお願いします。

プラント見学会



松阪興産(株)の協力のもと、生コン、アスファルト、コンクリート二次製品の製造プラントの見学に行ってきました。普段の工事現場では見ることのできない製造過程を見ることができ勉強になりました。

所在地

〒514-0002

三重県津市島崎町315

電話:059-228-6990

FAX:059-223-6412

国土交通省 三重河川国道事務所
津国道維持出張所



管理区間

○国道23号

四日市市中里町～伊勢市宇治今在家町 L=70.2km

○国道23号中勢バイパス

鈴鹿市野町～鈴鹿市御園町

L= 4.1km

津市河芸町～松阪市小津町

L=24.0km

合計98.3km

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

道路の異状を発見したら・・・
道路緊急ダイヤル **#9910**
(通話料無料・24時間受付)

