

工事ニュース

平成30年 12月号

『国道1号笹原山中バイパス』の工事内容について

国土交通省のホームページでも閲覧できます。

<http://www.mlit.go.jp/index.html>

お知らせします。

① 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P 谷田地区東下部工事

受注者：山本建設(株) 現場代理人 田沢 稔
 監理技術者 眞田 貴弘
 TEL：050-5306-8677

お世話になっております。
 今月は、橋台躯体工の足場解体及び4号函渠の足場解体作業を行った後、埋戻し作業を進めて参ります。埋戻し作業時には、ダンプトラックの通行が増加します。国道1号及び農道通行の際は十分注意して走行願います。一般車両最優先、安全運転を心掛けますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【4号橋A1橋台】
 【8号,9号L型擁壁】
 【4号函渠】

- 12月の主な作業内容
- ★【4号橋 A1橋台】 足場解体、埋戻し
 - ★【8,9号L型擁壁】 埋戻し
 - ★【4号函渠】 型枠脱型、足場解体、埋戻し

② 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P エビノ木東道路建設工事

受注者：(株)山田組 現場代理人 鈴木 祐司
 監理技術者 鈴木 強
 TEL：055-986-2966

お世話になっております。
 今月は一度休止していたU型擁壁の左壁の施工を行い、埋戻し後、L型擁壁の地盤改良工を行います。また、変更契約により工期がH31年3月20日まで延長になりました。この変更契約に伴い、笹原新田工区の施工も追加になっております。笹原新田工区では、路体盛土及び小段排水を施工してまいります。工事車両、重機の騒音等に十分注意しながらの作業を心掛けていきますので、ご理解とご協力をお願いします。



【エビノ木工区】 【笹原新田工区】

- 12月の主な作業内容
- ★【擁壁工】 U型擁壁(左壁)→Eビノ木工区
 - ★【擁壁工】 地盤改良工→Eビノ木工区
 - ★【道路土工】 路体盛土→笹原新田工区
 - ★【排水構造物工】 小段排水→笹原新田工区

③ 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P 笹原新田地区西道路建設工事

受注者：(株)山田組 現場代理人 尾鷲 昌弘
 監理技術者 小柳出 浩
 TEL：055-986-2966

お世話になっております。
 先月を持ちまして、当工事の切回し道路及び起点側レベルバンクの現場作業は完了しました。今月は検査準備等の測量作業及び後片付けを行ってまいります。最後まで安全作業を心掛けて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【大曲切回し道路】 【恵明学園起点側レベルバンク】

- 12月の主な作業内容
- ★測量作業
 - ★後片付け

④ 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P 谷田地区西道路建設工事

受注者：加和太建設(株) 現場代理人 原 敏康
 監理技術者 藤井 雄也
 TEL：055-955-5836

お世話になっております。
 今月は6号函渠の足場の撤去、5号函渠の足場、型枠、鉄筋、コンクリート打設を行います。擁壁工では補強土壁のブロック設置や重力式擁壁の掘削、埋戻し、コンクリート打設を行う予定です。埋戻し土砂は終点側レベルバンクで改良を致します。コンクリートや資材、また土砂運搬等の大型車両が頻りに通行いたしますが、一般車両優先、交通ルールの厳守を心掛けますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【6号函渠付近】 【5号函渠・13号補強土壁】

- 12月の主な作業内容
- ★【函渠工】 足場組立、型枠鉄筋、コンクリート打設
 - ★【擁壁工(補強土壁)】 ブロック設置、埋戻し
 - ★【擁壁工(重力式擁壁)】 型枠設置、コンクリート打設
 - ★【道路土工】 掘削、埋戻し

⑤ 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P 山中新田地区中道路建設工事

受注者：小野建設(株) 現場代理人 稲葉 広幸
 監理技術者 渡邊 高好
 TEL：055-985-2560

お世話になっております。
 山中工区ではカルバート躯体本体工事に着手し、鉄筋・型枠・コンクリート打設を行います。エビノ木工区では先月に引き続き道路幅幅・切替え工事を行います。材料搬入に伴い大型車両が頻りに通行しますが交通誘導員・作業員共に一般車両優先、安全第一で作業を進めて参ります。また、12月7,8日の二日間、車線切替に伴う片側交互通行規制を実施します。近隣住民の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。



山中工区 エビノ木工区

- 12月の主な作業内容
- ★【山中工区】 現場打加バ工
 - ★【Eビノ木工区】 道路土工・舗装工・防護柵工・排水構造物工

⑥ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P エビノ木・谷田地区道路建設工事

受注者：TSUCHIYA(株) 現場代理人 西脇 祐太
 監理技術者 伊藤 博雄
 TEL：055-955-6710

お世話になっております。
 今月も引き続き本線部の掘削作業を行い、法面工・排水構造物も平行して行っていきます。また4号橋A2橋台側のL型擁壁深礎工は今月上旬に完了し、鉄筋工事・躯体工事を行います。土砂搬出の際には大型ダンプ車両が頻りに出入りしますが、一般車両優先と安全運転を心掛けて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【起点側】 【終点側】

- 12月の主な作業内容
- ★【道路土工】 掘削工・土砂運搬
 - ★【法面工】 グラウンドアカー工
 - ★【擁壁工】 鉄筋工・躯体工
 - ★【排水構造物工】 小段排水

⑦ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P 谷田・笹原新田地区道路建設工事

受注者：大旺新洋(株) 現場代理人 一円 孝寛
 監理技術者 川谷 仙
 TEL：055-928-5751

お世話になっております。
 今月は、擁壁工の基礎工事に着手し、土工では掘削が少しずつ進んでおります。工事の進捗に合わせ、工事用道路を通る車両も増えますが、交通誘導員を適切な場所での誘導、一般車両、地元優先と安全運転を心掛けますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【土工】
 【擁壁工】
 工事終点No.198
 工事起点No.146

- 12月の主な作業内容
- ★【道路土工】 掘削、残土運搬
 - ★【擁壁工】 基礎工 (EPトP 併工)
 - ★【仮設工】 工事用道路工

⑧ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P エビノ木2号橋PC上部工事

受注者：(株)ピーエス三菱 現場代理人 石井 一男
 TEL：055-985-2211

お世話になっております。
 今月は、工事に必要である詳細な計画を立案します。また、現場休憩所の設営を行います。先月には山中新田にある法生寺の前に現場事務所を設営いたしました。今後、運搬車両の出入りもありますので、交通誘導員の合図のもと、一般車両及び歩行者優先で作業いたしますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【箱根側より三島側を望む】

- 12月の主な作業内容
- ★【準備工】 現場休憩所設営

⑨ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P エビノ木3号橋PC上部工事

受注者：極東興和(株) 現場代理人 浅田 宏史
 TEL：090-5373-7263

お世話になっております。
 今月は、先月に引き続き工事の計画を進めていまして中旬から現場の施工を開始する予定にしております。作業内容といたしまして橋台の間に打設するコンクリートを支えるためのH鋼杭の建込みを打ち込んでいきます。施工にともないまして工事車両の搬出がでてまいります。交通誘導員により的確な合図を行い、一般車両及び歩行者優先で作業いたしますので、ご理解とご協力をお願い致します。




【三島側より箱根側を望む】

- 12月の主な作業内容
- ★【支保基礎工】 H鋼杭建込み

⑩ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P 4号橋PC上部工事

受注者：極東興和(株) 現場代理人 稲森 大輔
 TEL：090-9503-7096

お世話になっております。
 今月は、来年2月からの現場乗り込みに向けて、引き続き工事の詳細計画や橋桁の製作準備を進めております。12月には現場事務所の設置等も予定しており、地域の皆様と接する機会も増えてくるかと思っております。また、車両の通行については一般車両優先を心掛けて運転いたしますので、ご理解とご協力をお願い致します。

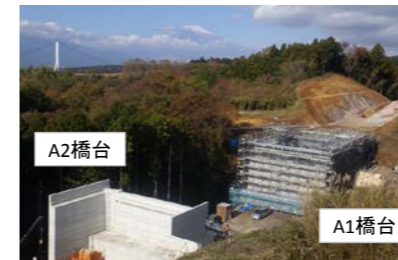

【A2側よりA1側を望む】

- 12月の主な作業内容
- ★【準備工】 詳細施工計画、橋桁製作準備 資機材の発注等

