

工事ニュース

令和元年 5月号

『国道1号笹原山中バイパス』の工事内容について

国土交通省のホームページでも閲覧できます。

<http://www.mlit.go.jp/index.html>

お知らせします。

① 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP
エビノ木・谷田地区道路建設工事
受注者：TSUCHIYA(株) 現場代理人 西脇 祐太
監理技術者 伊藤 博雄
TEL：055-955-6710

お世話になっております。
今月も引き続き国道1号現道の車線切替工事を行っています。4月15日に2回目の車線切替が完了し、次回は6月初旬頃に予定しております。近隣住民の皆様には交通規制等でご迷惑をお掛け致しますが、安全第一を心がけて行って参ります。
また1号函渠周辺につきましてもブロック張工に着手し、補強土壁工も平行して行います。搬入車両が頻りに出入りしますが、一般車両優先と安全運転を徹底して参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【起点側】

5月の主な工事内容
★道路土工 ★地盤改良工 ★擁壁工
★舗装工 ★ブロック張工 ★構造物撤去工

② 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP
谷田・笹原新田地区道路建設工事
受注者：大旺洋行(株) 現場代理人 一円 孝寛
監理技術者 川谷 仙
TEL：055-928-5751

お世話になっております。
皆様のご協力により、国道1号大曲を4月23日に切り回すことが出来たこと感謝いたします。
近隣住民の皆様には交通規制等でご迷惑をお掛け致しました。
工事の方は、本線の掘削から盛土、搬出を行い、法面工では鉄筋挿入を行います。擁壁工では地盤改良を行った後現場打ち擁壁を構築します。各種排水構造物も施工する予定です。
3号函渠回りの工事にも着手し残土を搬出いたします。工事用車両の通行や資機材の搬入等で多くありますが、安全第一、地元優先で作業をすすめますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【大曲切廻し完了】 【起点側から終点側 全景】

5月の主な工事内容
★道路土工：掘削・盛土・搬出
★法面工：鉄筋挿入工
★擁壁工 ★排水構造物工

③ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP
エビノ木2号橋PC上部工事
受注者：(株)ピーエス三菱 現場代理人 岡林 秀勝
監理技術者 石井 一男
TEL：055-985-2211

お世話になっております。
皆様のご協力により、先月で無事橋梁本体が完成いたしました。
今月の中旬以降には国道1号線からも橋梁の全景が見えるようになります。
今月は、橋梁と橋梁の前後の土の部分をつなぐ橋脚の胸壁と翼壁の施工を行います。
生コン車等の運搬車両の出入りには十分注意し、交通誘導員の合図のもと一般車両及び歩行者優先にて作業致しますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【箱根側から三島側を望む】

5月の主な工事内容
★【橋脚躯体工】
鉄筋・型枠・コンクリート打設
★【架設支保】
架設支保解体

④ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP
エビノ木3号橋PC上部工事
受注者：極東興和(株) 現場代理人 周藤 雅治
監理技術者 浅田 宏史
TEL：055-985-2552

お世話になっております。
先月は2回コンクリートの打設を行いまして、現在3回目のコンクリート打設に向けて進めております。
5月の中旬頃に3回目のコンクリート打設を予定しております。橋体部分が完成いたします。
コンクリート打設の際に生コン車の搬入を行うときには早めの合図を徹底し、交通誘導員の合図に従い一般車両及び歩行者を優先し作業を行ってまいります。引き続きご理解とご協力をお願い致します。



【三島側から箱根側を望む】

5月の主な工事内容
★【PC箱桁製作工】
コンクリート打設・緊張・グラウト

⑤ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP
4号橋PC上部工事
受注者：極東興和(株) 現場代理人 西田 希
監理技術者 稲森 大輔
TEL：055-985-2552

お世話になっております。
先月で橋桁の架設作業が完了し、機材の解体・撤去を行いました。今月は橋桁同士を横繋ぎするためのコンクリートを打設し、ケーブルを通して緊張することで橋桁を一体化させる作業を行います。
コンクリート打設等の工事車両の入退場が多くなる日もありますが、引き続き第三者優先を心がけて実施いたしますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【A2側よりA1側を望む】

5月の主な工事内容
★【横組工】 横筋鉄筋型枠組立
コンクリート打設
横締めケーブル緊張・グラウト注入
★【床版工】 床版鉄筋型枠組立

⑥ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP
笹原新田地区道路建設工事
受注者：(株)山田組 現場代理人 尾鷲 昌弘
監理技術者 小柳 出 浩
TEL：055-986-2966

お世話になっております。
今月より現場の着手を開始します。伐採時の倒木の際はクレーンによる吊り込みを行いながら作業を実施し、振動・騒音防止に努めます。伐採後は構造物撤去の作業を実施しますが搬出の際は適切な場所に交通誘導員を配置し一般車両及び歩行者を優先して作業を行ってまいります。
近隣の方々にはご不便をおかけする事があるかとおもいますが、安全第一に施工を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。




【大曲交差点】

5月の主な工事内容
★伐採工
★構造撤去工
★路体盛土工

⑦ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP
山中新田谷田地区道路建設工事
受注者：小野建設(株) 現場代理人 稲葉 広幸
監理技術者 大川 元澄
TEL：055-986-2966

お世話になっております。
新規工事を受注しました小野建設です。主な工事内容は谷田工区において道路土工・地盤改良工・擁壁工、エビノ木工区において排水構造物工・緑石工・道路付属施設工の施工を行います。
近隣の方々にはご不便をおかけする事があるかとおもいますが、安全第一で作業をすすめますので、ご理解とご協力をお願い致します。

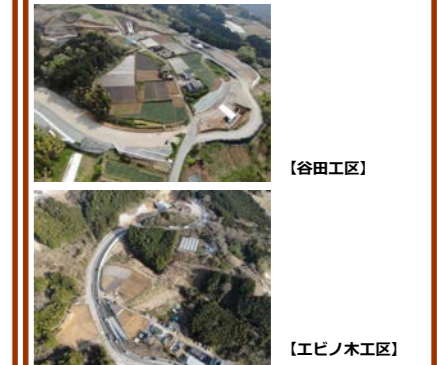

【谷田工区】

【エビノ木工区】

5月の主な工事内容
★起工測量
★路体盛土工
★擁壁工

⑧ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP
谷田地区舗装工事
受注者：大林道路(株) 現場代理人 吉田 浩介
監理技術者 吉田 浩介
TEL：080-1124-2067

お世話になっております。
新規工事を受注しました大林道路(株)です。谷田地区において主にアスファルト舗装工事の施工を行ってまいります。
近隣の方々にはご不便をおかけすることがあるかと思いますが、安全には十分に配慮して作業を進めてまいります。ご理解とご協力をお願い致します。



【工事起点側】



【工事終点側】

5月の主な工事内容
★準備工（現地踏査等）

⑨ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP
笹原新田地区西舗装工事
受注者：(株)NIPPO 現場代理人 橋本 末廣
監理技術者 橋本 末廣
TEL：090-4235-2844

お世話になっております。
新規工事を受注しました(株)NIPPOです。笹原新田地区において主に舗装工事の施工を行ってまいります。
今月は工事を行っていく前段取りの準備工を行います。
工事車両の搬入の際には十分に注意し、一般車両及び歩行者優先にて作業を行ってまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【工事起点側】



【工事終点側】

5月の主な工事内容
★準備工（現地踏査等）

⑩ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP
山中新田地区舗装工事
受注者：世紀東急工業(株) 現場代理人 高橋 俊介
監理技術者 大川 修平
TEL：055-083-0833

お世話になっております。
新規工事を受注しました世紀東急工業(株)です。当工事の主な工事内容は、山中新田地区において舗装工・排水構造物工、道路付属施設工の施工を行います。舗装工事のため、道路の仕上げを行ってまいります。地域の皆様にとって、道路の仕上げを行ってまいります。地域の皆様にとって、快適に走っていただけるよう綺麗な道路を作りたいと思います。
今後工事が進むにつれて近隣の方々にはご不便をおかけする事があるかとおもいますが、安全第一、第三者優先、交通ルールの厳守で作業を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。




【中間点より起点側を望む】

5月の主な工事内容
★準備工（現地踏査等）
★起工測量

⑪ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP
CCTV設備工事
受注者：NDS(株) 現場代理人 牛尾 崇敬
監理技術者 牛尾 崇敬
TEL：054-262-6275

お世話になっております。
新規工事を受注しましたNDS(株)です。主な工事内容は、笹原山中バイパスにおいてCCTV設備(道路管理用カメラ)の設置をする工事です。
近隣の方々にはご不便をおかけする事があるかとおもいますが、安全第一に施工を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。

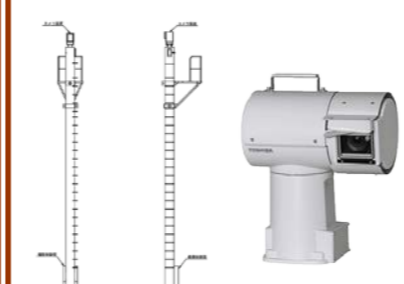

【カメラ支柱姿図(参考)】

5月の主な工事内容
★準備工（機器製作）

⑫ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP
道路照明工事
受注者：小林電気工業(株) 現場代理人 日吉 徳之
監理技術者 日吉 徳之
TEL：055-932-2151

お世話になっております。
新規工事を受注しました小林電気工業(株)です。主な工事内容は笹原山中バイパスにおいて照明灯の設置と附属する電源工事などを行います。
近隣皆様には工事車両通行などで、ご不便をおかけする事があるかとおもいますが、安全第一で作業をすすめる道路に明かりを取り付けたいと思いますので、ご理解とご協力をお願い致します。

【照明灯設置イメージ写真】



5月の主な工事内容
★準備工（機器製作）

