


工事進捗

1月期

新丸山ダム工事事務所 令和6年度

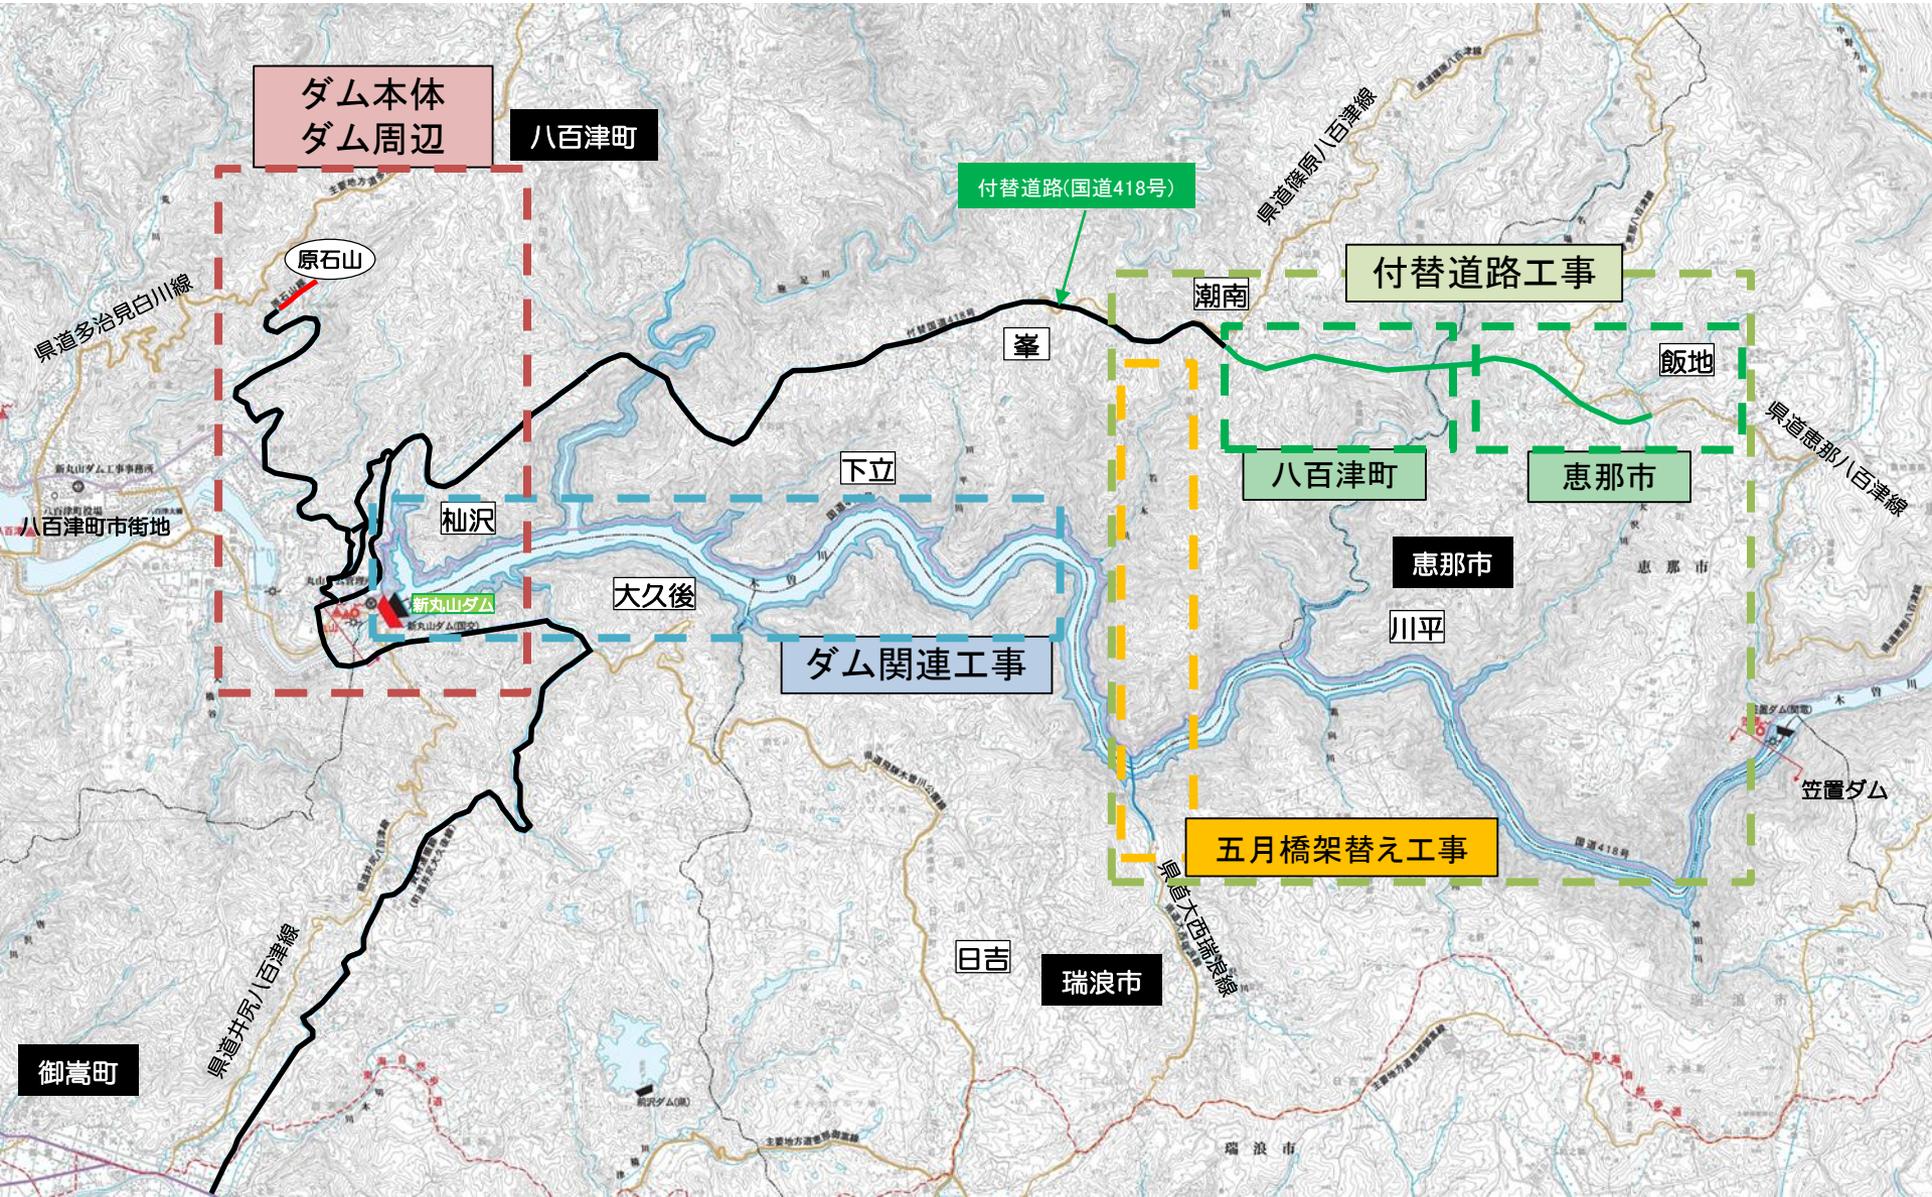

新丸山ダム 工事だより1月期

ダム本体・ダム周辺

発注者



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)




ホームページ

回覧




新丸山ダムのつくりかた

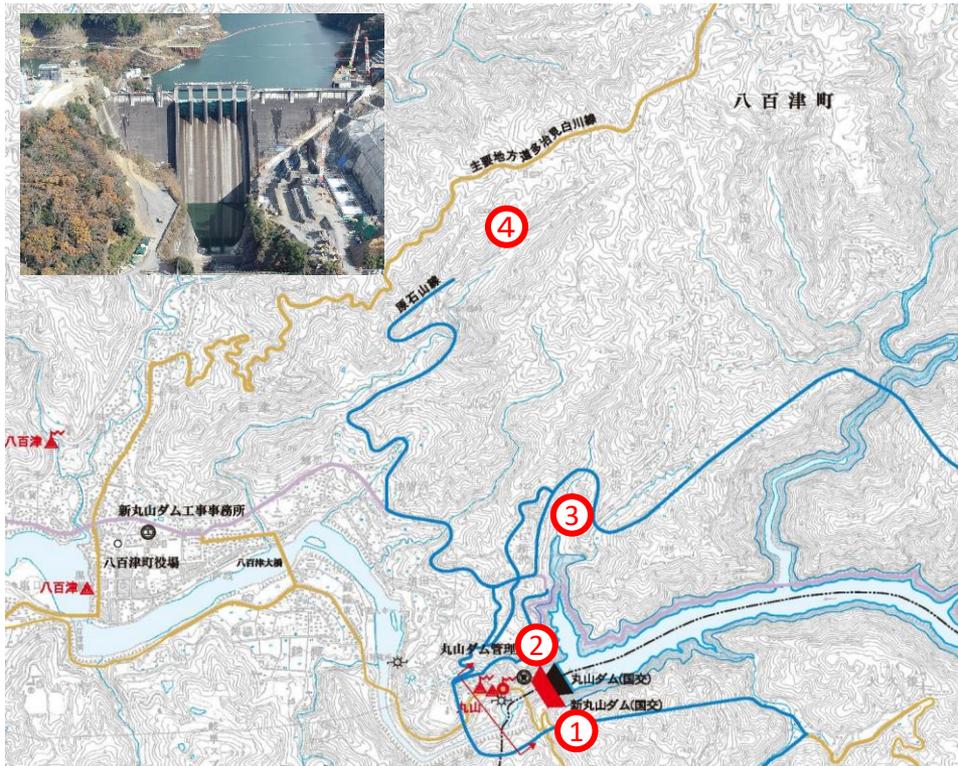

令和2年度 新丸山ダム本体建設第1期工事

- ①ダム本体左岸
- ・減勢工部のコンクリート打設を行っています (2024年11月20日から開始)
 - ・ダム基礎部の硬い岩盤を出すため発破をしながら掘削しています

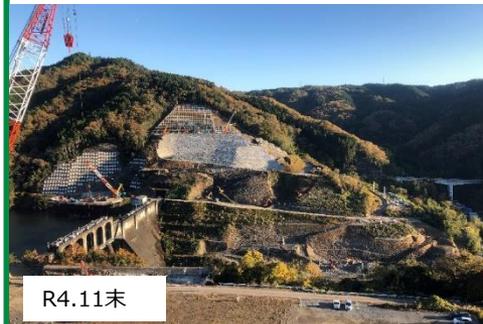

R4.11末




R6.12末

- ②ダム本体右岸
- ・ダム用コンクリート製造設備を設置しています
 - ・製造したコンクリートを運ぶ設備の操作、コンクリートの試験等を行う施設を建設しています
 - ・ダム基礎部の硬い岩盤を出すため発破等を併用しながら掘削し、法面の保護工を行っています



R4.11末

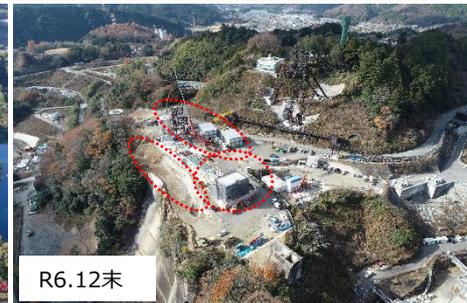

R6.12末

- ③骨材製造設備
- ・ダムのコンクリートに用いる石や砂(骨材)を製造しています
 - ・製造した石や砂(骨材)を運ぶ設備(密閉式吊下げ型コンベヤ)を設置しています



R6.12末



- ④原石山
- ・ダムのコンクリートに用いる石や砂(骨材)の原石を採取しています
 - ・採取した原石を大きめに砕き、ダンプトラックで骨材製造設備へ運搬しています



R6.12末



新丸山ダム 工事だより 1月期 ダム関連(貯水池)

発注者



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



ホームページ

回覧




新丸山ダムのキャラクター
しんまるくん

①令和5年度 新丸山ダム貯水池右岸杉沢地区下流地すべり対策工事
引続き、地すべり対策を行っています。



②令和5年度 新丸山ダム貯水池右岸杉沢地区上流地すべり対策工事
引続き、地すべり対策を行っています。

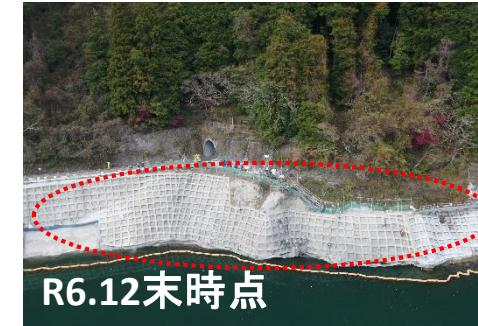

③令和5年度 新丸山ダム貯水池右岸潮南地区伐採工事
引き続き、伐採作業を行っています。




④令和6年度 新丸山ダム左岸大久後地区管理用道路整備工事
擁壁の施工を開始いたしました。



⑤令和6年度 新丸山ダム貯水池伐採工事
伐採作業が12月末に完了いたします。



⑥令和6年度 新丸山ダム貯水池右岸下立係船設備整備工事
船着場の施工を行っています。

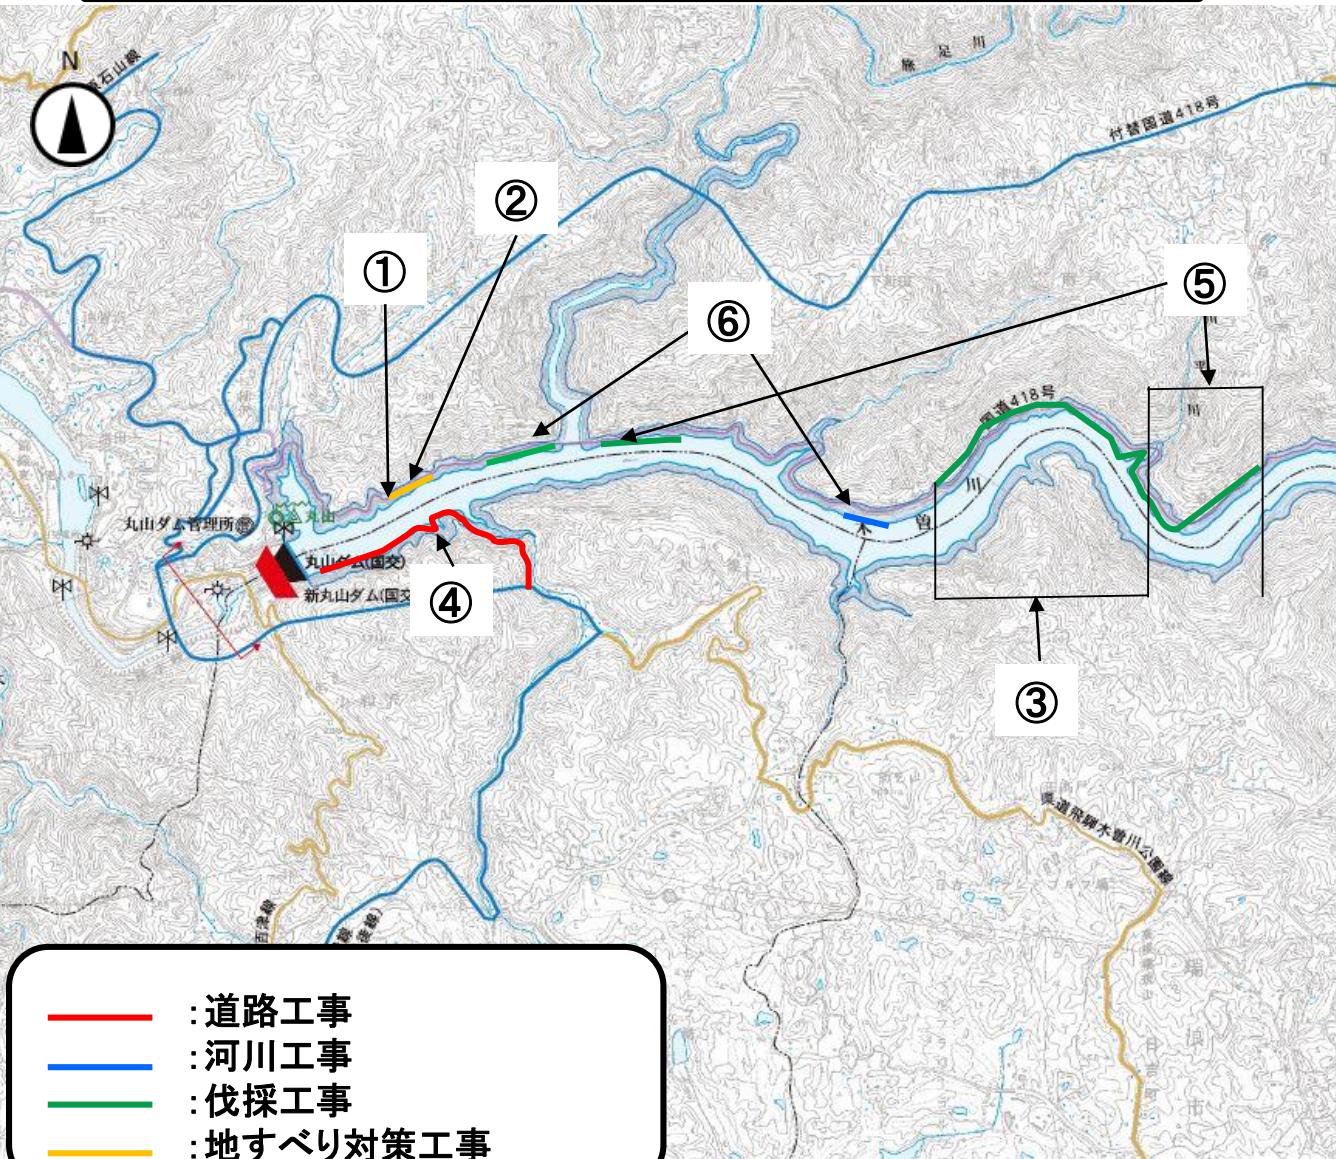

通行規制情報(国道418号)

・令和6年度 新丸山ダム貯水池右岸下立係船設備整備工事

地すべり対策工事及び伐採工事等において、通行規制を行います。

・規制区間: 下図の赤○付近

・規制期間: 令和6年7月17日(水)から令和7年1月31日(金)(予定)

・規制時間: 平日(9:00~12:00、13:00~17:00)一時通行止め



情報共有

・無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行について

丸山ダムの堤体や貯水池、その周辺では工事や作業が多く、ダム見学も開催しております。

事故の発生防止や、他の無人航空機の飛行との飛行ルート調整、コントローラ等の回線の混線を避けることを目的とし下記について遵守願います。

○丸山ダム堤体や堤体付近貯水池の周辺で無人航空機の飛行をされる方は、予め丸山ダム管理支所へご連絡ください。

丸山ダム管理支所 TEL:0574-43-1108
(平日8:30~17:00(土日祝日を除く))

○丸山ダム堤体や堤体付近貯水池の周辺で無人航空機の飛行をされる方は、以下にご注意ください。

- ・航空法等の関係諸規定を遵守する
- ・発電設備や工事現場の上空飛行や撮影をしない
- ・一般の方の立入禁止区域に立入をしない
- ・地元の方や他の来訪者の方とのトラブルが生じないよう気をつける
- ・無人航空機の落下等により他者(ダム関係施設を含む)への損害が生じた場合、損害賠償を請求をされることがある
- ・丸山ダム管理支所は無人航空機の飛行に関する一切の責を負わず、事故機回収等の便宜供与も行わない



発注者



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)




ホームページ



国道418号
イメージ動画

新丸山ダム 工事だより 1月期 付替国道418号(八百津町)関連

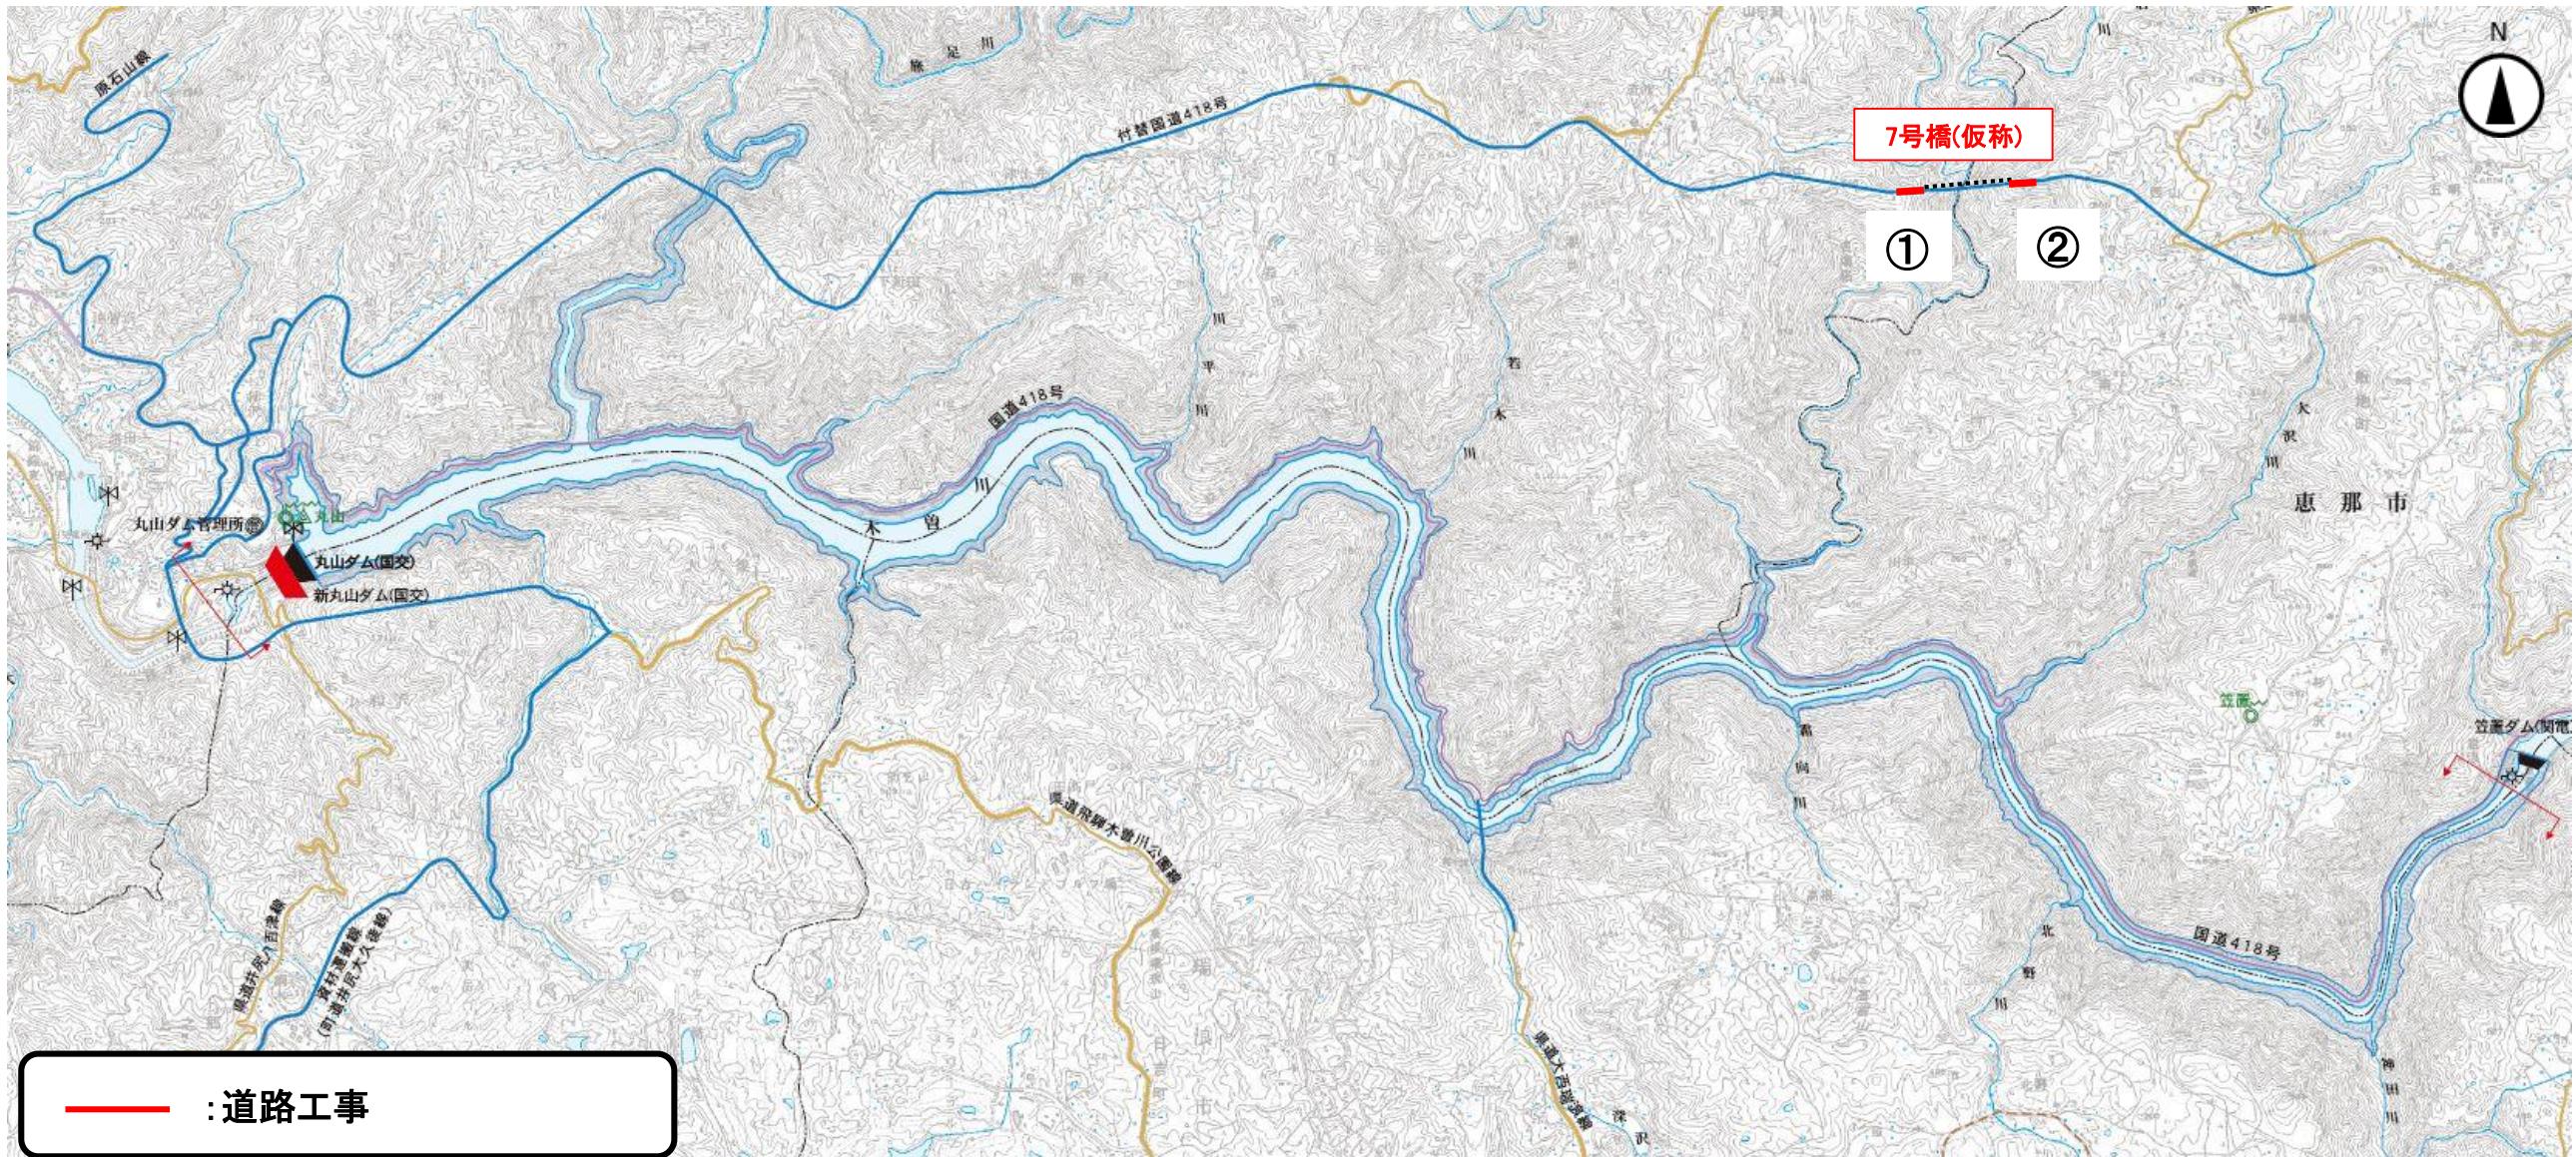

①令和5年度 新丸山ダム国道418号7号橋仮橋工事 3段目の仮橋が約14m伸びました。



②令和4年度 新丸山ダム国道418号7号橋飯地下部工事 3段目の仮橋が約6m伸びました。



新丸山ダム 工事だより 1月期 付替国道418号(恵那市)関連

発注者



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



ホームページ



国道418号
イメージ動画

回覧



新丸山ダムのキャラクター
しんまるくん



①令和5年度 新丸山ダム国道418号7号橋仮橋工事
3段目の仮橋が約14m伸びました。



着手前(R6.3時点)



R6.12末時点

3段目仮橋

②令和4年度 新丸山ダム国道418号7号橋飯地下部工事
3段目の仮橋が約6m伸びました。



着手前(R5.1時点)



3段目仮橋

R6.12末時点

③令和6年度 新丸山ダム国道418号五明地区道路整備工事
令和6年10月着手、工事準備中



着手前(R6.11時点)

通行規制情報(新大沢川橋周辺)

車両通行止め箇所位置図



【令和6年度 新丸山ダム国道418号五明地区道路整備工事】 予告

規制場所: 県道恵那八百津線

規制内容: 車両通行止め規制(終日) **歩行者通行可**

実施時期: 令和7年1月13日～令和7年8月29日(予定)(土日祝含む)

規制図



付替国道418号の整備による走行時間低減効果

- ①道路の安全性が大幅に向上
 - 道路幅の拡幅やカーブが多い山道区間の減少により安全な走行が可能
- ②アクセス向上
 - 大幅な時間短縮 (A-A' 区間) 供用前 約75分 供用後 約35分
※交通状況等により異なります。
 - 地域資源の相互利用 (人道の丘公園、飯地高原、恵那市街(中山道大井宿等))

古民家茶屋・陶芸工房



福祉施設



県道恵那八百津線



山の直売所



飯地高原



人道の丘公園



付替国道418号



旧県道篠原八百津線



恵那市飯地町

新丸山ダム

八百津町

凡例

- 現道
 - - - 計画・整備中区間
 - 整備完了区間
- (令和6年6月時点)

新丸山ダム 工事だより 1月期 五月橋架替え(八百津町・瑞浪市)関連

発注者

国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



ホームページ




新五月橋(仮称)イメージ動画



五月橋架替えの工事用道路動画



新丸山ダムのキャラクター しんまるくん

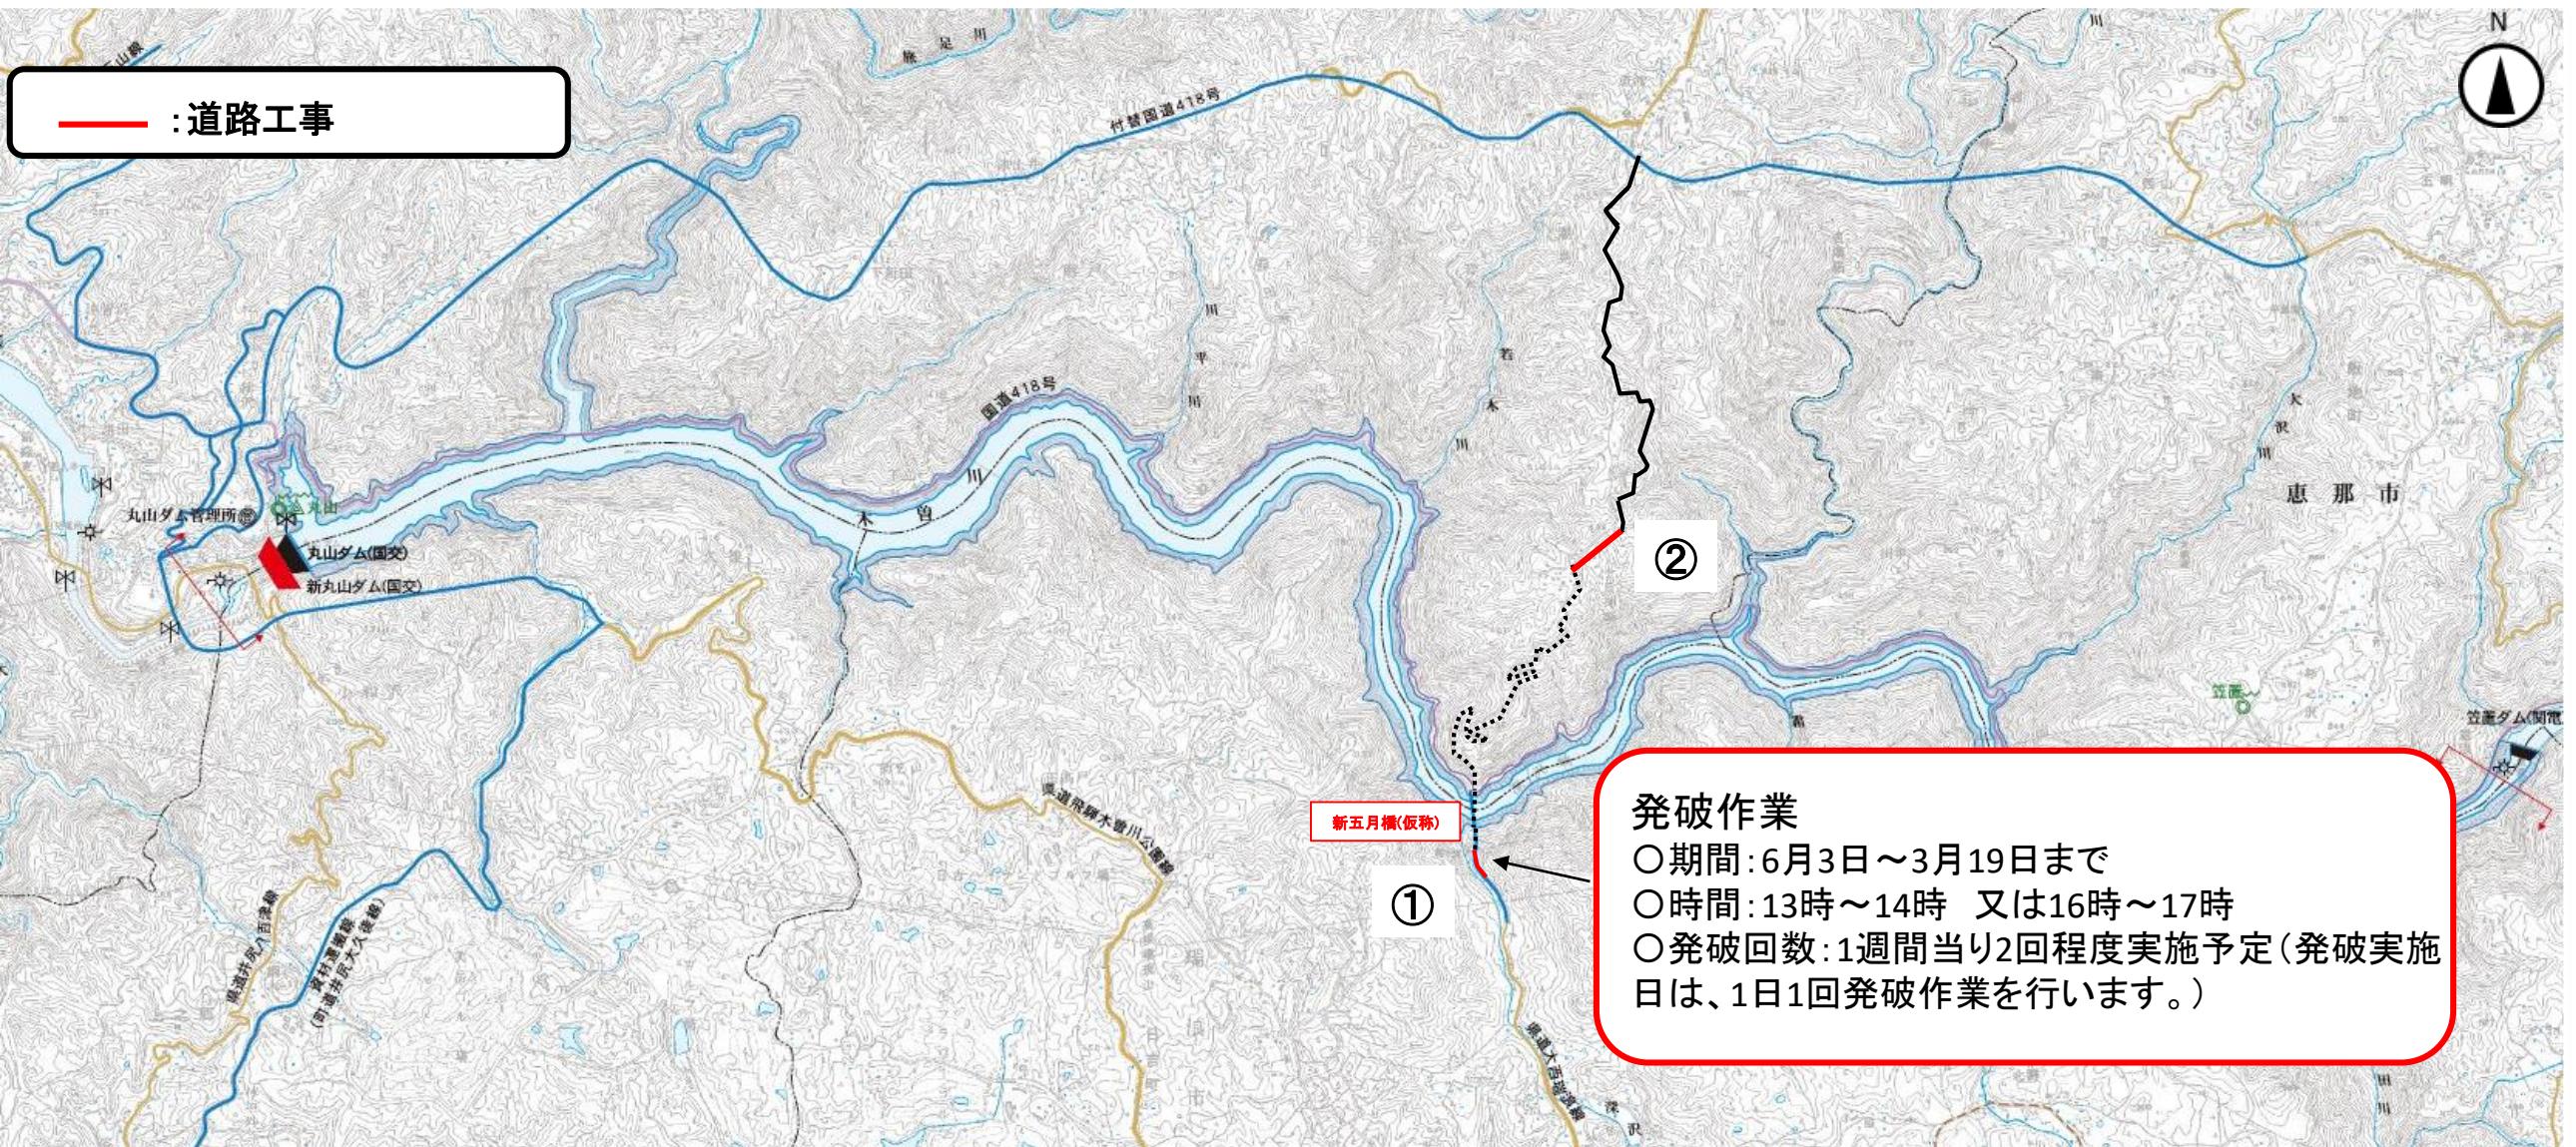

発破作業
 ○期間:6月3日～3月19日まで
 ○時間:13時～14時 又は16時～17時
 ○発破回数:1週間当り2回程度実施予定(発破実施日は、1日1回発破作業を行います。)

①令和5年度 新丸山ダム大西瑞浪線日吉地区道路建設工事
 引き続き、道路を作るため掘削を行っています。



着手前(R6.4時点)



R6.12末時点

②令和6年度 新丸山ダム十日神楽地区道路整備工事
 (令和6年12月着手、工事準備中)

通行規制情報（県道大西瑞浪線）

- ・県道大西瑞浪線(南側:旧衛生センター跡付近)は、工事のため、一般車両及び歩行者の通行が出来ません。
- ・現五月橋は道路管理者である岐阜県にて通行が規制されているため、通行ができません。

