


工事進捗

10月期

新丸山ダム工事事務所 令和8年度

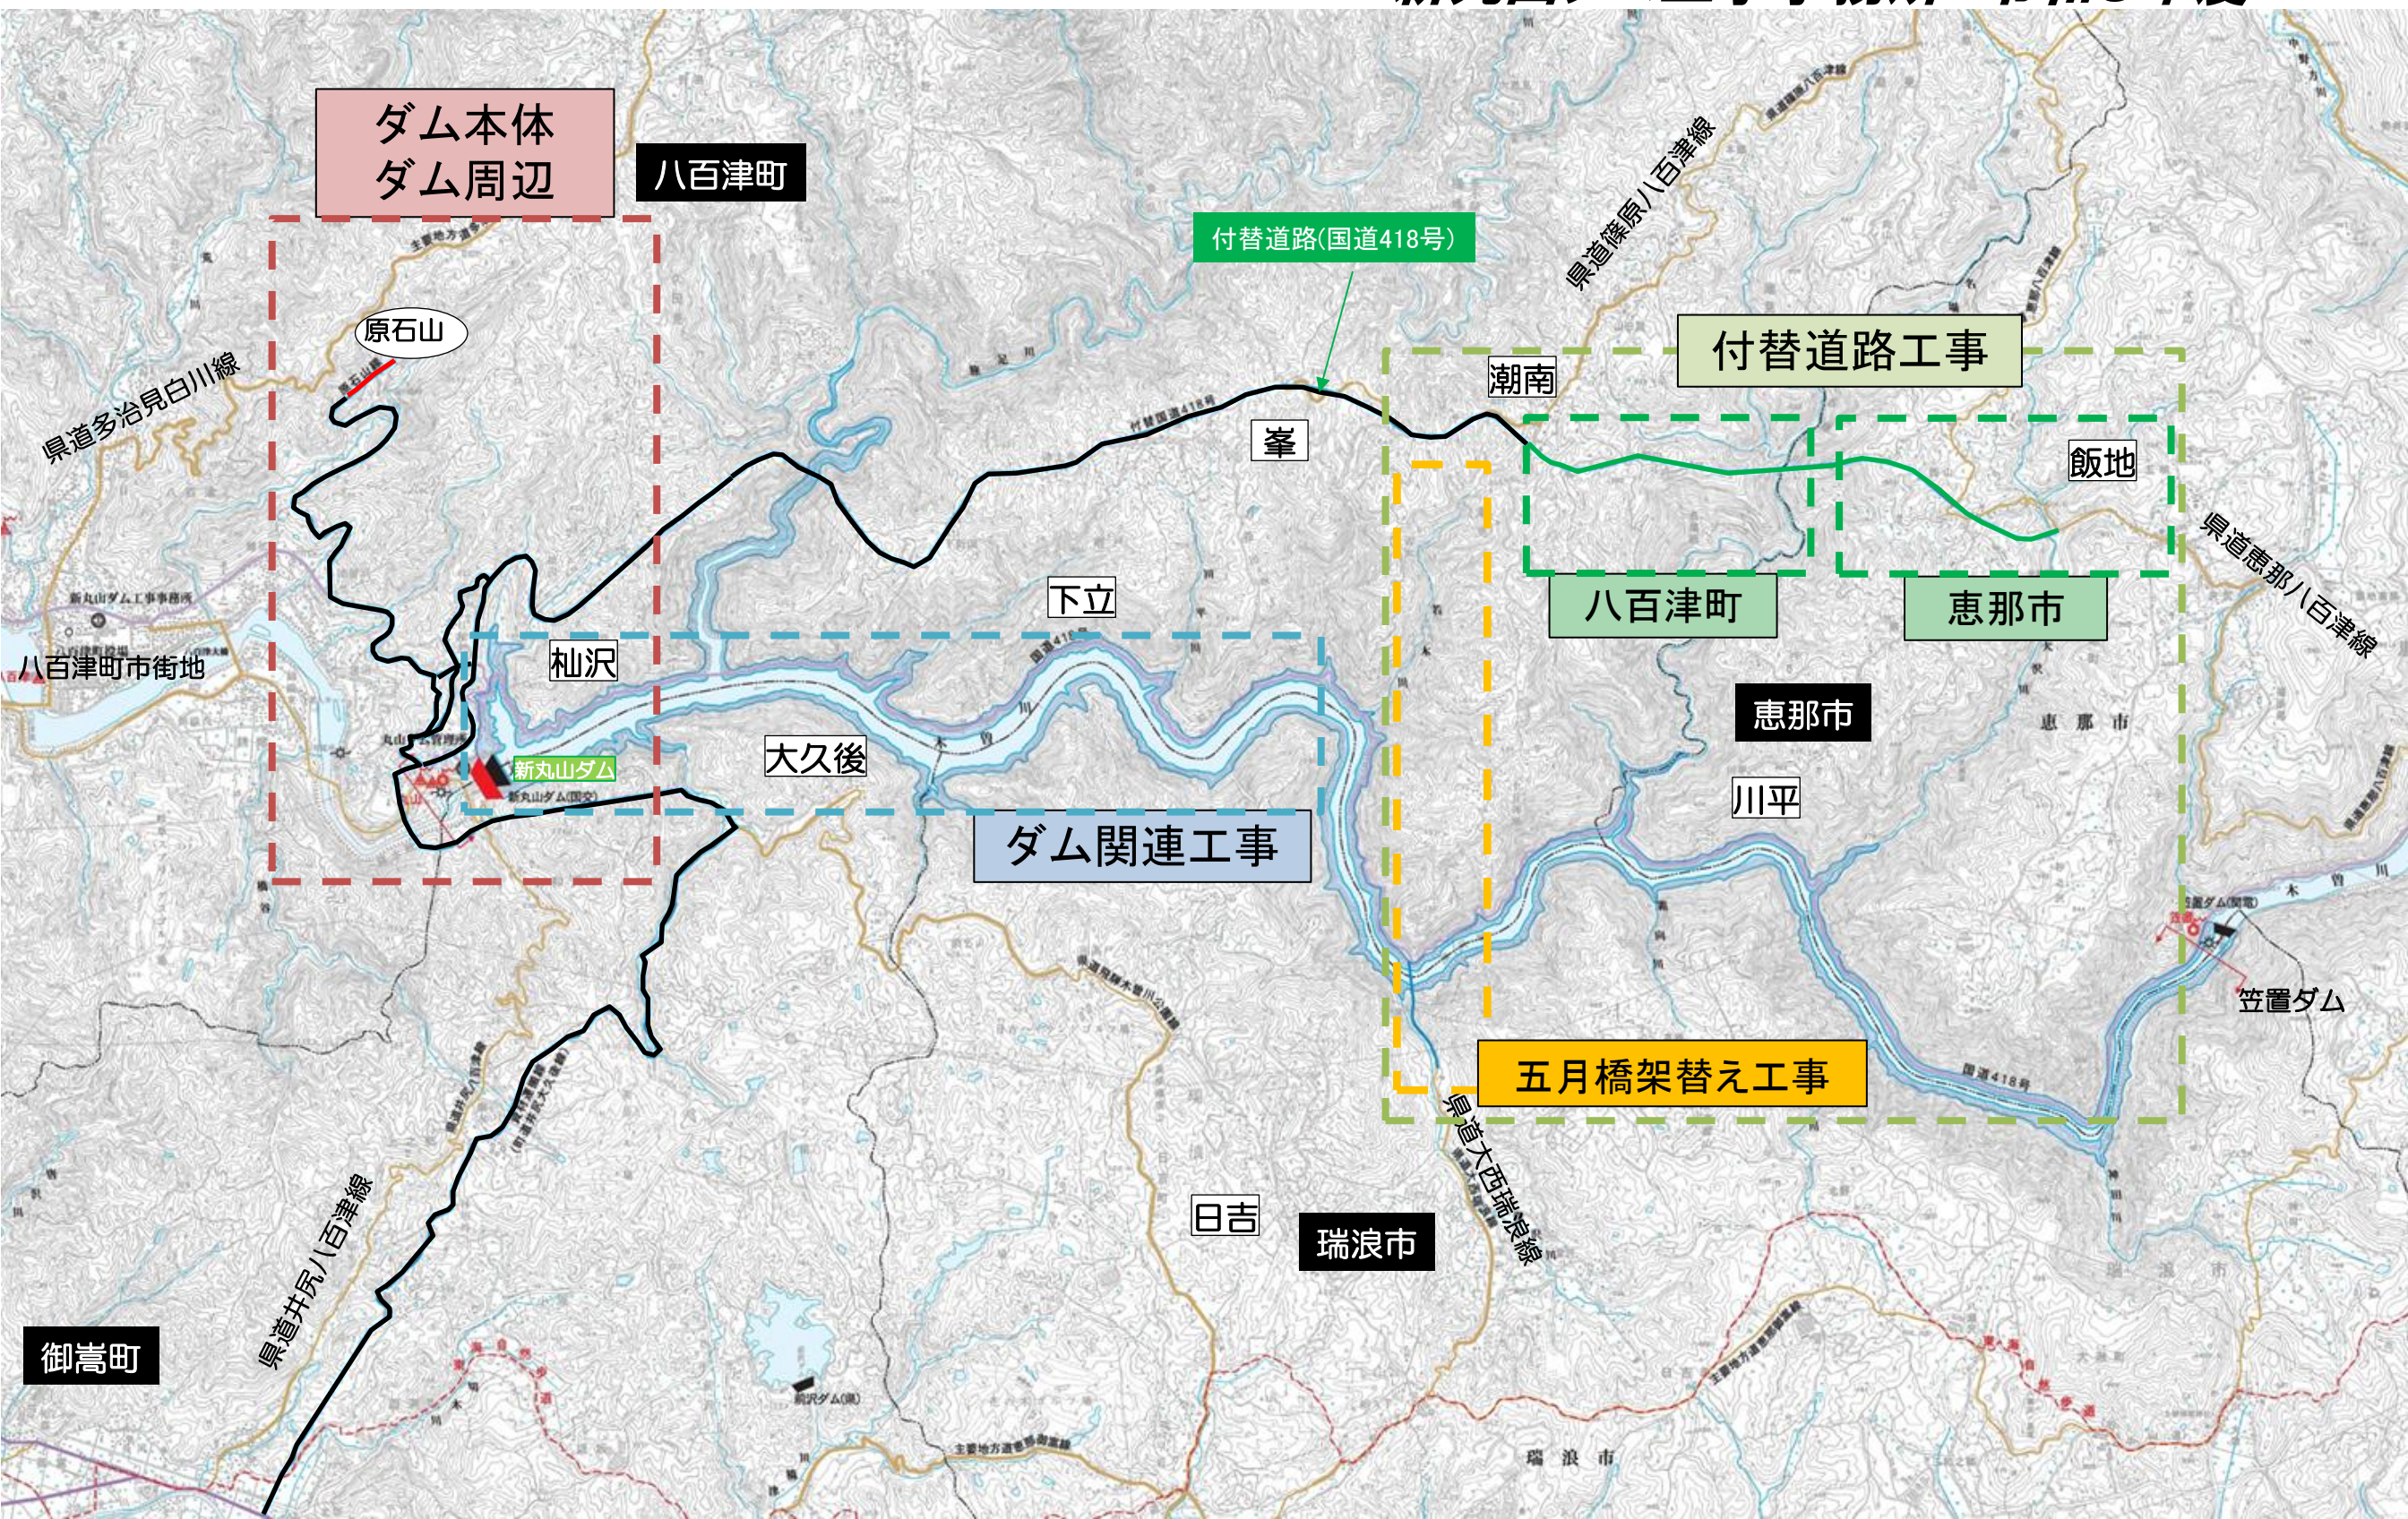

新丸山ダム 工事だより 10月期 ダム本体・ダム周辺

発注者



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



ホームページ



新丸山ダムのキャラクター
じのまる

令和7年度 新丸山ダム管内維持修繕工事

①丸山大橋付近のダム右岸側に一時的な停車スペースを整備しました(写真の赤破線の箇所)




③ダム本体右岸

・ダム本体に用いるコンクリートを製造しています(左写真上の赤破線の建物)
・ダム基礎部の硬い岩盤を出すために、発破等を併用しながらの掘削や法面保護工を令和8年5月と比べて約4m下の標高で行っています(右写真の赤破線の箇所)



R8.9末時点

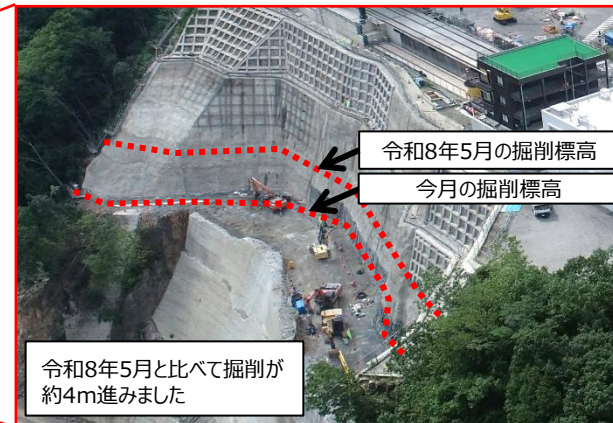

令和8年5月の掘削標高
今月の掘削標高

令和8年5月と比べて掘削が約4m進みました

④骨材製造設備

・ダムのコンクリートに用いる石や砂(骨材)を製造しています(右写真)



R8.9末時点




R8.9末時点

②ダム本体左岸

・ダム本体のコンクリートを構築しています
・タワークレーンを使用し、ゲート設備を設置しています(右写真の赤破線の箇所)



R8.9末時点

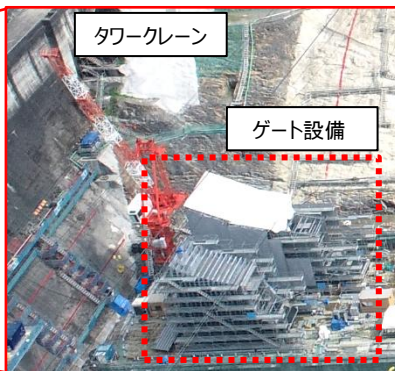

タワークレーン

ゲート設備

⑤原石山

・ダムのコンクリートに用いる石や砂(骨材)となる原石を令和8年3月と比べて約8m下の標高で採取しています(右写真の赤破線の箇所)



R8.9末時点




令和8年3月の採取標高

今月の採取標高

令和8年3月と比べて掘削が約8m進みました

令和6年度 新丸山ダム本体建設第2期工事

令和7年度 新丸山ダム常用洪水吐放流設備工事

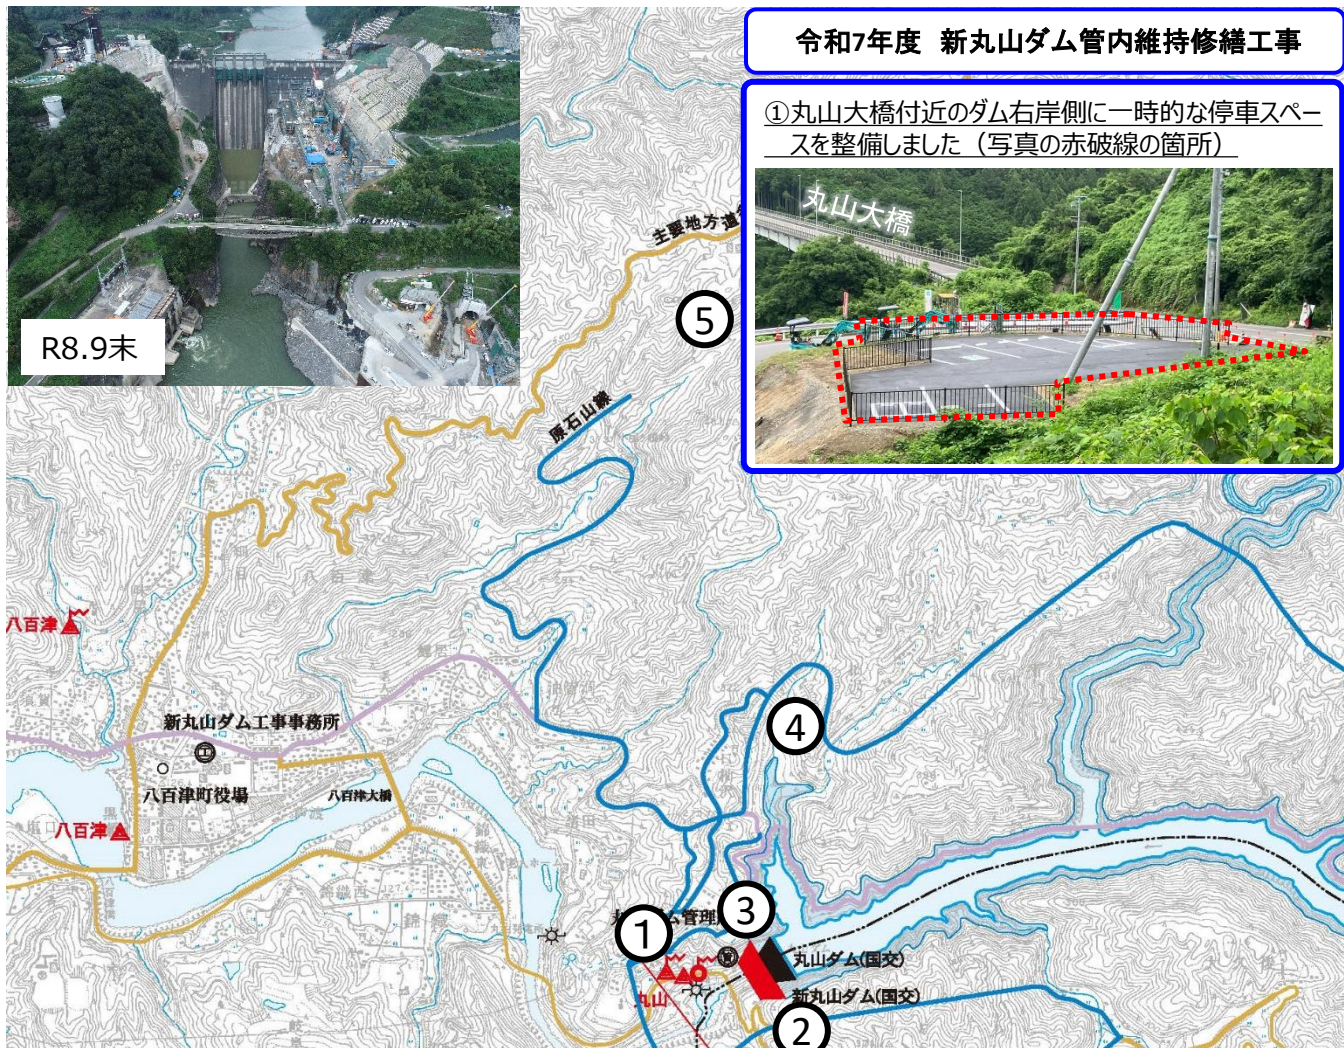

新丸山ダム建設事業 事業概要


新丸山ダム建設事業は、木曽川の河口から約90kmに位置する丸山ダムを20.2m嵩上げして機能アップを図るダム再生事業です。

丸山ダムの下流側47.5mの位置に、新丸山ダムが丸山ダムに一部重なる形で嵩上げを行います。

新丸山ダムの堤体が完成した段階で、ダムからの放流をスムーズに流すために丸山ダムの上部を一部撤去します。



洪水時に新丸山ダムは、丸山ダムと比べて3.6倍の水を貯めることができます。7,200万m³の洪水調節容量のうち1,500万m³は、渇水時の河川環境の保全や用水の安定化等のために設けた不特定容量を予備放流により、洪水調節容量として有効活用します。

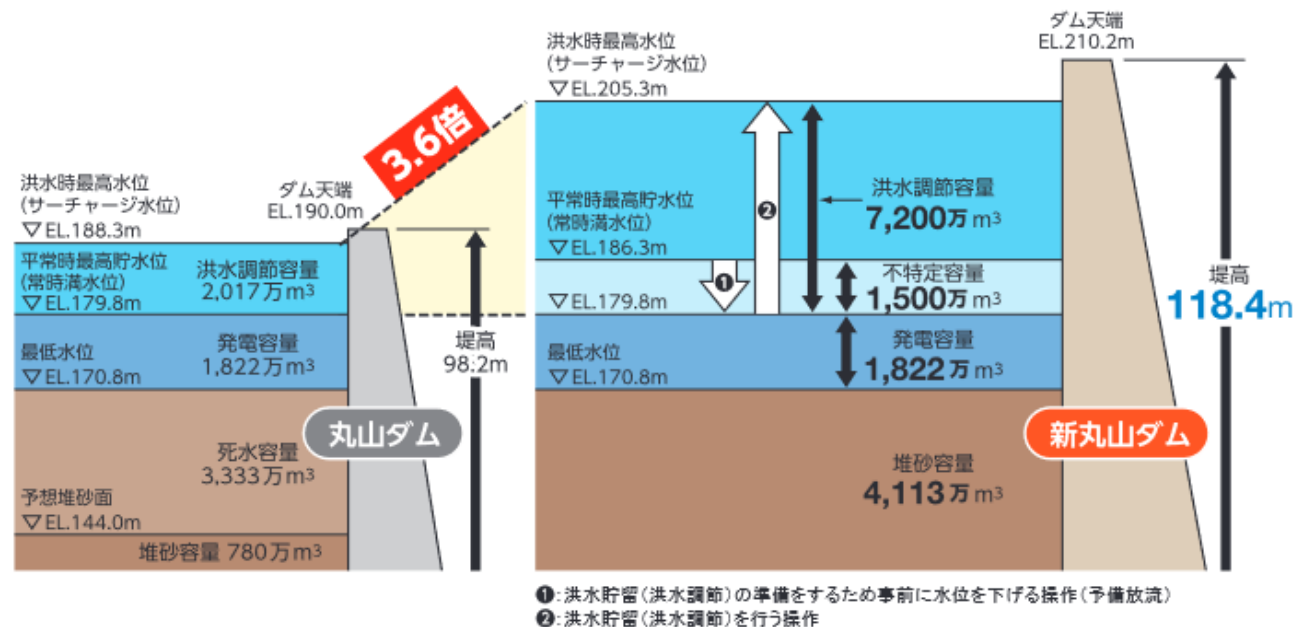

通行規制情報

・令和6年度 新丸山ダム本体建設第2期工事

新丸山ダム建設工事に関する工事車両通行や資機材等の運搬作業に伴い、当面の間通行規制を行います。

- ・規制区間: 下図の黄線範囲、青線(破線)範囲
- ・規制内容: 以下の図のとおり



新丸山ダム 工事だより 10月期 ダム関連(貯水池周辺整備)

発注者



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



ホームページ



③令和8年度 新丸山ダム左岸大久後地区管理用道路整備工事
擁壁の施工を行うための準備を行っています。



R8.9末時点

①令和7年度 新丸山ダム貯水池右岸杉沢地区上流地すべり対策工事
地すべり対策工の施工にあたり事前の準備を行っています。



R8.4末時点(着手前)



R8.9末時点

②令和8年度 新丸山ダム貯水池右岸下立地区係船設備整備工事
船着場の整備にあたり補強盛土を行っています。



R8.4末時点(着手前)



R8.9末時点

通行規制情報(ダム周辺道路)

・令和8年度 新丸山ダム貯水池右岸下立地区係船設備工事

河川工事において、通行止めを行います。

- ・規制区間: 下図の緑線区間
- ・規制期間: 令和8年8月17日から令和8年12月25日(予定)
- ・規制時間: 平日(9:00~12:00、13:00~17:00)通行止め



情報共有

・無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行について

丸山ダムの堤体や貯水池、その周辺では工事や作業が多く、ダム見学も開催しております。

事故の発生防止や、他の無人航空機の飛行との飛行ルート調整、コントローラ等の回線の混線を避けることを目的とし下記について遵守願います。

○丸山ダム堤体や堤体付近貯水池の周辺で無人航空機の飛行をされる方は、予め丸山ダム管理支所へご連絡ください。

丸山ダム管理支所 TEL:0574-43-1108
(平日8:30~17:00 (土日祝日を除く))

○丸山ダム堤体や堤体付近貯水池の周辺で無人航空機の飛行をされる方は、以下の対応をお願いします。

- ・航空法等の関係諸規定を遵守する
- ・発電設備や工事現場の上空飛行や撮影をしない
- ・一般の方の立入禁止区域に立入をしない
- ・地元の方や他の来訪者の方とのトラブルが生じないよう気をつける
- ・無人航空機の落下等により他者(ダム関係施設を含む)への損害が生じた場合、損害賠償を請求をされることがある
- ・丸山ダム管理支所は無人航空機の飛行に関する一切の責を負わず、事故機回収等の便宜供与も行わない

新丸山ダム 工事日より 10月期 付替国道418号(八百津町)関連

発注者



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)




ホームページ



国道418号
イメージ動画



新丸山ダムのキャラクター
しんまるくん


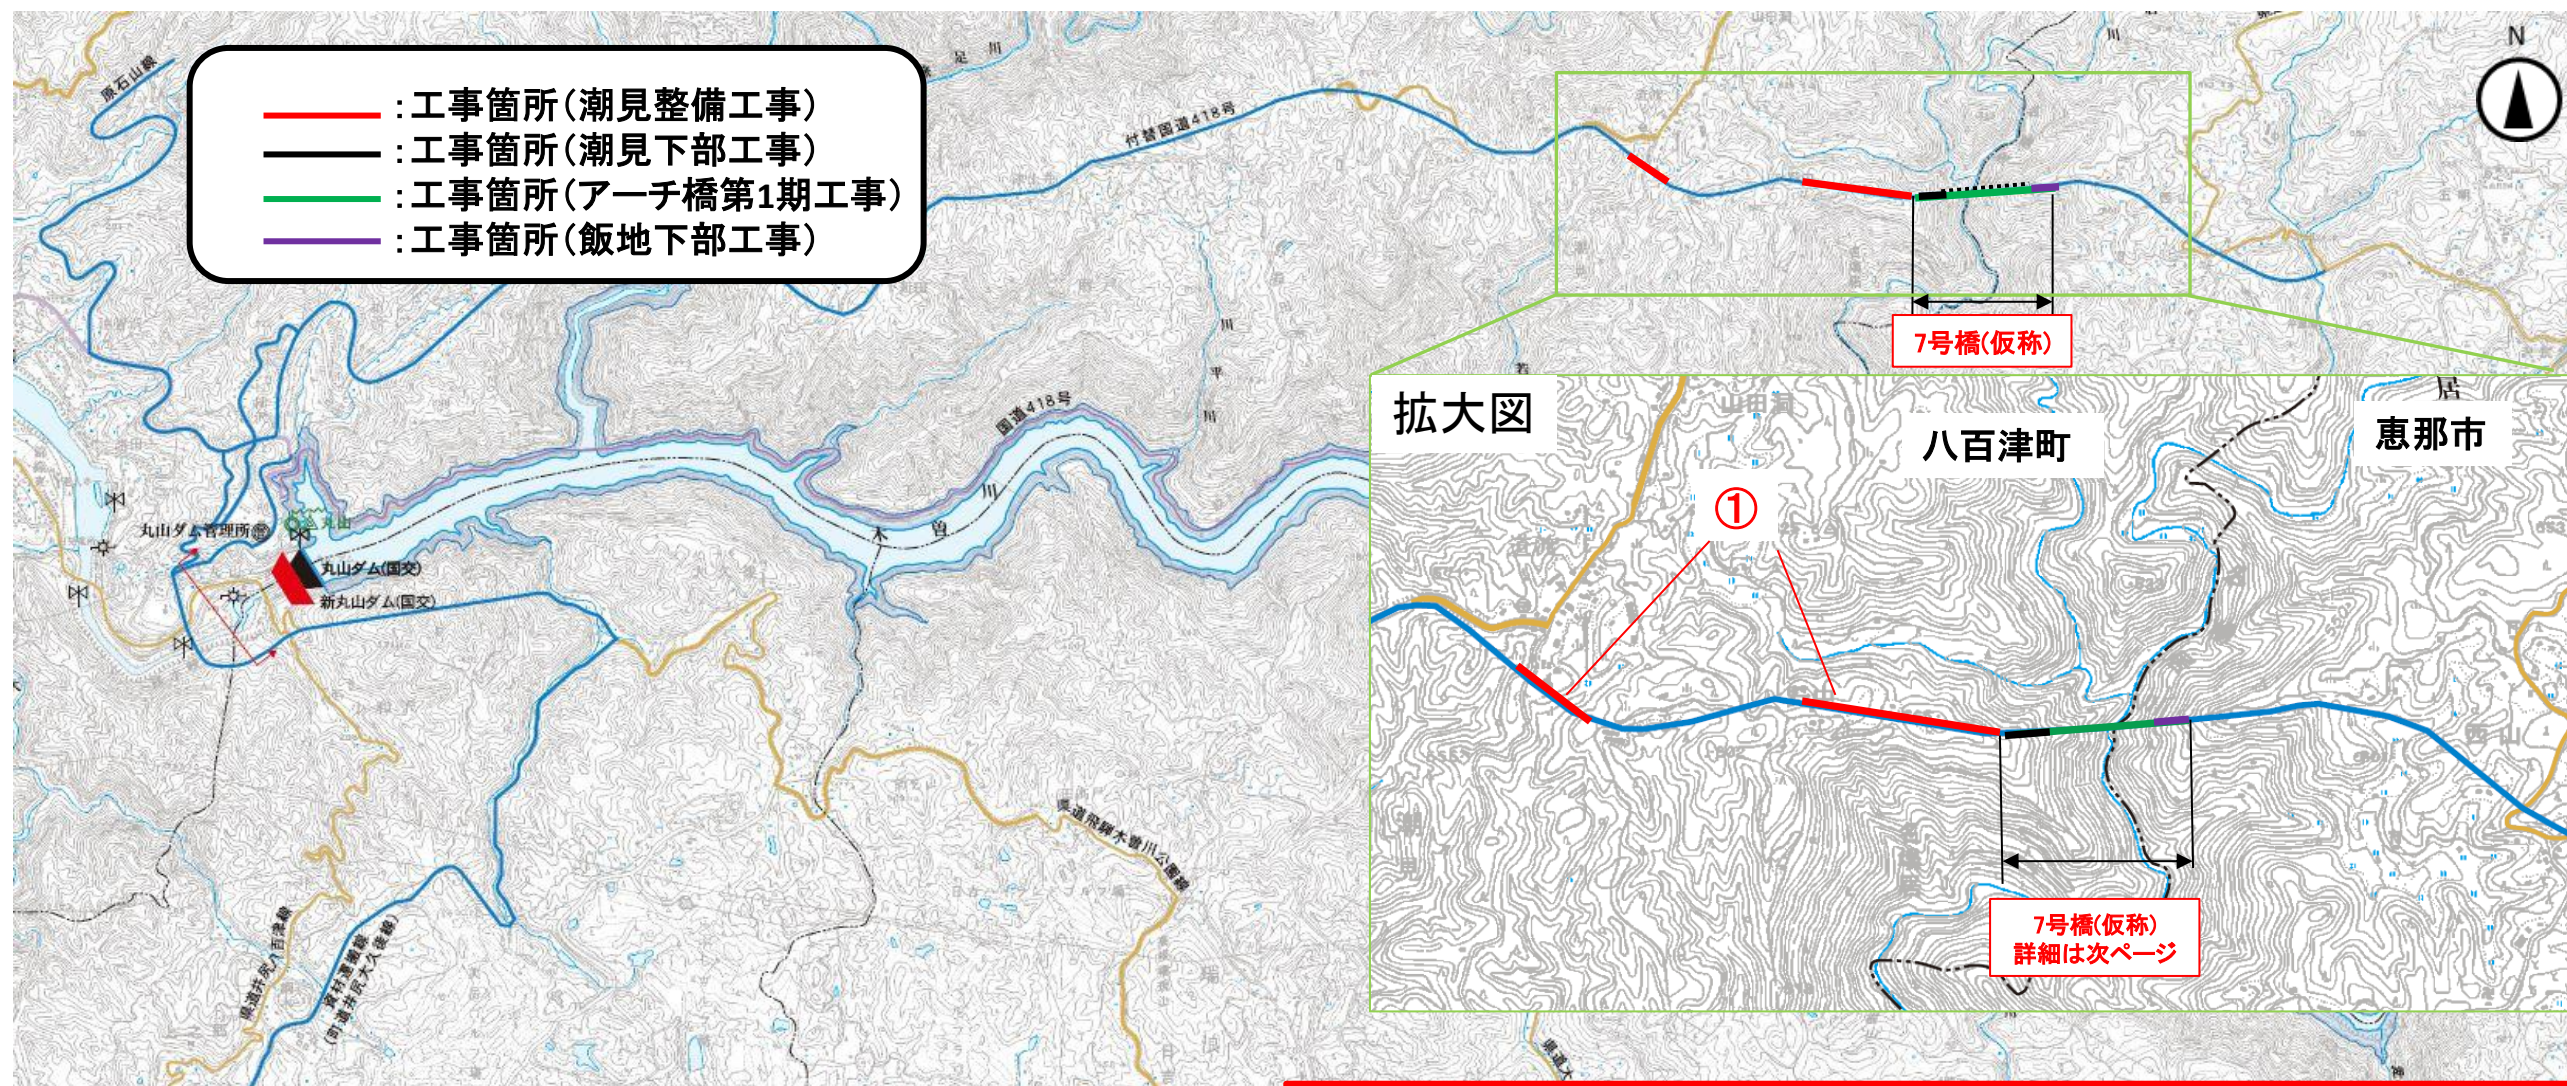


7号橋(仮称)完成イメージ図



①令和8年度 新丸山ダム国道418号潮見地区道路整備工事
発注手続きを進めています。

7号橋(仮称)現在進行状況

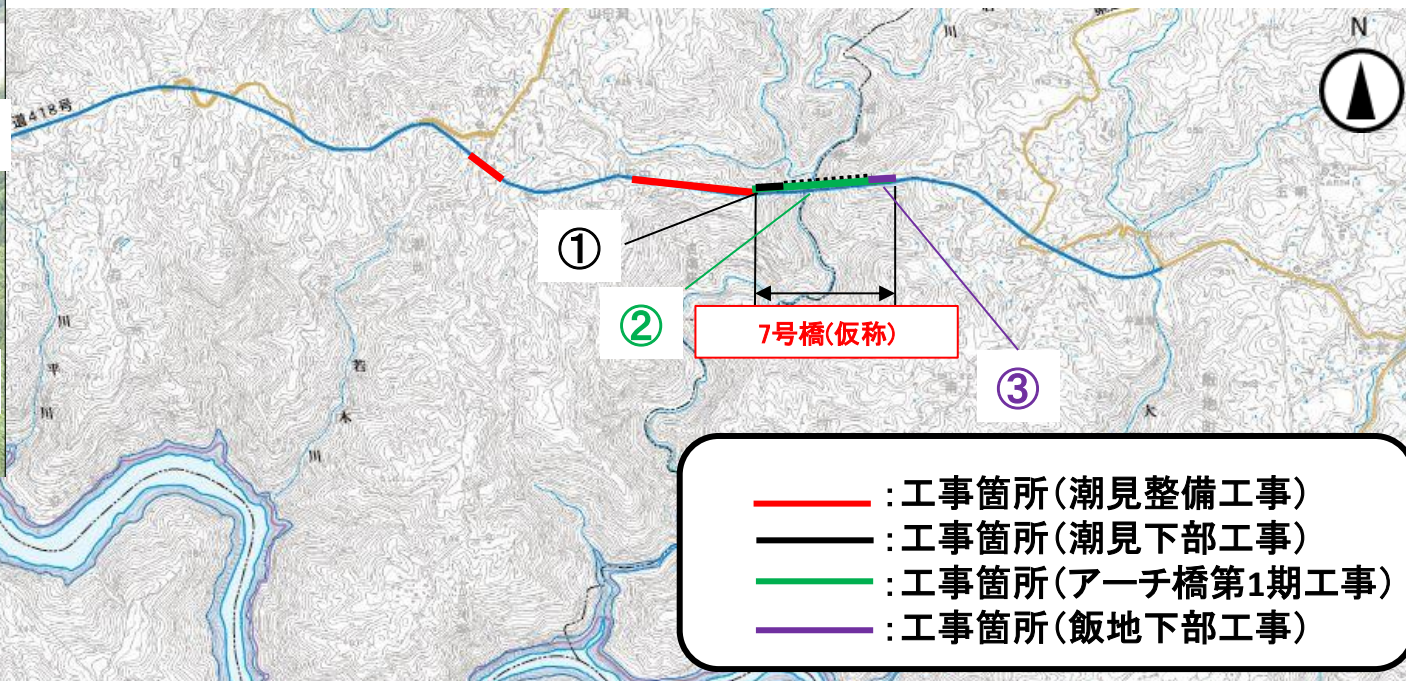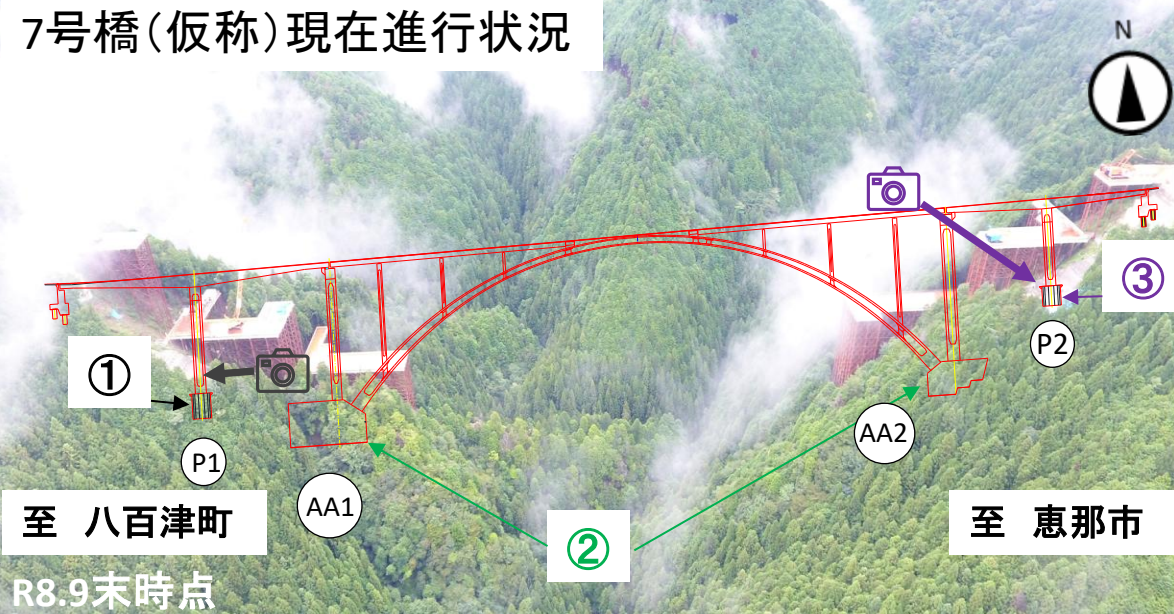


①令和6年度 新丸山ダム国道418号7号橋潮見下部工事
橋脚の基礎部分の鉄筋組立をしています。



②令和7年度 新丸山ダム国道418号名場居川PCアーチ橋
第1期工事
掘削を始める為の、準備工を進めています。



③令和6年度 新丸山ダム国道418号7号橋飯地下部工事
応急復旧を行い、現在は本格的な復旧工事を進めています。

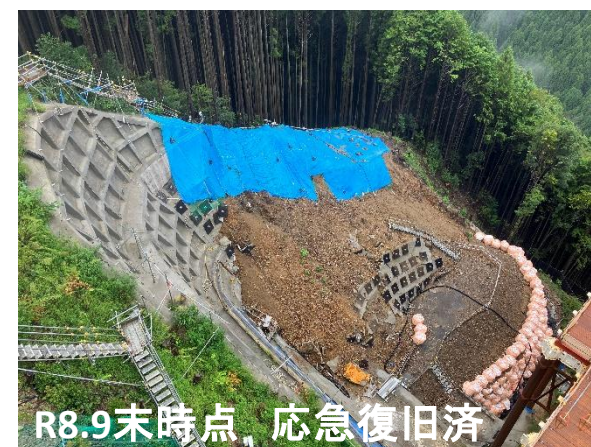

新丸山ダム 工事日より 10月期 付替国道418号(恵那市)関連

発注者



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)




ホームページ



国道418号
イメージ動画



新丸山ダムのキャラクター
しんまるくん

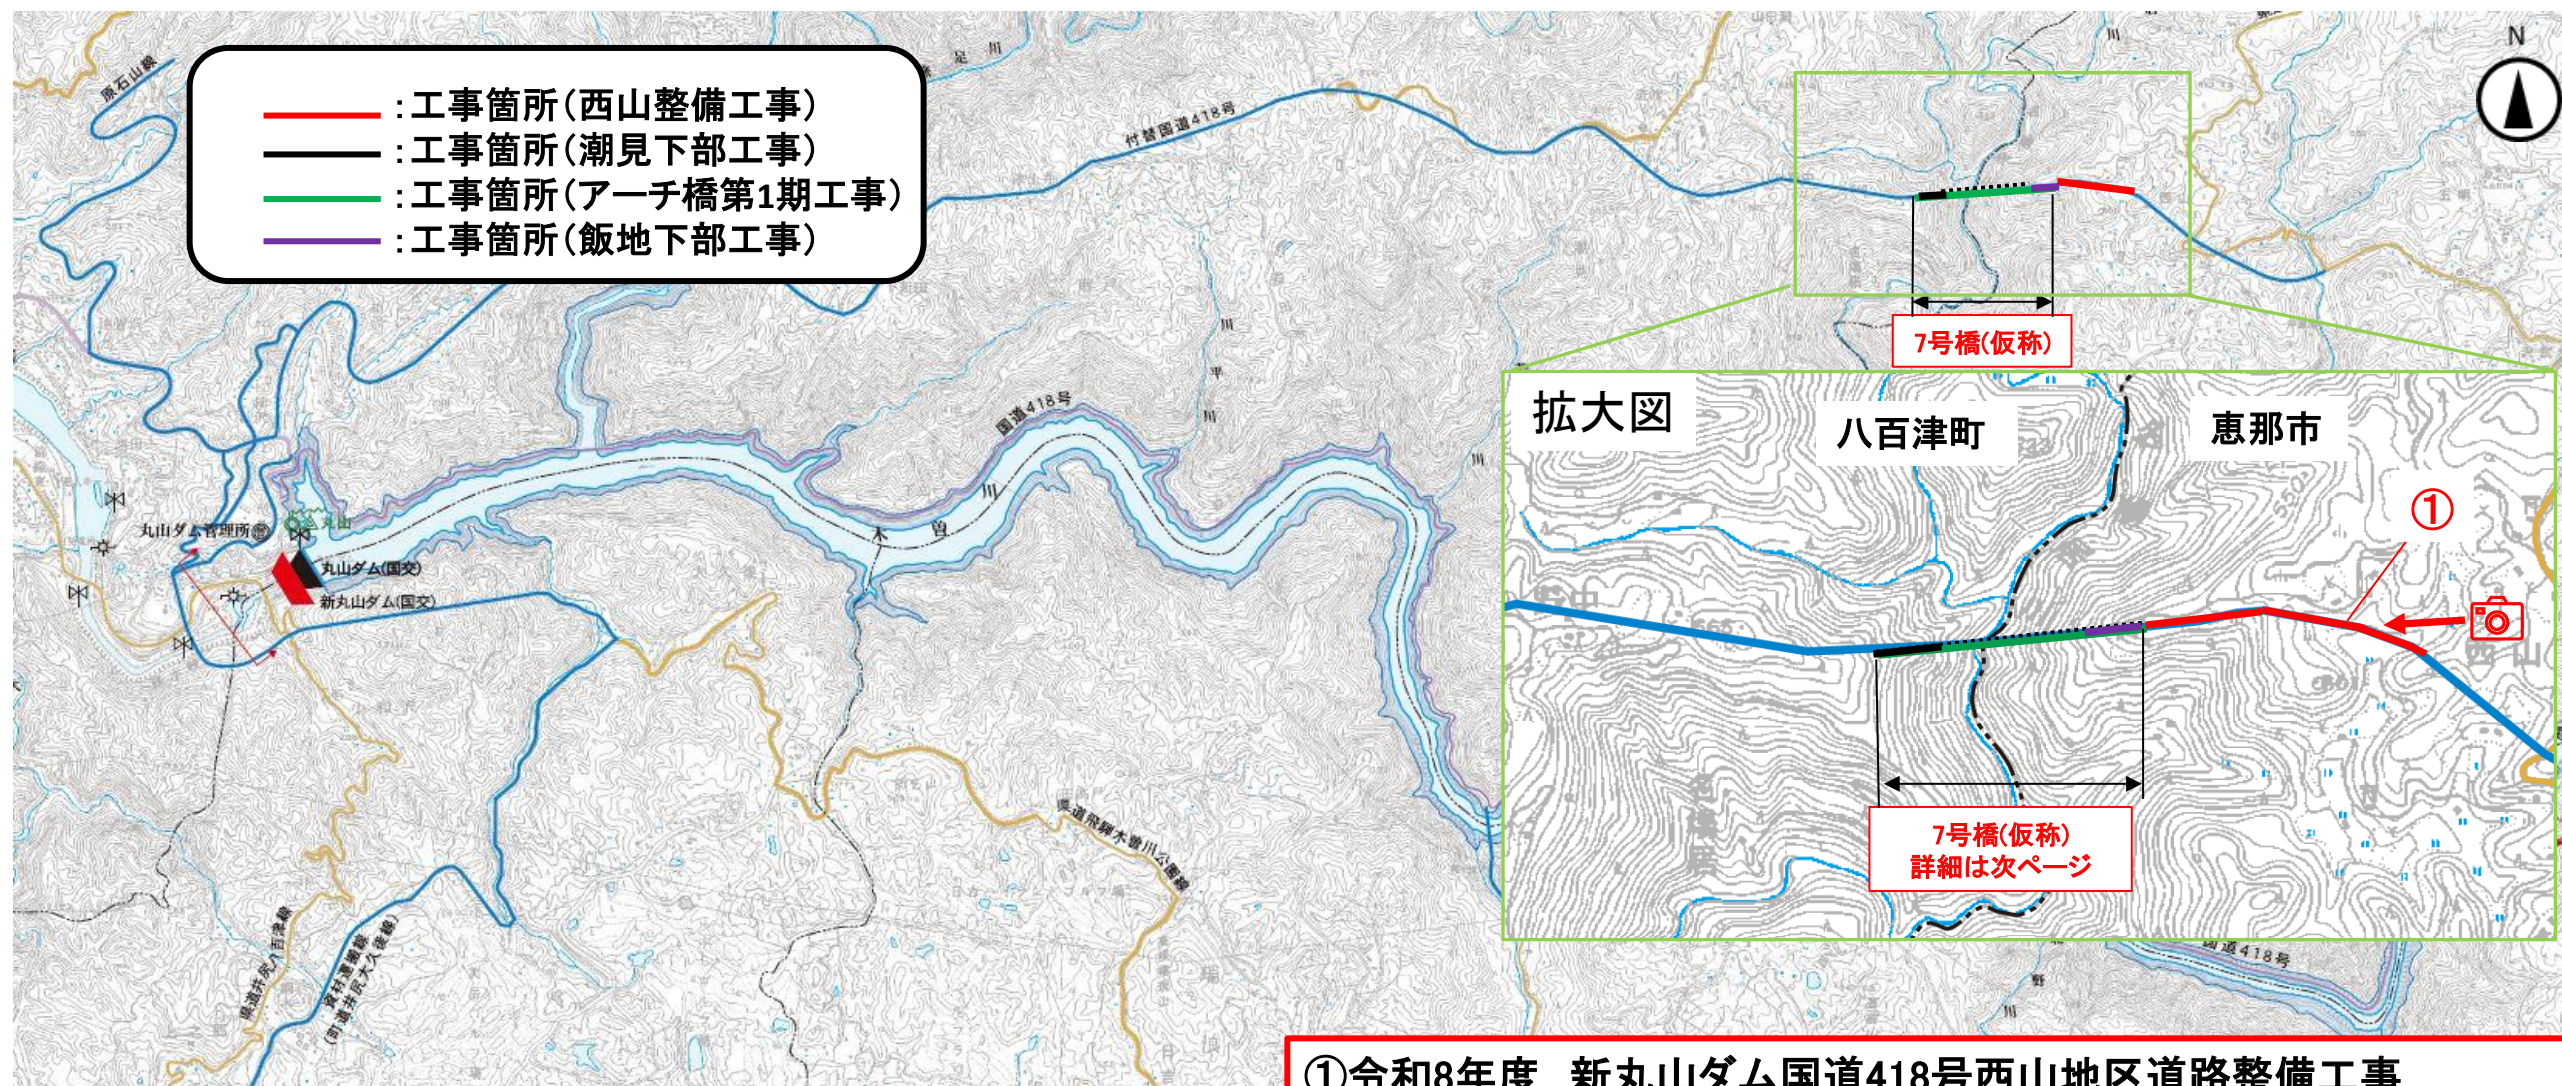



7号橋(仮称)完成イメージ図



①令和8年度 新丸山ダム国道418号西山地区道路整備工事
土工事を進めています。



7号橋(仮称)現在進行状況

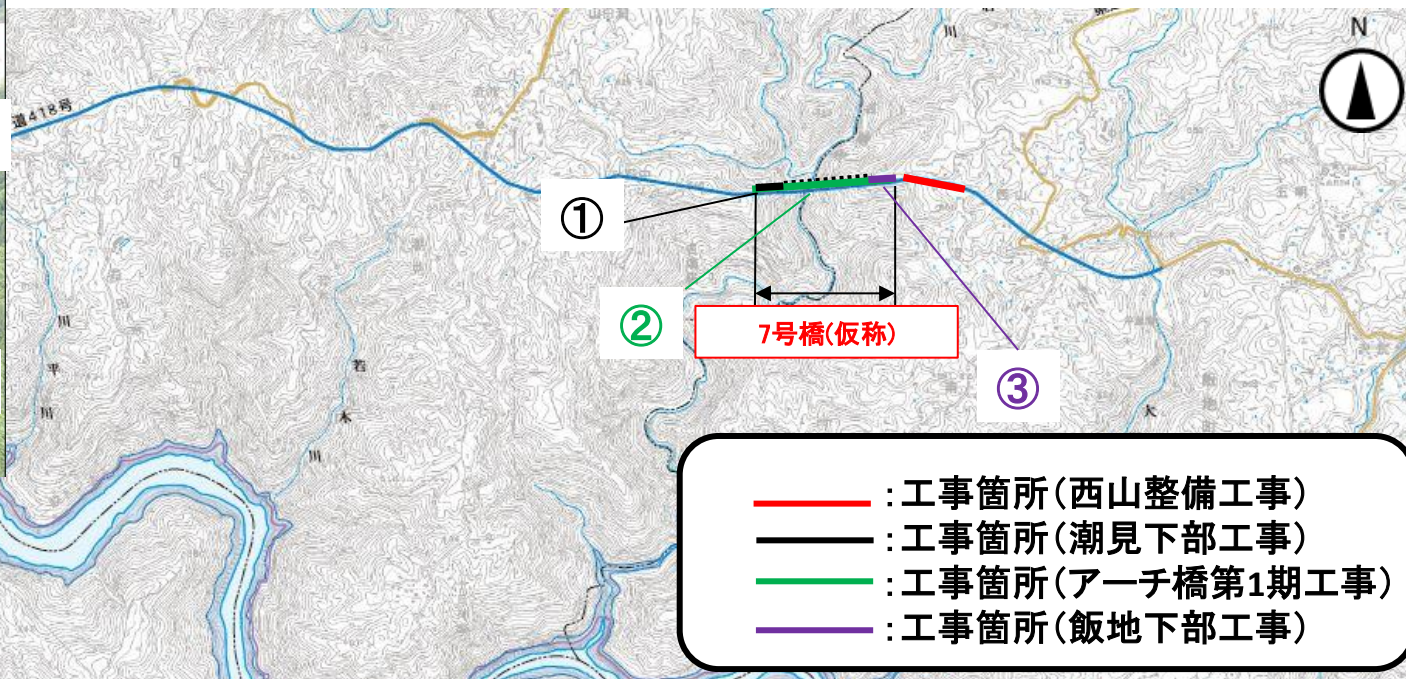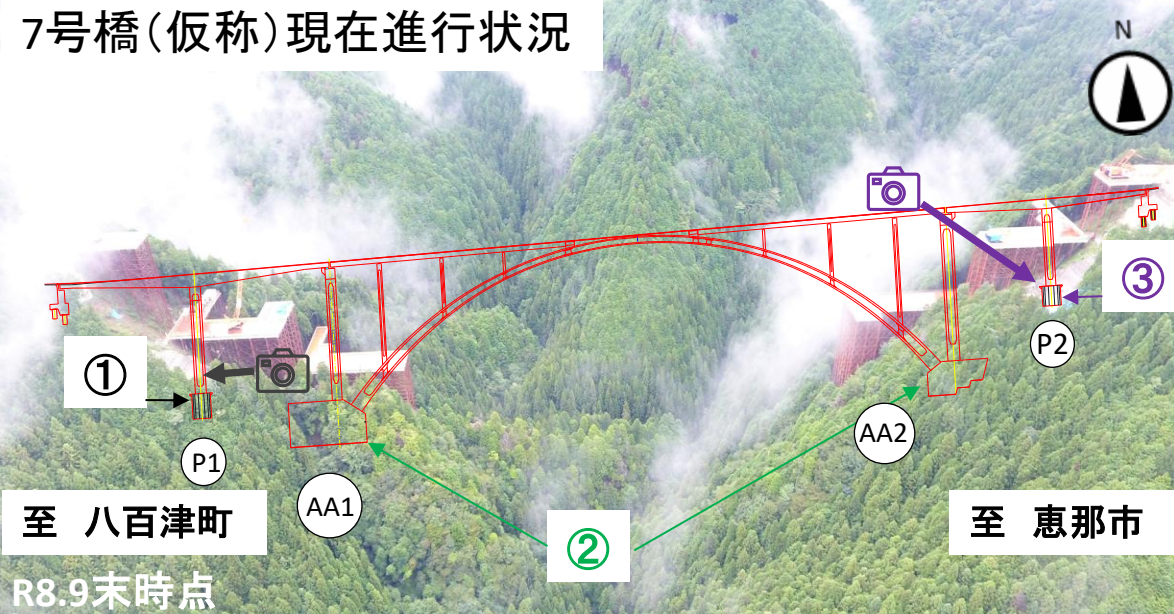


①令和6年度 新丸山ダム国道418号7号橋潮見下部工事
橋脚の基礎部分の鉄筋組立をしています。



②令和7年度 新丸山ダム国道418号名場居川PCアーチ橋
第1期工事
掘削を始める為の、準備工を進めています。



③令和6年度 新丸山ダム国道418号7号橋飯地下部工事
応急復旧を行い、現在は本格的な復旧工事を進めています。

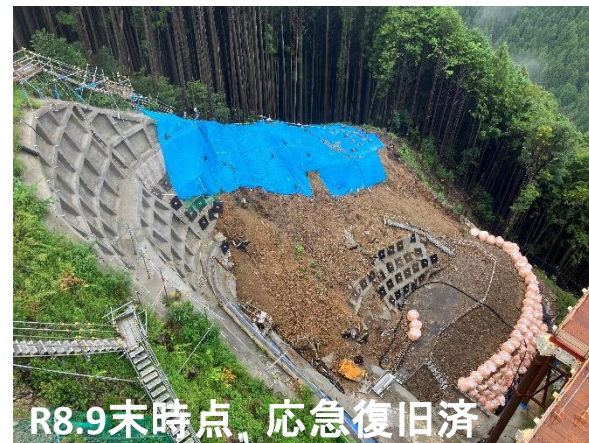

新丸山ダム 工事だより 10月期 五月橋架替え(八百津町・瑞浪市)関連

発注者



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



ホームページ



新五月橋(仮称)
イメージ動画



五月橋架替えの
工事用道路動画



新丸山ダムのキャラクター
しんまるくん

— : 工事箇所(道路工事)

①令和8年度 新丸山ダム大西瑞浪線新五月橋日吉下部工掘削工事
発破により本線の掘削を行っています。



R8.7末時点



R8.9末時点

②令和7年度 新丸山ダム十日神楽地区道路整備工事
のりわく
予定した法枠の工事が完了しました。



R7.11末時点



R8.9末時点

③令和7年度 新丸山ダム十日神楽地区道路建設工事
ようへき
擁壁の施工を進めています。



R8.5末時点



R8.9末時点

通行規制情報(町道十日神楽線)

- 規制箇所: 図の緑○部分
- 規制時間: 終日通行止め
- 規制期間: 令和7年2月3日～令和9年2月26日(予定)(土日祝含む)

規制箇所

新五月橋(仮称)

通行規制情報(町道十日神楽線)

・令和7年度 新丸山ダム十日神楽地区道路建設工事

道路整備工事を実施するため、通行規制を行います。

- ・規制箇所: 下図の緑○付近
- ・規制時間: 終日通行止め
- ・規制期間: 令和7年2月3日～令和9年2月26日(予定)(土日祝含む)



通行規制情報(町道大西瑞浪線)

・令和8年度 新丸山ダム大西瑞浪線新五月橋日吉下部工掘削工事

- ・県道大西瑞浪線(南側: 旧衛生センター跡付近)は、工事のため、一般車両及び歩行者の通行が出来ません。
- ・五月橋は道路管理者である岐阜県にて通行が規制されているため、通行が出来ません。

