




# 静清バイパス 清水立体 工事だより 第26号

## 【はじめに】

清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。  
今回（第26号）は、8月以降の工事予定をお知らせします。  
現場では、橋の柱（橋脚）を作る工事で、夜間、交通規制を伴う作業を引き続き行っていきます。  
引き続きご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いいたします。

<p><b>No13</b> 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋西下部工事</p> <p>施工会社：鈴与建設(株)</p> <p>工期：令和3年2月26日まで 工事状況：交差点付近の通行形態が変わりました。中央部においてこれからA2橋台を施工します。</p>  <p>清水IC西交差点付近切替完了</p>	<p><b>No6</b> 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋西下部工事</p> <p>施工会社：静和工業(株)</p> <p>工期：令和3年3月31日まで 工事状況：夜間作業にて、8月は橋脚基礎工事に伴う埋戻し作業を行い、9月より場所打ち杭の施工に掛かります。</p>  <p>P29橋脚施工状況</p>	<p><b>No18</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC西道路建設工事</p> <p>施工会社：あおみ建設(株)</p> <p>工期：令和4年2月28日まで 工事状況：清水IC西側にて、清水立体と東名高速道路を繋げる道路を作ります。現在、本施工に向け、現地調査及び除草作業を行っています。お盆休み明けから工事用搬入路および伐採工を施工していく予定です。</p>  <p>着手前</p>	<p><b>No5</b> 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋東下部工事</p> <p>施工会社：(株)白鳥建設</p> <p>工期：令和2年9月30日まで 工事状況：覆工板の撤去が完了し、以後矢板と杭の撤去を行います。お盆休み明けより、本舗装を行います。</p>  <p>P26橋脚施工状況</p>	<p><b>No11</b> 令和元年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋西側鋼製梁工事</p> <p>施工会社：佐藤鉄工(株)</p> <p>工期：令和2年9月30日まで 工事状況：P11~P13橋脚において、夜間対面通行規制にて鋼製梁部の架設が終わり、ホルトの本締め、塗装工事へと進めています。残り少しですが引き続きよろしくお願い致します。</p>  <p>P11-P13架梁設完了</p>	<p><b>No10</b> 令和元年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋中鋼製梁工事</p> <p>施工会社：瀬上工業(株)</p> <p>工期：令和2年9月30日まで 工事状況：P8~P10橋脚において、鋼製梁部の架設が終わり、ホルトの本締め、塗装工事へと進めています。引き続き宜しくお願い致します。</p>  <p>P8-P10架梁設完了</p>	<p><b>No9</b> 令和元年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋東側鋼製梁工事</p> <p>施工会社：宮地エンジニアリング(株)</p> <p>工期：令和2年9月30日まで 工事状況：P5~P7橋脚において鋼製梁の架設が完了いたしました。8月~9月上旬で現場塗装を行い、塗装完了後足場解体を行い、工事完了となります。</p>  <p>P5-P7架梁設完了</p>	<p><b>No22</b> 令和元年度 1号清水立体 横砂跨道橋西下部工事</p> <p>施工会社：平井工業(株)</p> <p>工期：令和3年2月26日まで 工事状況：場所打ち杭の施工を始めました。引き続き場所打ち杭の施工を進めていきますので宜しくお願い致します。</p>  <p>横砂跨道橋A2橋台施工状況</p>	<p><b>No23</b> 令和元年度 1号清水立体 横砂跨道橋東下部工事</p> <p>施工会社：静和工業(株)</p> <p>工期：令和3年2月26日まで 工事状況：現在、場所打ち杭の施工をしています。終わりましたら土留・仮締切工の施工を予定しています。</p>  <p>横砂跨道橋A1橋台施工状況</p>
--	--	--	---	--	---	---	---	---

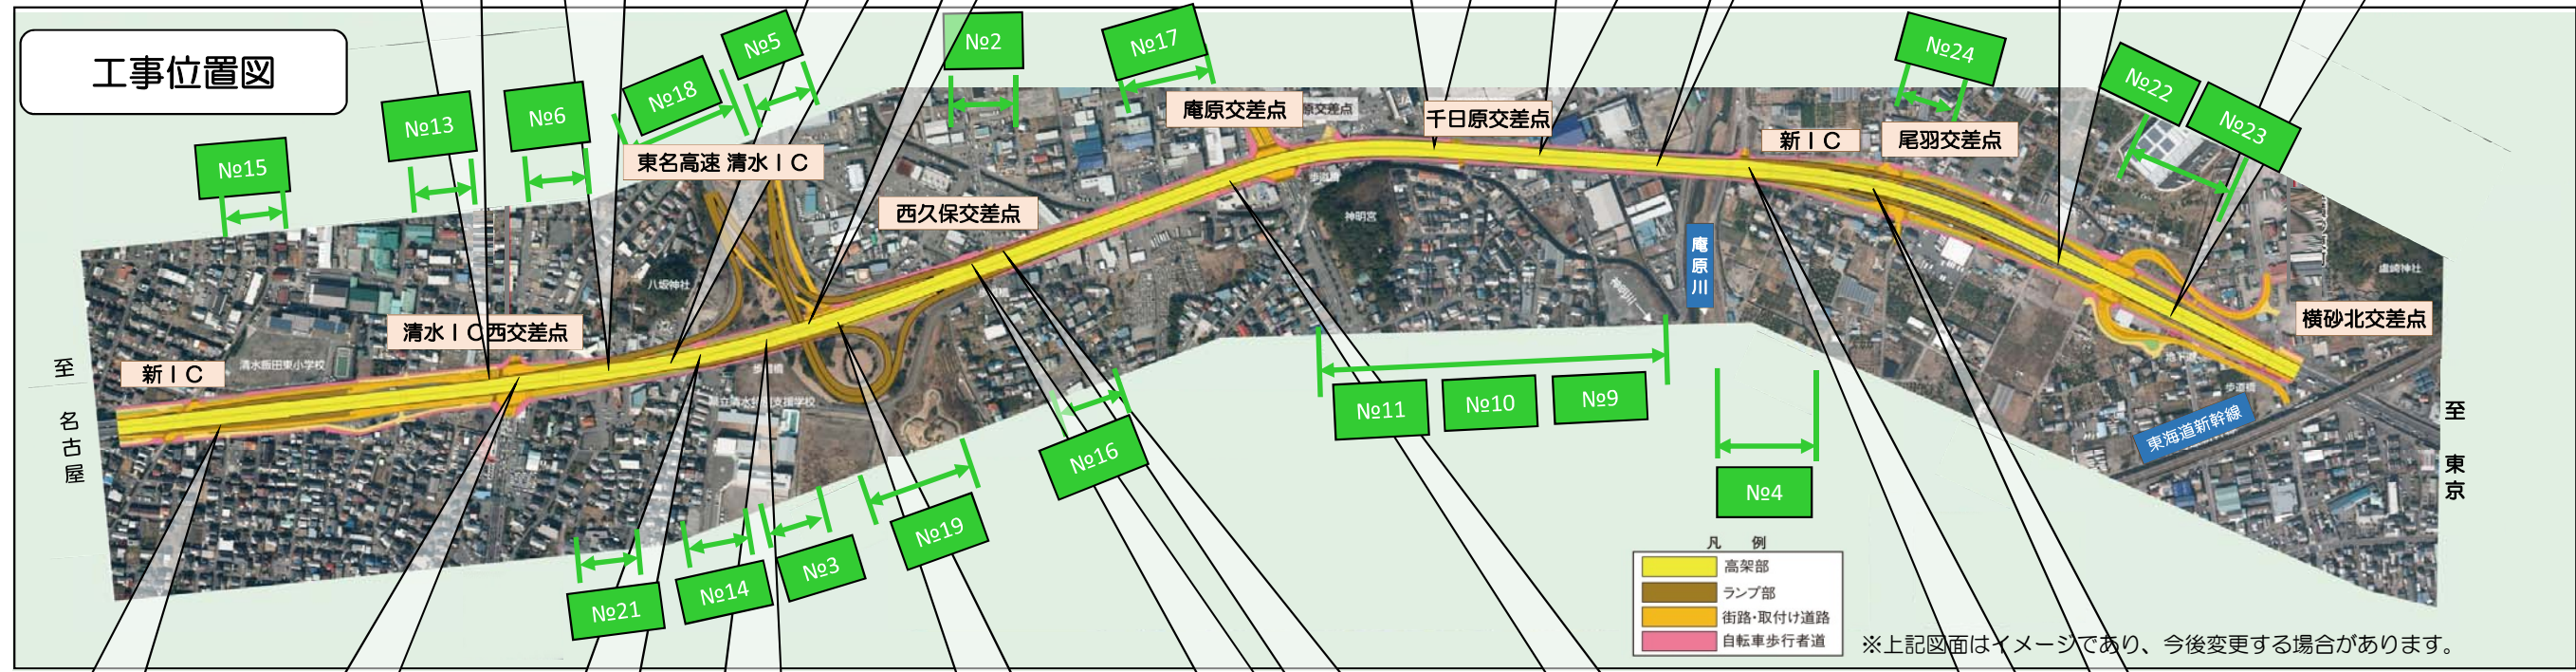

<p><b>No15</b> 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋東下部工事</p> <p>施工会社：静和工業(株)</p> <p>工期：令和3年3月26日まで 工事状況：現在、上り線の側道橋の撤去作業を進めています。</p>  <p>上り線側道橋撤去状況</p>	<p><b>No21</b> 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋中下部工事</p> <p>施工会社：静和工業(株)</p> <p>工期：令和3年3月26日まで 工事状況：7月下旬より準備工から工事を着手していきます。</p>  <p>P31、P32橋脚</p>	<p><b>No14</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋下部工事</p> <p>施工会社：木内建設(株)</p> <p>工期：令和3年2月26日まで 工事状況：下り線の側道橋を取り壊すための準備段階でワイヤーで吊るための穴をコンクリートにあけています。</p>  <p>下り線側道橋 削孔状況</p>	<p><b>No3</b> 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋中下部工事</p> <p>施工会社：五光建設(株)</p> <p>工期：令和2年9月30日まで 工事状況：仮設工撤去後、8月中旬に本舗装工事を行います。</p>  <p>P27橋脚仮設工施工状況</p>	<p><b>No19</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC東道路建設工事</p> <p>施工会社：名工建設(株)</p> <p>工期：令和4年2月28日まで 工事状況：東名清水IC東側で、清水立体と東名高速道路を繋げる道路を作ります。ただいま工事を進めるための準備中です。</p>  <p>着手前</p>	<p><b>No2</b> 平成30年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋西下部工事</p> <p>施工会社：平井工業(株)</p> <p>工期：令和2年9月30日まで 工事状況：現在、柱の基礎部分の鉄筋を組み立てています。8月にコンクリートを打設して、一部を埋戻しを行い工事が完了となります。</p>  <p>P22橋脚 鉄筋 施工状況</p>	<p><b>No16</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋橋下部工事</p> <p>施工会社：五光建設(株)</p> <p>工期：令和3年2月26日まで 工事状況：7月28日より、西久保交差点及び清水IC付近において、工事に着手しています。</p>  <p>P21、P24橋脚</p>	<p><b>No17</b> 令和元年度 1号清水立体 庵原地区下部工事</p> <p>施工会社：静鉄建設(株)</p> <p>工期：令和3年2月26日まで 工事状況：7月20日から仮設工（鋼矢板打込み）を開始しました。仮設工完了（覆工板設置）は、8月下旬を予定しています。</p>  <p>P17橋脚 仮設工 施工状況</p>	<p><b>No4</b> 平成30年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋下部工事</p> <p>施工会社：鈴与建設(株)</p> <p>工期：令和2年12月25日まで 工事状況：P4橋脚が無事完成いたしました。P3橋脚については、継続して施工中で、7月に掘削完了、8月から躯体工を施工していきます。</p>  <p>P3、P4橋脚施工状況</p>	<p><b>No24</b> 令和元年度 1号清水立体 尾羽第1高架橋下部工事</p> <p>施工会社：鈴与建設(株)</p> <p>工期：令和3年2月26日まで 工事状況：杭の施工が完了し、8月は矢板の打込みを実施します。中旬以降には尾羽交差点（上り線）の右折帯の一部規制する予定です。</p>  <p>P1橋脚場所打ち杭施工状況</p>
---	--	--	--	--	--	---	---	---	---

静岡国道事務所 ホームページ  
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

令和2年 8月  
清水監督官話所  
TEL 054-250-8920  
編集：清水監督官話所 清水立体安全協議会  
担当：瀬上工業(株) (山口 武留)
