



暑い夏の季節がやってきました！


7/18に関東甲信越地方の梅雨明けが宣言され、いよいよ夏本番の季節がやってきました。7月に入り最高気温30℃超えの真夏日や、35℃を超える猛暑日となる日も多くなっています。熱中症等お体には十分お気をつけてお過ごしください。南アルプスの玄関口でもある大鹿村ですが、夏の登山シーズンも始まり最盛期を迎えています。普段見ることのできない夏空の下に広がる南アルプスの山々の幻想的な景色をご覧ください。



【写真撮影：大協建設職員】



御来光の様子

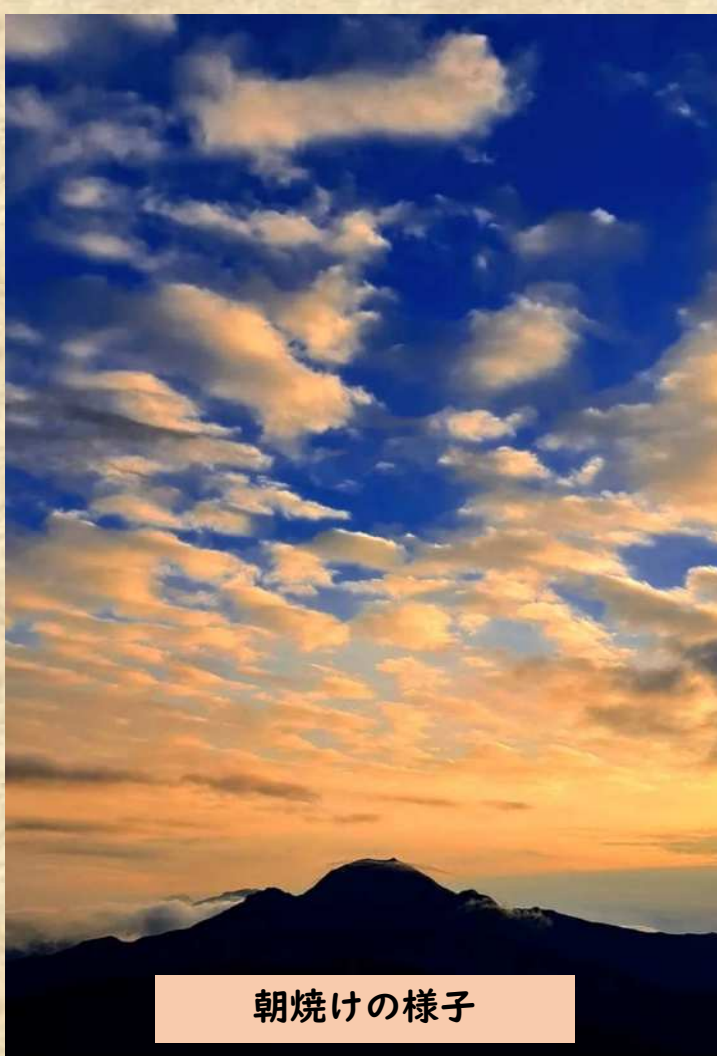

朝焼けの様子

【写真撮影：大協建設職員】



天気の良いと富士山も見られます



夏山の様子



雲の様子

裏面もご覧ください！

工事現場での熱中症対策を紹介します

夏の工事現場では、炎天下の下で暑さ☀️と戦いながら作業を行っています。様々な暑さ対策を行い 現場従事者の体調管理や熱中症による事故防止に努めながら工事を進めています。

気温・湿度・暑さ指数（WBGT）の見える化



暑さ指数を確認しながら作業します

日陰を設ける



日陰を設けて休息できる場所を設営。作業時の日除けバイザーの使用

作業時のスポットクーラーの使用



型枠内は風通しが悪いのでスポットクーラーで温度を下げます

水分や塩分補給剤の常備・空調服の活用



こまめな水分、塩分補給と体温上昇を和らげています

新しい工事の紹介

工事場所：大鹿村 大字 大河原



現場写真・テールアルメ工法完成イメージ

令和7年度 天竜川水系釜沢護岸工事

工 期：令和7年7月4日 ～ 令和8年3月27日

この度、令和7年度 天竜川水系 釜沢護岸工事の施工をさせていただくことになりました株式会社吉野組です。大鹿村釜沢第2砂防堰堤300m上流右岸部の護岸をテールアルメ工法にて補強するを行います。工事期間中は、工事車両の通行等、近隣の皆様方にはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが無事故・無災害で工事を進めてまいります。ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。



現場代理人
今井 僚



監理技術者
宮嶋 峰人

YOSHINO 株式会社吉野組

小波川砂防出張所管内 現場進捗状況

令和6年度 天竜川水系北川第2砂防堰堤補強工事



工 期：令和7年4月1日～令和8年2月27日

進捗率：16.3% 長豊建設株式会社

令和6年度 天竜川水系鹿塩川溪流保全工工事



工 期：令和7年4月1日～令和8年2月27日

進捗率：26.0% 大協建設株式会社

令和6年度 天竜川水系女高砂防堰堤補強工事



工 期：令和7年4月1日～令和8年2月27日

進捗率：16.6% 小澤建設株式会社

令和6年度天竜川水系手開沢砂防堰堤補強工事



工 期：令和7年3月18日～令和8年2月27日

進捗率：24.5% TAJIMA 田島建設株式会社

令和6年度天竜川水系小波川砂防施設整備工事



指示：No.1
下青木土石流対策作業

指示：No.2
仮置き土運搬埋立て作業

工 期：令和7年3月25日～令和8年2月27日

進捗率：31.0% TAJIMA 田島建設株式会社

令和7年度天竜川水系小波川砂防管内整備工事



指示：No.2
河道整備作業
(小波川)

指示：No.4
塩川床固工群周辺整備作業

工 期：令和7年4月1日～令和8年3月31日

進捗率：39.1% 大協建設株式会社
