

三峰川砂防だより



安全パトロール中

Vol.13

国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所
天竜川上流工事安全協議会 三峰川支部 広報紙

H27.11発行



ヤマトイワナ観察中

現場紹介

平成27年度 天竜川水系三峰川 流域除石工事 (株)ヤマウラ

作業の様子

三峰川の支流の黒川に護岸（大型ブロック）を構築すると共に、堰堤堆砂敷内に堆積した土砂を、三峰川下流の新ごみ中間処理施設建設予定地へ運搬する工事です。護岸（大型ブロック）については、現在、基礎部の施工と、洗掘を防止するための根固めブロックを製作しています。

土砂運搬については、11月17日から、1日当たり、10台が7往復で70回の運行を行っています。運行に際しては、沿道の皆様に、ご迷惑をお掛けしておりますが、事故の無いよう運行し、飛砂防止など環境対策も適切にいたしますので、ご協力をお願いいたします。



堆積土の掘削状況



(車前) 車輪アレット
ドラムロータリー
ライト付



(車後) 車輪アレット



現場担当者紹介



現場代理人・監理技術者：渋谷 兼雄

安全第一で工事を行い、無事故で終われるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。
※もしも、危険な運転など見かけましたら、当方に通報をしてください。

工事安全パトロールに伊那市職員も参加頂きました。

三峰川砂防出張所では、発注した工事が安全に施工されているか確認するため、毎月1回安全パトロールを行っています。様々な角度から点検を行うことが、より安全に工事を進められるということもあり、今回は伊那市の職員の方にも安全パトロールにご参加頂きました。

あわせて、堰堤工事などの現場状況を見て貰うことで、砂防事業に対する理解をより一層深めて貰うことが出来ました。



ヤマトイワナ観察会開催

11/3(火)祝日に三峰川みらい会議主催のヤマトイワナ観察会、治山治水学習会が三峰川上流域において開催されました。当日は参加者約25名、天候にも恵まれました。バスで移動し、所々立ち寄り治山、砂防事業の状況説明、南アルプスユネスコパークの概要、ヤマトイワナ保護に向けた漁協の取り組みなどを聞き、三峰川上流域の現状を見て、これらの認識を深めることができました。



三峰川砂防出張所管内の工事実施箇所(H27年11月下旬)

平成27年度 天竜川上流CCTV設備工事

施工業者：名菱電子(株)
工期：平成27年10月20日～平成28年3月25日

三峰川砂防管内では伊那市高遠町の藤沢川沿いに管理用のカメラを設置する工事です。

平成27年度 天竜川水系 三峰川流域除石工事

施工業者：
(株)ヤマウラ

進捗率：20%

工期：平成27年9月2日～
平成28年3月25日



除石工




護岸工

平成27年度 天竜川水系 女沢川砂防堰堤工事 (おなさわがわ)

施工業者：
浅川建設工業(株)

進捗率：42%

工期：
平成27年7月22日～
平成28年3月25日

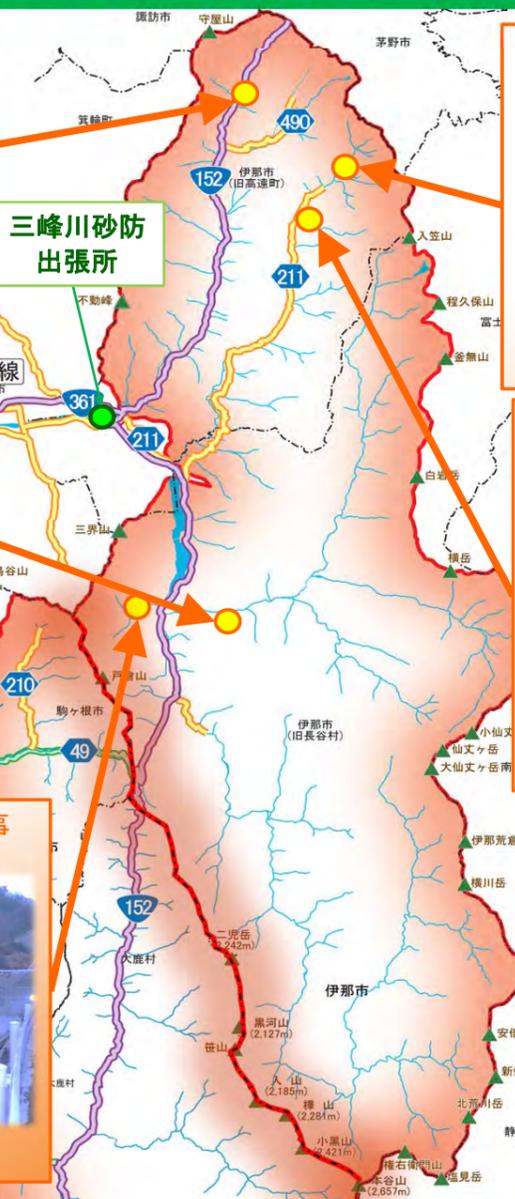

平成26年度 天竜川水系 山室第2砂防堰堤工事

施工業者：
浅川建設工業(株)

進捗率：98%

工期：
平成27年3月7日～
平成28年1月29日



今年度完成予定!

平成26年度 天竜川水系 初ノ沢砂防堰堤工事

施工業者：
清野建設(株)

進捗率：79%

工期：
平成27年3月6日～
平成28年2月29日



平成27年度 天竜川水系 三峰川砂防管内整備工事 【管内全域】

施工業者：
廣瀬建設工業(株)

進捗率：70%

工期：
平成27年4月24日～
平成28年3月31日

