

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸 34.6km~41.62km
			管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和2年6月29日	実施区間	久澄橋~高橋

令和2年6月29日 矢作川長興寺地区護岸整備状況のレポート(7)




現場にあった工事案内幕



工事が完成している。竜宮神社の跡の露頭の岩盤が取り残されている。この露頭の岩盤は撤去しないとのこと。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸 34.6km~41.62km
			管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和2年6月29日	実施区間	久澄橋~高橋

38.7km地点の河川断面図

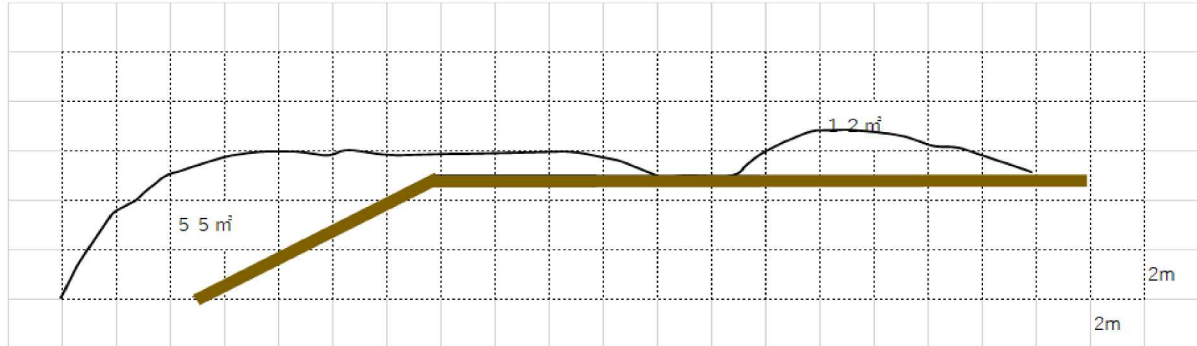

38.7km地点の現状と計画断面のおおよその断面図を作図した。これにより、約67㎡程取り残しがある。この取り残しは、撤去しないとのことであるが、洪水の際、堤外のトイレまで撤去して、流れの邪魔を取り除くのに、この取り残された断面は、流況にかなり影響を及ぼすと思う。一度、不等流計算をして、どれぐらい影響があるか、計算してほしい。

該当箇所については十分な量を掘削したため、影響はありません



以前あった竜宮社は、約300m南の八柱神社境内に移され祀られていた。是非、以前あった場所にあったことの案内板を設置してほしい。特に、堤外に神社があることは非常に珍しいことである。

河道整備工事を、1年間レポートした。洪水が心配される矢作川が安全な河道へと整備されたことは、うれしいが、最後の詰めとして、露頭の岩盤の撤去と竜宮社の案内板をお願いしたい。
