

第10回 豊川水系流域委員会 豊川水系河川整備計画の事業進捗状況

(設楽ダム建設)

令和8年1月30日


国土交通省 中部地方整備局

設楽ダム工事事務所

豊川流域図



容量配分図

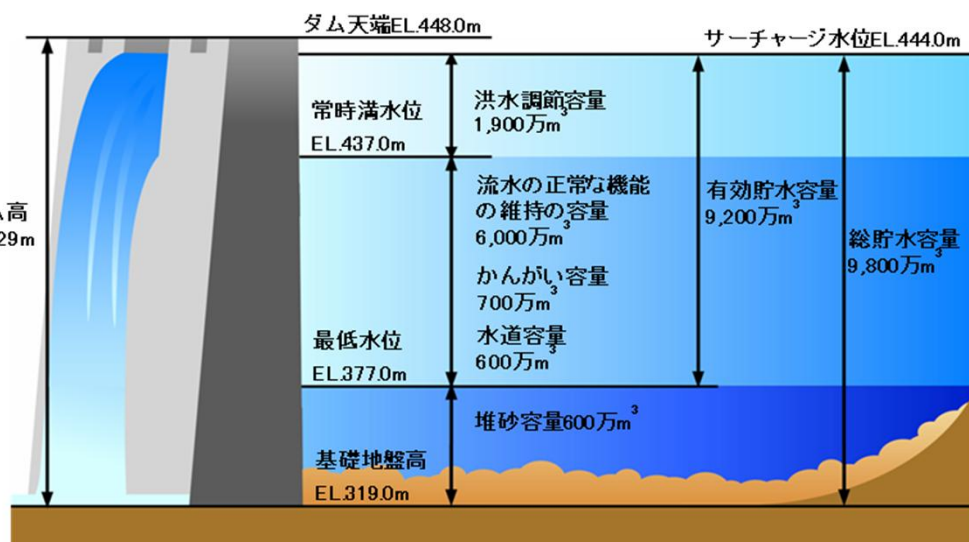

○場 所 きたしたらぐん したらちよう とよがわ
愛知県北設楽郡設楽町 （豊川水系豊川）

○目 的 洪水調節
流水の正常な機能の維持
かんがい用水の補給
水道用水の供給

○諸 元 重力式コンクリートダム

- ・集水面積 62 (km²)
- ・堤高 129 (m)
- ・総貯水容量 9,800万 (m³)

○工 期 昭和53年度～令和16年度

○現 状 本体（基礎掘削） 工事中
付替道路 工事中

○総事業費 約3,200億円

○令和7年度事業内容 【約190.3億円】
（内補正予算 約27.9億円）
当初：本体工事、付替道路工事 等
補正：付替道路工事、環境調査、
工事用道路整備 等

昭和53年	4月	実施計画調査に着手
平成 2年	5月	「豊川水系における水資源開発基本計画」閣議決定
平成11年	12月	「豊川水系河川整備基本方針」策定
平成13年	11月	「豊川水系河川整備計画」策定
平成15年	4月	建設事業に着手
平成18年	2月	「豊川水系における水資源開発基本計画」全部変更閣議決定
	4月	「豊川水系河川整備計画」一部変更
平成19年	6月	「豊川水系設楽ダム建設事業環境影響評価書」を公告縦覧
平成20年	10月	基本計画告示(工期:平成32年度 事業費:2,070億円)
平成21年	2月	損失補償基準妥結、ダム建設同意調印
	3月	水源地域整備計画決定
	6月	用地補償契約着手
	8月	工事用道路工事着手
	12月	検証の対象とするダム事業に選定
平成22年	9月	検証に係る検討の指示
	11月	「第1回設楽ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」を開催 第2回:平成23年2月 第3回:平成23年5月 第4回:平成23年12月 第5回:平成25年2月
平成26年	4月	国土交通大臣による対応方針「継続」の決定(H26.4.25)
平成28年	9月	基本計画(第1回変更)告示(工期:令和8年度 事業費:2,400億円)
平成29年	3月	転流工工事着手
令和 2年	3月	左岸頂部掘削工事着手
令和 4年	8月	基本計画(第2回変更)告示(工期:令和16年度 事業費:3,200億円)
令和 5年	2月	転流開始
令和 5年	10月	付替県道 設楽根羽線一部供用開始
令和 6年	11月	設楽ダム 本体工事着工式


(令和7年3月末時点)

補償基準他	H21.2 用地補償基準妥結 H21.3 水源地域特別措置法の水源地地域指定、整備計画の決定
用地取得 (約300ha) ※数字は水没地のみの面積	約98%(約297ha)
家屋移転 (124世帯)	100%(124世帯)
付替国道、付替県道 (約17km)	約64%(10.8km)
付替町道、付替林道 (約18km)	約29%(5.3km)
ダム本体及び 関連工事	<div>転流工</div> <div>基礎掘削</div> <div>堤体工事</div> <div>試験湛水</div> <p>※本体基礎掘削施工中</p>


※付替道路は道路工事が着手された工事の施工延長進捗率

- 令和7年度は、ダム本体工事、付替道路工事、本体関連工事を継続して実施。

設楽ダムの完成までの流れ

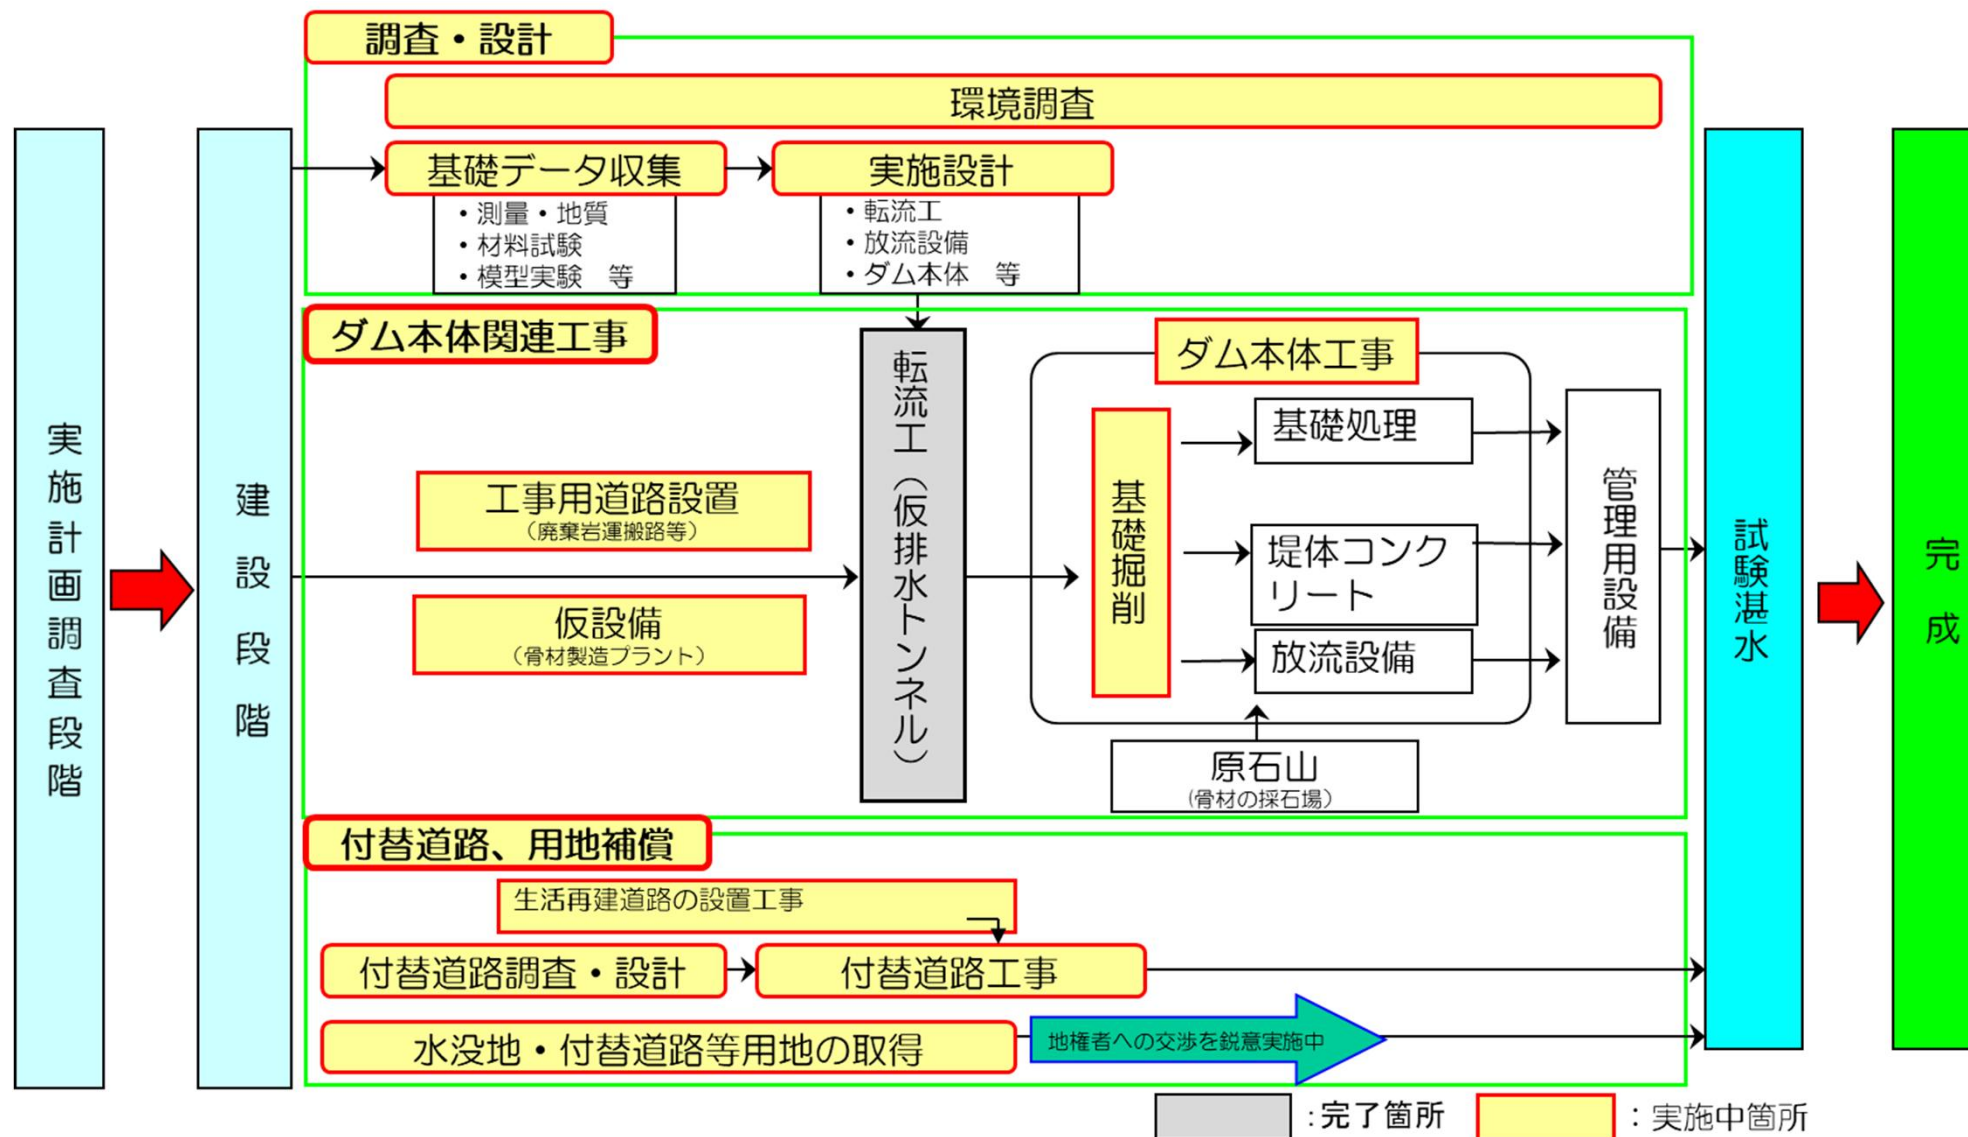

(R7.12 現在)

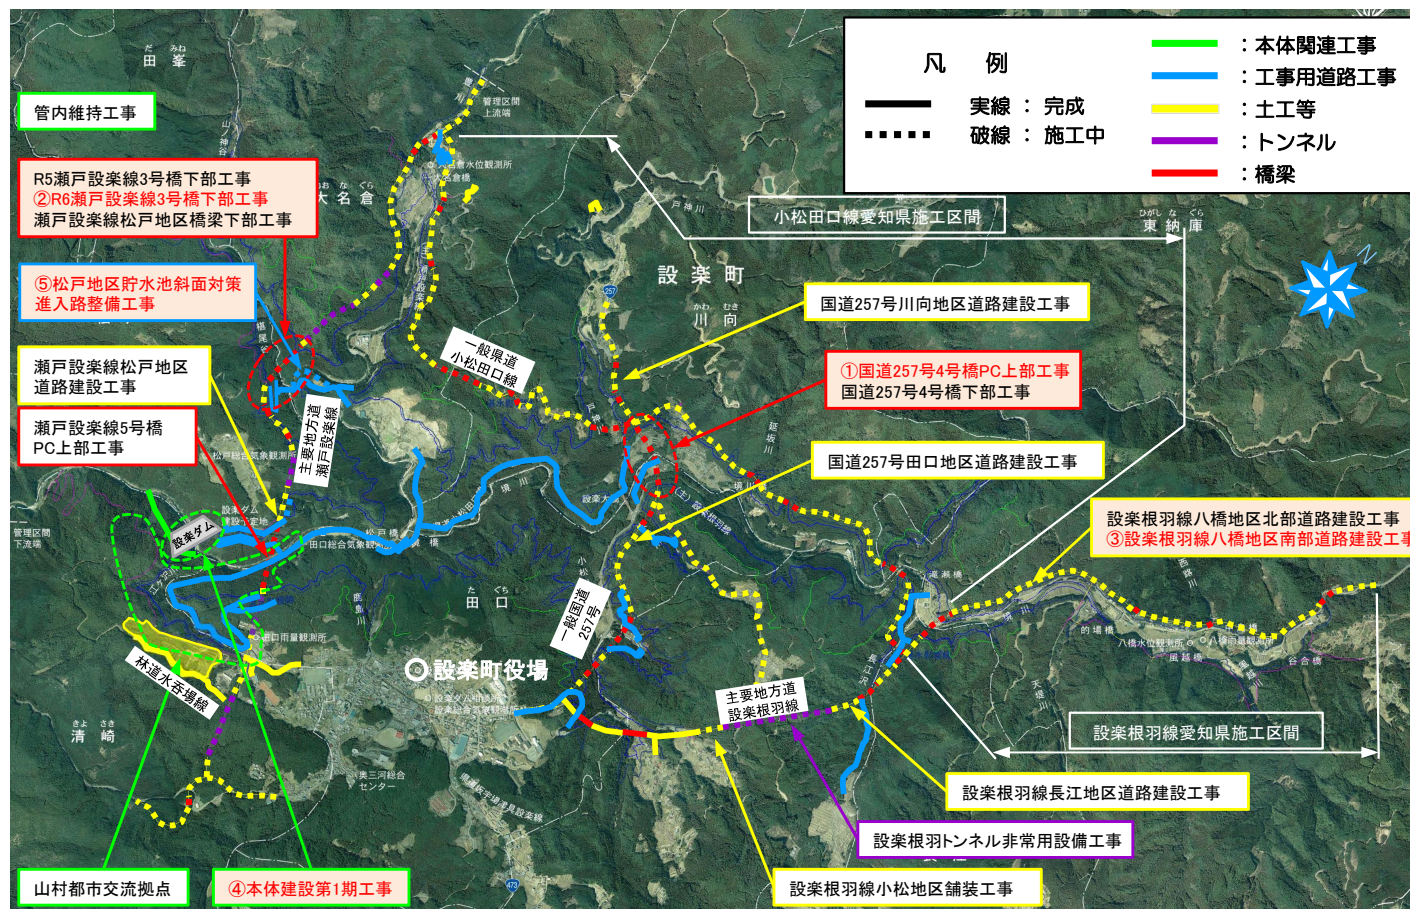

①国道257号4号橋PC上部工事




②R6瀬戸設楽線3号橋下部工事



⑤松戸地区貯水池斜面对策進入路整備工事



④本体建設第1期工事

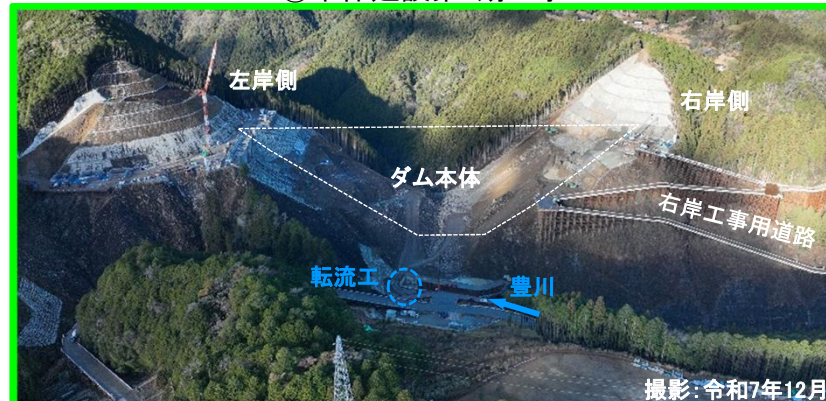

③設楽根羽線八橋地区南部道路建設工事




ダムサイトの進捗状況



左岸掘削 (R5.3)



左岸 (R7.12)

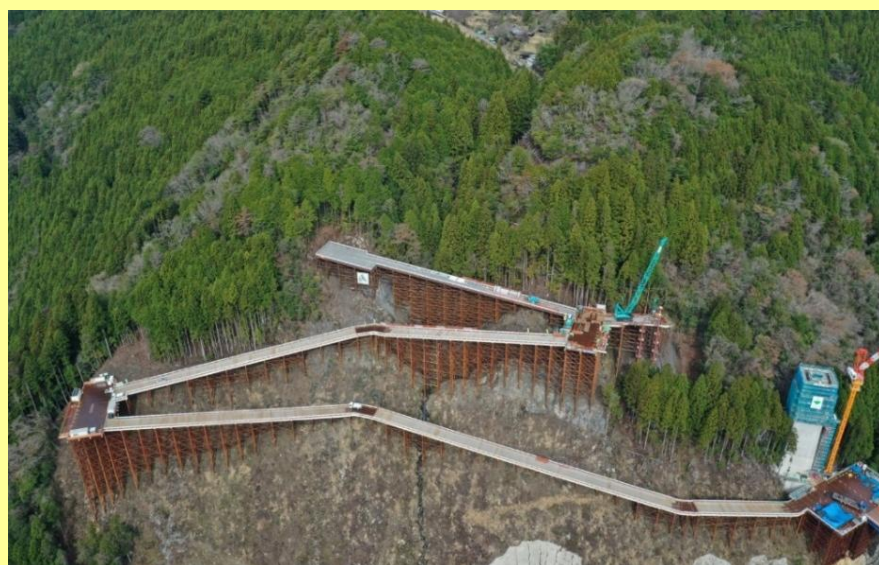

右岸工事用道路 (R5.3)



右岸掘削 (R7.12)

ダムサイト周辺 ドローン動画（2022年と2025年の比較）



付替国道257号線 ドローン動画（2022年と2025年の比較）



付替県道瀬戸設楽線 ドローン動画（2022年と2025年の比較）



付替県道設楽根羽線 ドローン動画（2022年と2025年の比較）




○設楽ダム工事事務所ではダム本体工事が本格化する令和4年4月より広報展示室を設置・公開するとともに、設楽ダム事業や設楽ダムの役割について、より多くの方に知っていただくために積極的に見学会を開催しています。



今年度の来場者予定数

R4年度比で**2倍**
(3月末迄の予約込み)

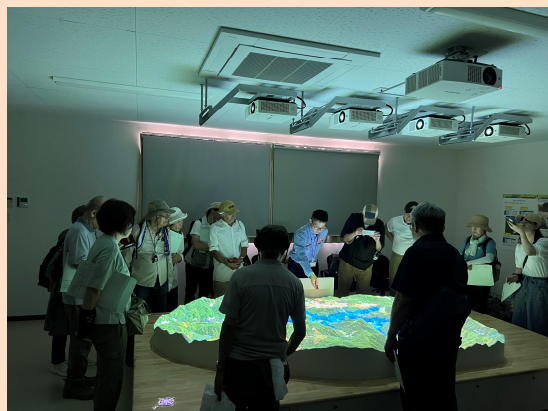

設楽ダムにおける地域振興の取り組み

アウトドアカレッジ×遊べる建設企業展 開催【令和7年9月27日(土)】

- 設楽ダムの工事現場を活用し、多くの関係者の協力のもとイベントを実施。（来場者約1,300名）
- 設楽町が進める「アウトドアカレッジ」と連携し新たな体験価値を提供するとともに、建設事業の技術を遊んで楽しく学び、設楽町の食材等の価値・魅力を広くPRすることを目的に開催。
- 3年間継続している本イベントの認知度は向上し、設楽町外からの参加者も多数。



場 所：付替県道設楽根羽線 小松トンネル
主 催：設楽ダム関連活動実行協議会（国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所、愛知県、豊川水系対策本部事務局、設楽町、設楽町商工会、一般社団法人設楽町観光協会）
出展ブース：設楽ダム工事・業務受注者、地元商店・団体等 計43ブース出展（出展者300名参加）

設楽夜市 夏・秋【令和7年 7月26日(土)・11月29日(土)】

- 設楽ダムの施工業者と設楽町民との交流イベントを実施。（来場者 夏約700名 秋約600名）
- 設楽ダム本体工事の本格化に伴い多くの施工業者が設楽町で生活を始めるため、施工業者と設楽町住民との交流促進を目的としてイベントを開催。
- ダム本体工事JV事務所からは外国人技術者がスリランカ出身であることからスリランカのカレーなどが振る舞われた。また、スリランカ人の音楽演奏や設楽町地域おこし協力隊のPRも行われた。



場 所：設楽町役場入口（駐車場およびキャンピー）

共 催 等：〈主催〉設楽町商工会青年部 〈共催〉設楽町 〈後援〉国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所 〈協力〉株式会社 安部日鋼工業、鹿島・戸田・竹中土木
特定建設工事共同企業体、日本振興株式会社

出展ブース：設楽ダム工事・業務受注者、地元商店・団体等、計：24ブース出展（夏）、26ブース出展（秋）
