


# 愛知県幸田町への災害復旧支援状況

平成20年8月29日の前線性豪雨により発生した愛知県広田川（愛知県額田郡幸田町）の破堤箇所において、木曽川下流河川事務所は災害復旧支援を行いました。

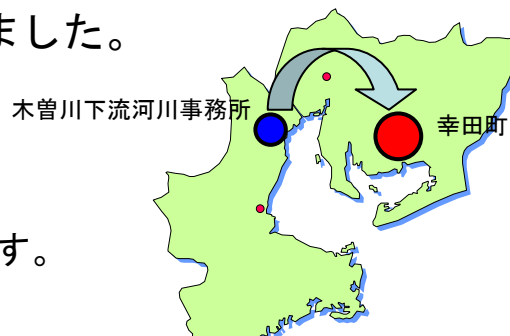

## 【災害復旧支援内容】

災害復旧支援内容は以下のとおりです。

- 排水ポンプ車の派遣
- 災害復旧支援資材（大型土のう袋、連節ブロック）の運搬

## 【排水ポンプ車の支援活動】

木曽川下流河川事務所からは9月1日～2日にかけて、排水能力40m<sup>3</sup>/分の排水ポンプ車1台を派遣し内水排除を行いました。




派遣した排水ポンプ車



冠水状況（9月1日）



排水作業状況

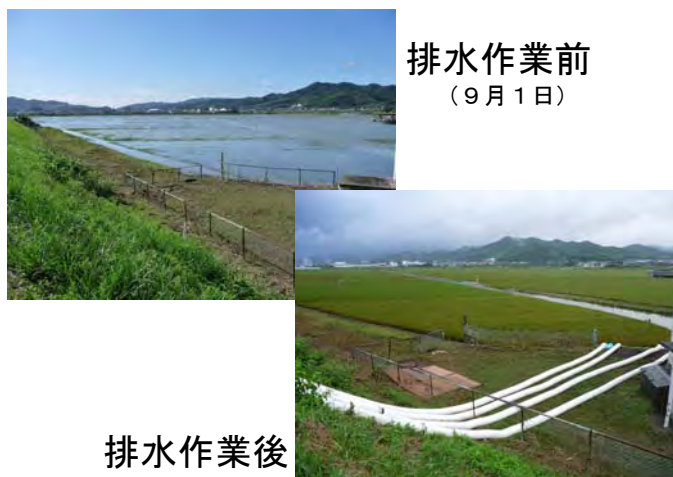

排水作業前  
（9月1日）

排水作業後  
（9月2日）

# 愛知県幸田町への災害復旧支援状況

## 【災害復旧支援資材の運搬】

木曾川下流河川事務所は破堤箇所の災害復旧支援資材として、大型土のう袋及び連節ブロックを被災地へ運搬しました。

### ●大型土のう袋

8月31日、木曾川下流河川事務所保管資材の大型土のう袋400袋を被災地へ運搬



輸送状況



搬入状況

### ●連節ブロック

8月31日～9月1日、木曾川下流河川事務所保管資材の連節ブロック約8,000個を被災地へ運搬



幸田町ストックヤード



連節ブロック仮置状況
