


踏切道安全通行カルテ

更新日：令和6年1月末

よみがな	ろっけん	所在地	岐阜県各務原市蘇原月丘町4丁目・3丁目			
踏切道名	六軒	道路名	市道 蘇南53号線	道路管理者名	各務原市	
		鉄道路線名	高山線	鉄道事業者名	東海旅客鉄道	

位置図・現況写真

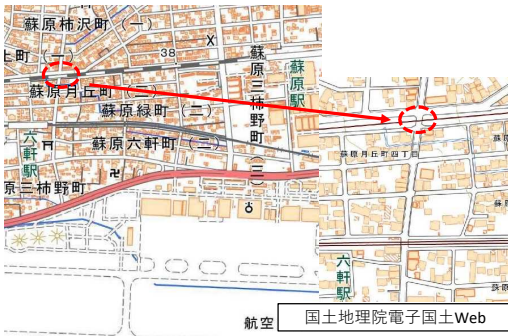

航空 国土地理院電子国土Web

現況



諸元・構造等

踏切種別		第1種	幅員 (m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)	
踏切長(m)		8		左道路	1.7	6.6	1.7	
横断本数(本)		1		踏切道	0.0	8.0	0.0	
交差角(度)		77		右道路	1.5	6.5	2.0	
道路 線形	左道路	直線	迂 回 路	種類	有無等	距離(m)		
	右道路	直線		自動車	両方共有り	760		
交通規制		交通規制なし		歩行者	迂回路なし (200m以内)	-		
車両進入防護柵等		設置していない		バリアリ 化	迂回路なし (200m以内)	-		
歩車道分離方法		なし		バリアリ 化 状況	-	DID地区	○	
踏切 保安 設備	賢い踏切	-		踏切支障報知 装置(手動)		○		
	高規格保安設備	障害物検知装置(光式) オーバーハング型警報装置	高齢者等の事故 防止対策設備		連接軌道化			
特性	通学路指定状況 (学校指定)	○	通学路交通安全 プログラム		○			
	バリアフリー法に 基づく特定道路上	-	緊急輸送道路上 重要物流道路上		-			
自動車交通量 (台/日)		7,120	歩行者等交通量 (人/日)		1,690	鉄道交通量 (本/日)	98	

基準算定データ									R3年9月末時点
ピーク時遮断時間(分)	5	前後歩道との幅員差(m)	-2.0	踏切内の事故発生状況	事故別	件数	死者数	地域課題	学校指定の通学路となっており、歩道整備が必要
A. 踏切自動車交通遮断量(台・時)	7,832	AとBの和	9,691		踏切事故	0	0		
B. 踏切歩行者等交通遮断量(人・時)	1,859				道路交通事故	0	0		

カルテ踏切の基準						R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切	歩行者ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切	歩道狭隘踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化 要対策踏切
-	-	-	○	○	-	-

法指定の状況					R6年1月末時点
法指定年月日	指定に係る基準（踏切道改良促進法施行規則）				
-	-	-	-	-	-

対策図・完了写真		対策実施の状況				R6年1月末時点
	進捗	協議会の 設置状況	改良計画書の 作成年度	事業化年度	工事着手年度	
	指定前	-	-	-	-	
	対策内容					
	-					
	事業完了年度	対策の効果等				
	-	-				
	除却年度					
	-					
