

踏切道安全通行カルテ

更新日：令和6年1月末

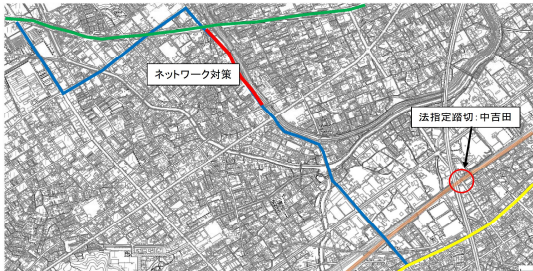
よみがな	なかよしだ	所在地	静岡県静岡市駿河区中吉田207-7		
踏切道名	中吉田	道路名	中吉田国道線	道路管理者名	静岡市
		鉄道路線名	東海道線	鉄道事業者名	東海旅客鉄道

位置図・現況写真		諸元・構造等					R3年9月末時点	
 (現況)  		踏切種別	第1種	幅員 (m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)
		踏切長(m)	9.1		左道路	3.5	11.0	3.5
		横断本数(本)	2		踏切道	3.5	11.0	3.5
		交差角(度)	90		右道路	3.5	11.0	3.5
		道路線形	左道路	直線	迂回路	種類	有無等	距離(m)
右道路	直線		自動車	両方共有り		650		
交通規制	交通規制なし	歩行者	迂回路なし (200m以内)	-				
車両進入防護柵等	設置していない	バリアリ化	迂回路なし (200m以内)	-				
歩車道分離方法	コンクリートブロック	バリアリ化 状況	-	DID地区		○		
踏切 保安 設備	賢い踏切	○		踏切支障報知 装置(手動)		○		
	高規格保安設備	オーバースタック型警報装置 障害物検知装置(光式)		高齢者等の事故 防止対策設備		コンクリートブロック 化		
特性	通学路指定状況 (学校指定)	非公表		通学路交通安全 プログラム		非公表		
	バリアフリー法に 基づく特定道路上	-		緊急輸送道路上 重要物流道路上		-		
自動車交通量 (台/日)		8,911		歩行者等交通量 (人/日)		1,042	鉄道交通量 (本/日)	289

基準算定データ									R3年9月末時点
ピーク時遮断時間(分)	29	前後歩道との 幅員差(m)	0.0	踏切内の 事故発生 状況	事故 別	件数	死者数	地域 課題	-
A. 踏切自動車交通遮断 量(台・時)	60,595	AとBの和	67,680		踏切 事故	0	0		
B. 踏切歩行者等交通遮断 量(人・時)	7,086				道路交 通事故	0	0		

カルテ踏切の基準						R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車ボトルネック踏切	歩行者ボトルネック踏切	歩道狭陰踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化 要対策踏切
-	○	-	-	-	-	-

法指定の状況					R6年1月末時点
法指定年月日	指定に係る基準（踏切道改良促進法施行規則）				
H29.1.27（旧法）	第2条第1号 (自動車ボトルネック踏切)	-	-	-	-

対策図・完了写真		対策実施の状況				R6年1月末時点
  R4年12月末時点	進捗	協議会の 設置状況	改良計画書の 作成年度	事業化年度	工事着手年度	
	対策完了	-	R2	H22	H22	
	対策内容					
	・ネットワーク対策（H22～R5.3） ・カラー舗装(H30)					
	事業完了年度	対策の効果等				
R4	-					
除却年度						
-						
