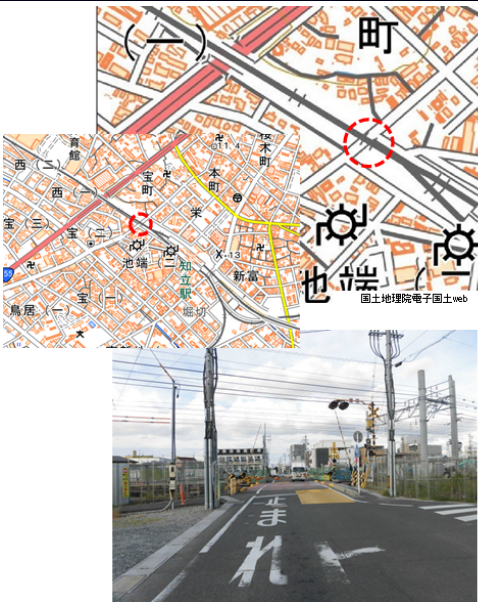


踏切道安全通行カルテ

更新日：令和8年3月末


よみがな	ちりゅう2ごう	所在地	愛知県知立市宝町塩掻		
踏切道名	知立2号	道路名	市道宝町上重原線	道路管理者名	知立市
		鉄道路線名	名古屋本線	鉄道事業者名	名古屋鉄道

位置図・現況写真		諸元・構造等						R3年9月末時点					
		踏切種別		第1種		幅員(m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)			
		踏切長(m)		8.3			左道路	0.0	5.6	1.2			
		横断本数(本)		2			踏切道	0.0	5.6	1.2			
		交差角(度)		70			右道路	0.0	5.6	1.2			
		道路 線形	左道路	直線		迂 回 路	種類	有無等	距離(m)				
			右道路	直線			自動車	両方共なし	-				
		交通規制		交通規制なし			歩行者	迂回路なし(200m 以内)	-				
		車両進入防護柵等		設置していない			バリア化	迂回路なし(200m 以内)	-				
		歩車道分離方法		コンクリートブロック			バリア化 状況	-	DID地区		○		
		踏切保 安設備	賢い踏切		○		踏切支障報知 装置(手動)		○				
			高規格保安設備		障害物検知装置(光式)		高齢者等の事故防止 対策設備		縦断材によるレールと路面の段間解消、踏 切道内の平滑化(連接軌道化等)				
		特性	通学路指定状況 (学校指定)		-		通学路交通安全プロ グラム		-				
			バリアフリー法に 基づく特定道路上		-		緊急輸送道路上 重要物流道路上		-				
		自動車交通量 (台/日)		3,735			歩行者等交通量 (人/日)		1,078		鉄道交通量 (本/日)		497

基準算定データ									R3年9月末時点
ピーク時遮断時間(分)	45	前後歩道との幅員差(m)	0.0	踏切内の事故発生状況	事故別	件数	死者数	地域課題	-
A. 踏切自動車交通遮断量(台・時)	42,473	AとBの和	54,732		踏切事故	-	-		
B. 踏切歩行者等交通遮断量(人・時)	12,259				道路交通事故	-	-		

カルテ踏切の基準							R3年9月末時点	
開かずの踏切	自動車ボトルネック踏切	歩行者ボトルネック踏切	歩道狭路踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化要対策踏切		
○	-	-	-	-	-	-		

法指定の状況						R7年12月末時点	
法指定年月日	指定に係る基準(踏切道改良促進法施行規則)						
H19.4.27(旧々法)	立体交差化	-	-	-	-		

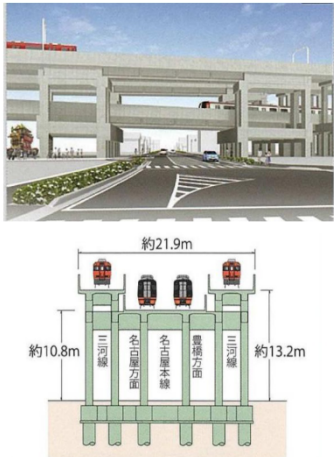対策図・完了写真		対策実施の状況				R8年3月末時点
	進捗	協議会の設置状況	改良計画書の作成年度	事業化年度	工事着手年度	
	事業中	—	H19	H12	H25	
	対策内容					
	・連続立体交差化（H12～） ・近年中に連立立体化により除却予定					
	事業完了年度	対策の効果等				
	—	—				
	除却年度					
	—					
