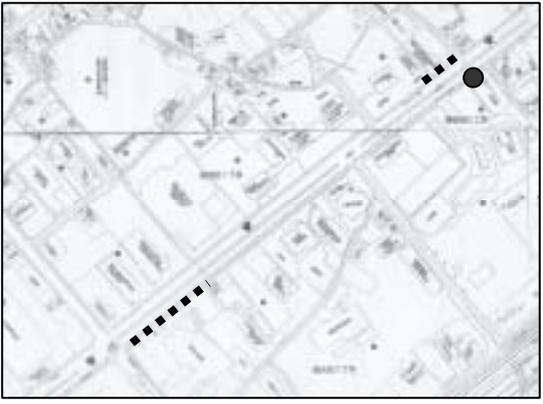
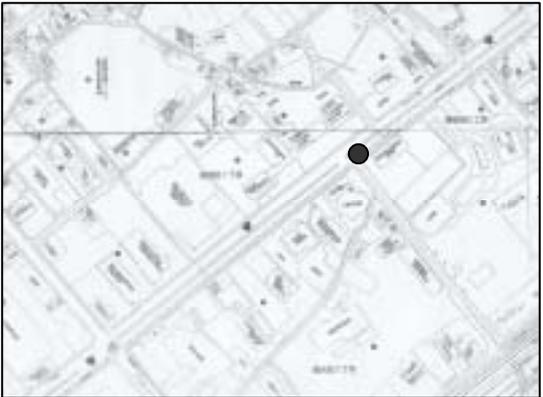
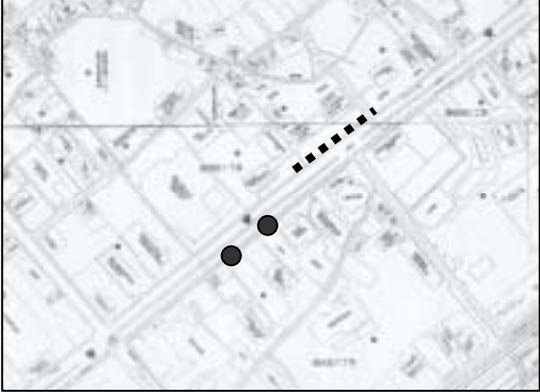


<p>名 称</p>	<p>国道1号沿道の雑草除去</p>	<p>管理主体</p>	<p>静岡国道事務所</p>
<p>現 状</p>	<p>・国道1号車道と歩道の境界ブロック沿いに雑草が生えている。</p>		
<p>現状写真 場所</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;">      </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> 車道と歩道間の雑草 </div>		
<p>該当する プチ項目</p>	<p>点検・連絡() 清掃・洗浄() 補充補修() 除去・撤去()</p>		
<p>実施内容</p>	<p>(1)雑草の除去 沿道のゴミを清掃する 境界ブロック沿いの雑草を除去する</p>		
<p>必要備品</p>	<p>草取り関連グッズ：シャベル、ヘラ、ホウキ、ちりとり</p>		
<p>備考</p>			

<p>名 称</p>	<p>破損した施設の撤去・境界ブロック塗装</p>	<p>管理主体</p>	<p>静岡国道事務所</p>
<p>現 状</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点歩道部分に破損したポールがある。 ・ポールとしての用途がないため撤去する。 		
<p>現状写真 場所</p>	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">  </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  </div>		
<p>該当する プチ項目</p>	<p>点検・連絡() 清掃・洗浄() 補充補修() 除去・撤去()</p>		
<p>実施内容</p>	<p>(1)ポール撤去 (2)境界ブロック塗装(コンクリート)</p>		
<p>必要備品</p>	<p>- 「不用」を示す表示 塗装関連グッズ : 塗料、刷毛、ぼろ雑巾</p>		
<p>備考</p>			

<p>名 称</p>	<p>ガードレールの一部塗装</p>	<p>管理主体</p>	<p>静岡国道事務所</p>
<p>現 状</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・作業範囲内のガードレールに一部錆がみられる。 ・錆は支柱と横の鉄柵の部分(ボルトの接続部分)にみられる 		
<p>現状写真 場所</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> </div>		
<p>該当する プチ項目</p>	<p>点検・連絡() 清掃・洗浄() 補充補修() 除去・撤去()</p>		
<p>実施内容</p>	<p>(1)ガードレール塗装</p> <ul style="list-style-type: none"> - 錆の布ペーパー等による簡単な除去後を行う - 錆とり後に塗装する 		
<p>必要備品</p>	<p>錆、汚れ取り関連グッズ：雑巾、ポリネットシート、布ペーパー、ワイヤブラシ 塗装関連グッズ：錆止め鉄部塗料(水性)、刷毛、ぼろ雑巾</p>		
<p>備考</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 横鉄部は円柱なので軍手等による塗装を行うなど簡易的な手法を検討する 		
