三遠南信自動車道 “三遠道路” （発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠道路（東栄） かわら版（1/1）

発 行　174号
（2024年9月1日）
責任者：安全協議会
神野建設(株)
鳥井　基裕
TEL090-1127-3685

① 令和5年度　三遠道路4号トンネル整備工事
神野建設㈱　鳥井　090-1127-3685

工事概要　三遠道路4号トンネル内の整備工事(監視員通路・内面塗装・防護柵)を行います。

進捗状況　8月は、監視員通路工(トンネル点検用通路)を行いました。
9月は、道路付属施設工(ケーブル配管・ハンドホール)を行います。

工事状況

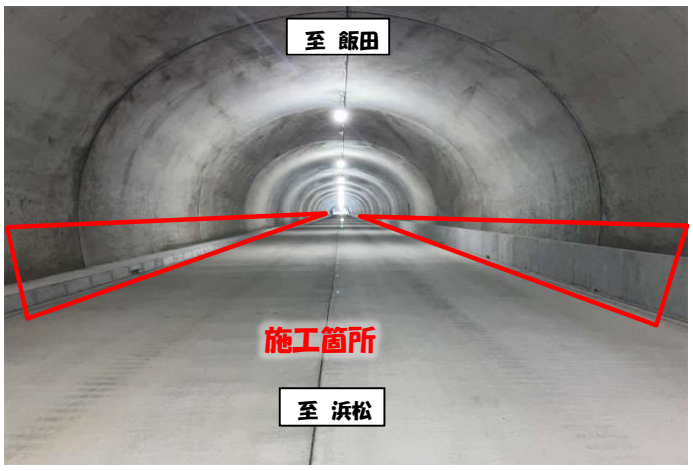

② 令和5年度　三遠道路トンネル電気室新築工事
藤城建設㈱　堀井　080-4083-8468

工事概要　三遠道路3号トンネルと4号トンネルの間で主電気室の新築工事を行います。

進捗状況　8月は、準備工を行いました。
9月は電気室の杭打ち工を行います。

工事状況

③ 令和5年度　三遠道路東栄地区道路建設工事
㈱中村組②　加藤　090-2613-9511

工事概要　P3橋脚からA2橋台までの床版工事及び、A1橋台からA2橋台までの擁壁工事を行います。

進捗状況　8月は、床版工事の鉄筋工、型枠工、コンクリート工を行いました。
9月は、壁高欄工と排水装置工を行います。

工事状況

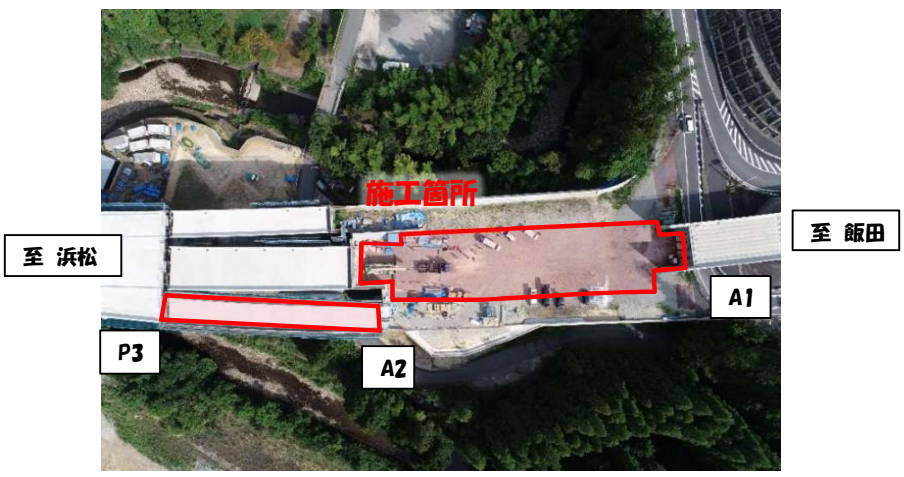

三遠南信自動車道位置図

・事業者連絡先

◎住　　所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号：053-542-3877
○受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！
【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/
