木曽川水系の渇水概要（令和8年11月4日時点）

渇水状況

中部の渇水情報は、こちら
https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/kassui_zyouhou/index.htm

■木曽川水系では、7月以降の降水量が少なく、平年に比べ河川流量が少ない傾向となっています。

■**揖斐川の万石地点（大垣市）**では、渇水の目安となる河川流量（30m3/s）を下回り、さらに断続的に20m3/sを下回ることから、揖斐川上流の徳山ダムからの補給により河川流量20m3/sを確保し、正常な河川環境の維持に努めております。

■10月16日には揖斐川上流域渇水対策会議を開催し、今後の補給運用について関係者と協議を行いました。

内容はこちらを参照　：　https://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/cms/press/pdf/kisya07_20261016.pdf

■木曽川上流河川事務所及び木曽川下流河川事務所、木曽川水系ダム統合管理事務所では渇水対策支部を継続し、河川等の状況監視、関係機関との連絡調整等を行っていきます。

※木曽川および長良川では、渇水の目安となる河川流量を上回っております。

木曽川水系の水源施設と供給先

岩屋ダム



徳山ダム



長良川河口堰





味噌川ダム



牧尾ダム



阿木川ダム



揖斐川万石地点（大垣市）の状況



【平常時】令和元年9月20日
（ 12時　流量　約60m3/s ）




【現況】令和8年11月4日
（ 14時　流量　約25m3/s ）

木曽川水系の渇水概要（令和8年11月4日時点）


木曽川　降雨・貯水状況等〔速報値〕

中部の渇水情報は、こちら
https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/kassui_zyouhou/index.htm

牧尾ダム




※王滝地点雨量

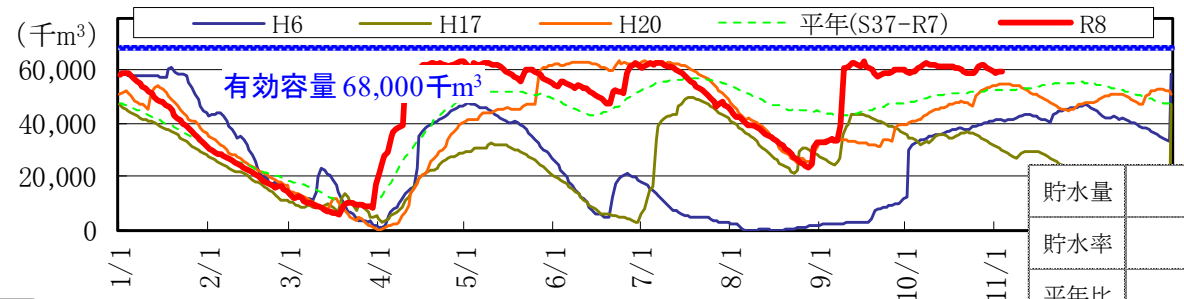


貯水量	59,491　千m3
貯水率	87.5　%
平年比	113.6　%

4 日 実績値

岩屋ダム



※下呂地点雨量

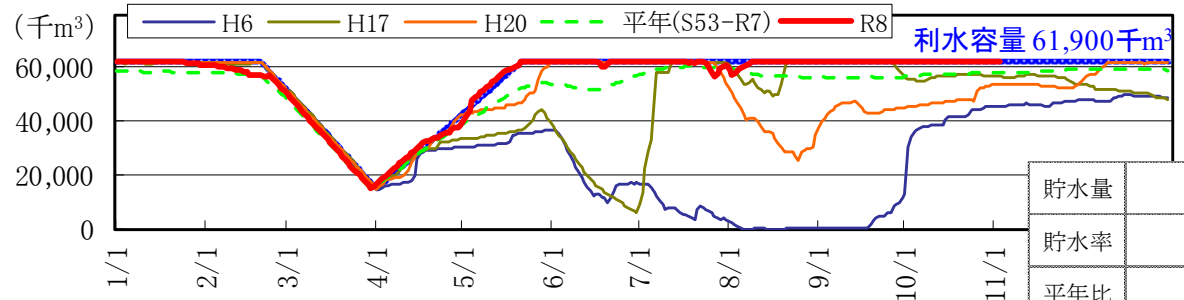



貯水量	61,900　千m3
貯水率	100.0　%
平年比	106.7　%

4 日 実績値

阿木川・味噌川ダム

※阿木川ダム(岩村)及び味噌川ダム地点雨量の合計



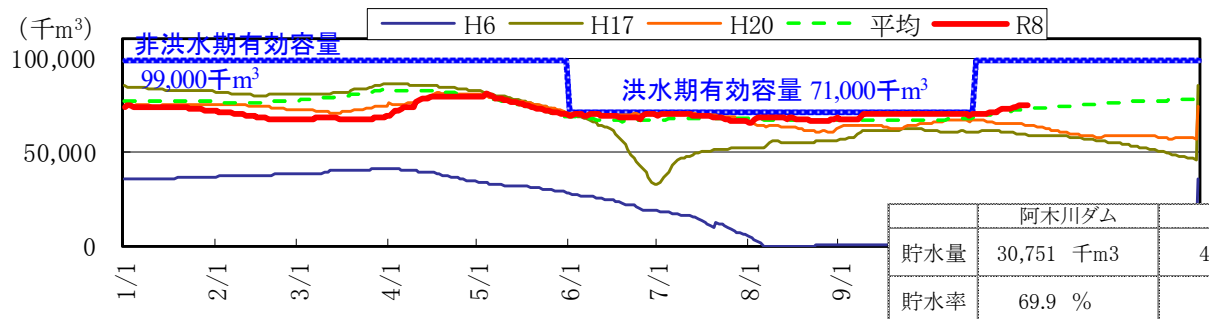

	阿木川ダム	味噌川ダム
貯水量	30,751　千m3	44,380　千m3
貯水率	69.9　%	80.7　%
平年比	107.7　%	99.7　%

4 日 実績値


記載の降水量、ダム諸量は速報値であり、今後変更となる可能性があります。

木曽川水系の渇水概要（令和8年11月4日時点）


中部の渇水情報は、こちら
http://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/kassui_zyouhou/index.htm

揖斐川　降雨・貯水状況等〔速報値〕

揖斐川　徳山ダム　降雨・貯水状況

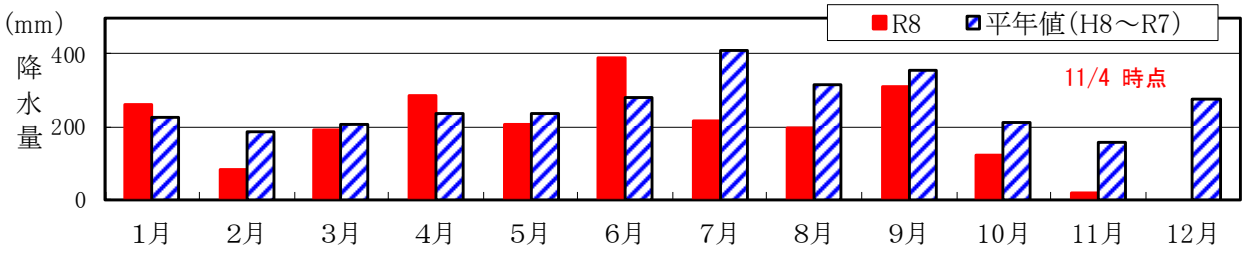


※徳山ダム地点雨量

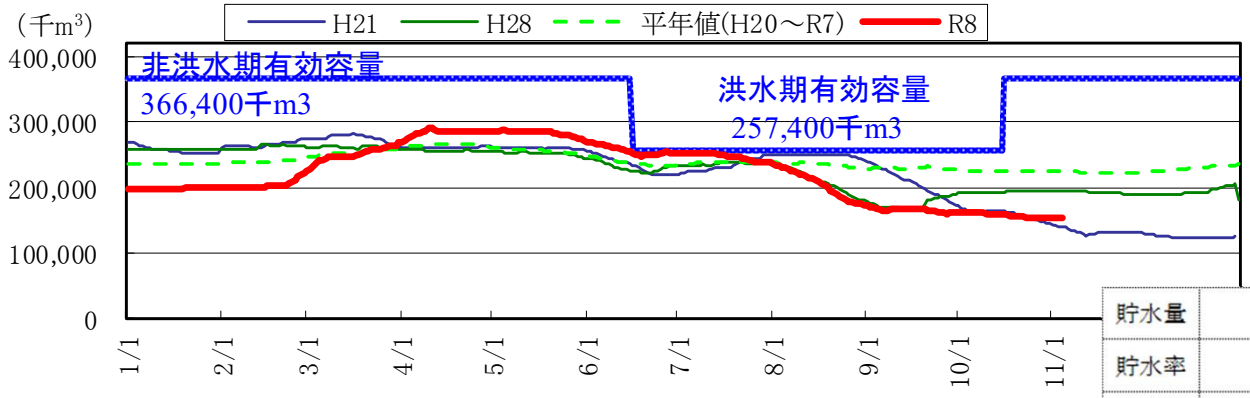

貯水量	154,896 千m3
貯水率	42.3 %
平年比	42.3 %

4 日 実績値

揖斐川　万石地点流況

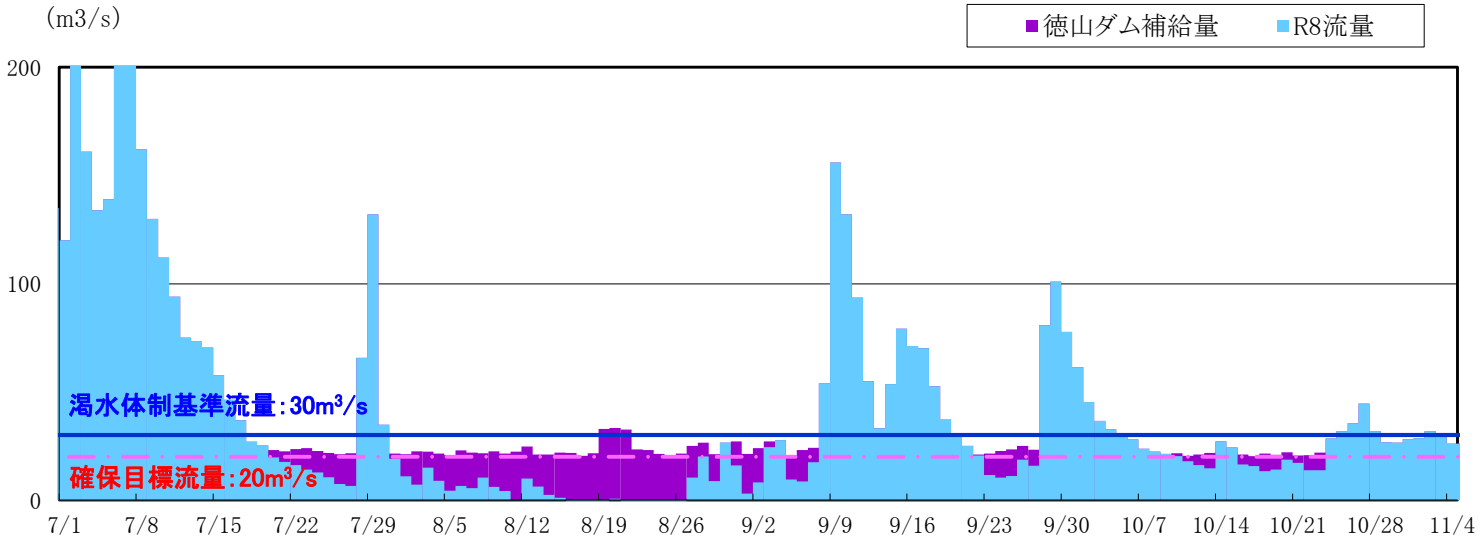

記載の河川流量、降水量、ダム諸量は速報値であり、今後変更となる可能性があります。
