国土交通省

第5回　長良川遊水地
河川環境調査検討会
【資料4】

※希少種保護の観点より、生息地等の情報を掲載している資料ページを非表示としております。

第5回　長良川遊水地河川環境調査検討会【長良川遊水地の整備に係る動植物の保全対策について】


令和8年10月15日
国土交通省　中部地方整備局
木曽川上流河川事務所

長良川遊水地の整備に係る動植物の保全対策について
【美濃市地区】

長良川遊水地（美濃市地区）における事業の実施手順

国土交通省

○長良川遊水地の美濃市地区については、下記に示す工程表のとおり事業を予定しているところ。

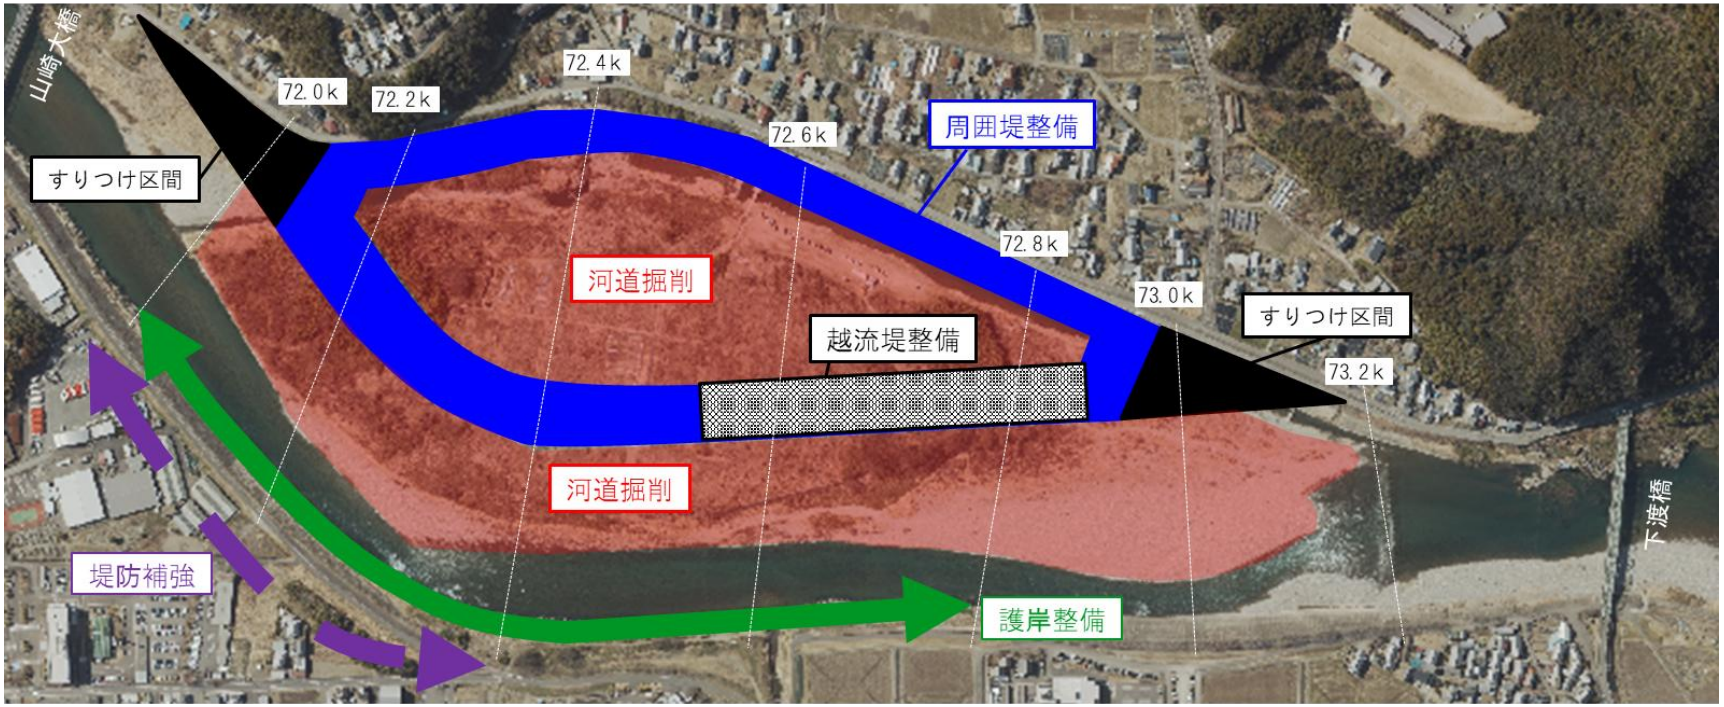

実施項目	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降
地元調整、調査設計	直轄化									
用地調査・買収										
左岸堤防補強・護岸整備										
河道掘削										
遊水地整備（※1）										


※1　周囲堤整備、越流堤整備、排水樋門、遊水地内掘削の他、遊水地整備に伴う附帯工事として中濃用水切り替え、堤内排水統合（内水処理）、大谷川付け替え、内川付け替えを含む。
※2　現時点での想定であり、今後の検討・設計により変更になる場合がある。

長良川遊水地（美濃市地区）における事業の実施状況

国土交通省

〇令和6年度には、長良川左岸堤防の補強を実施。

〇令和7年度はそれに加え、中島の官有地内で樹木伐開と河道掘削、長良川左岸堤防においては護岸の試験施工を実施。

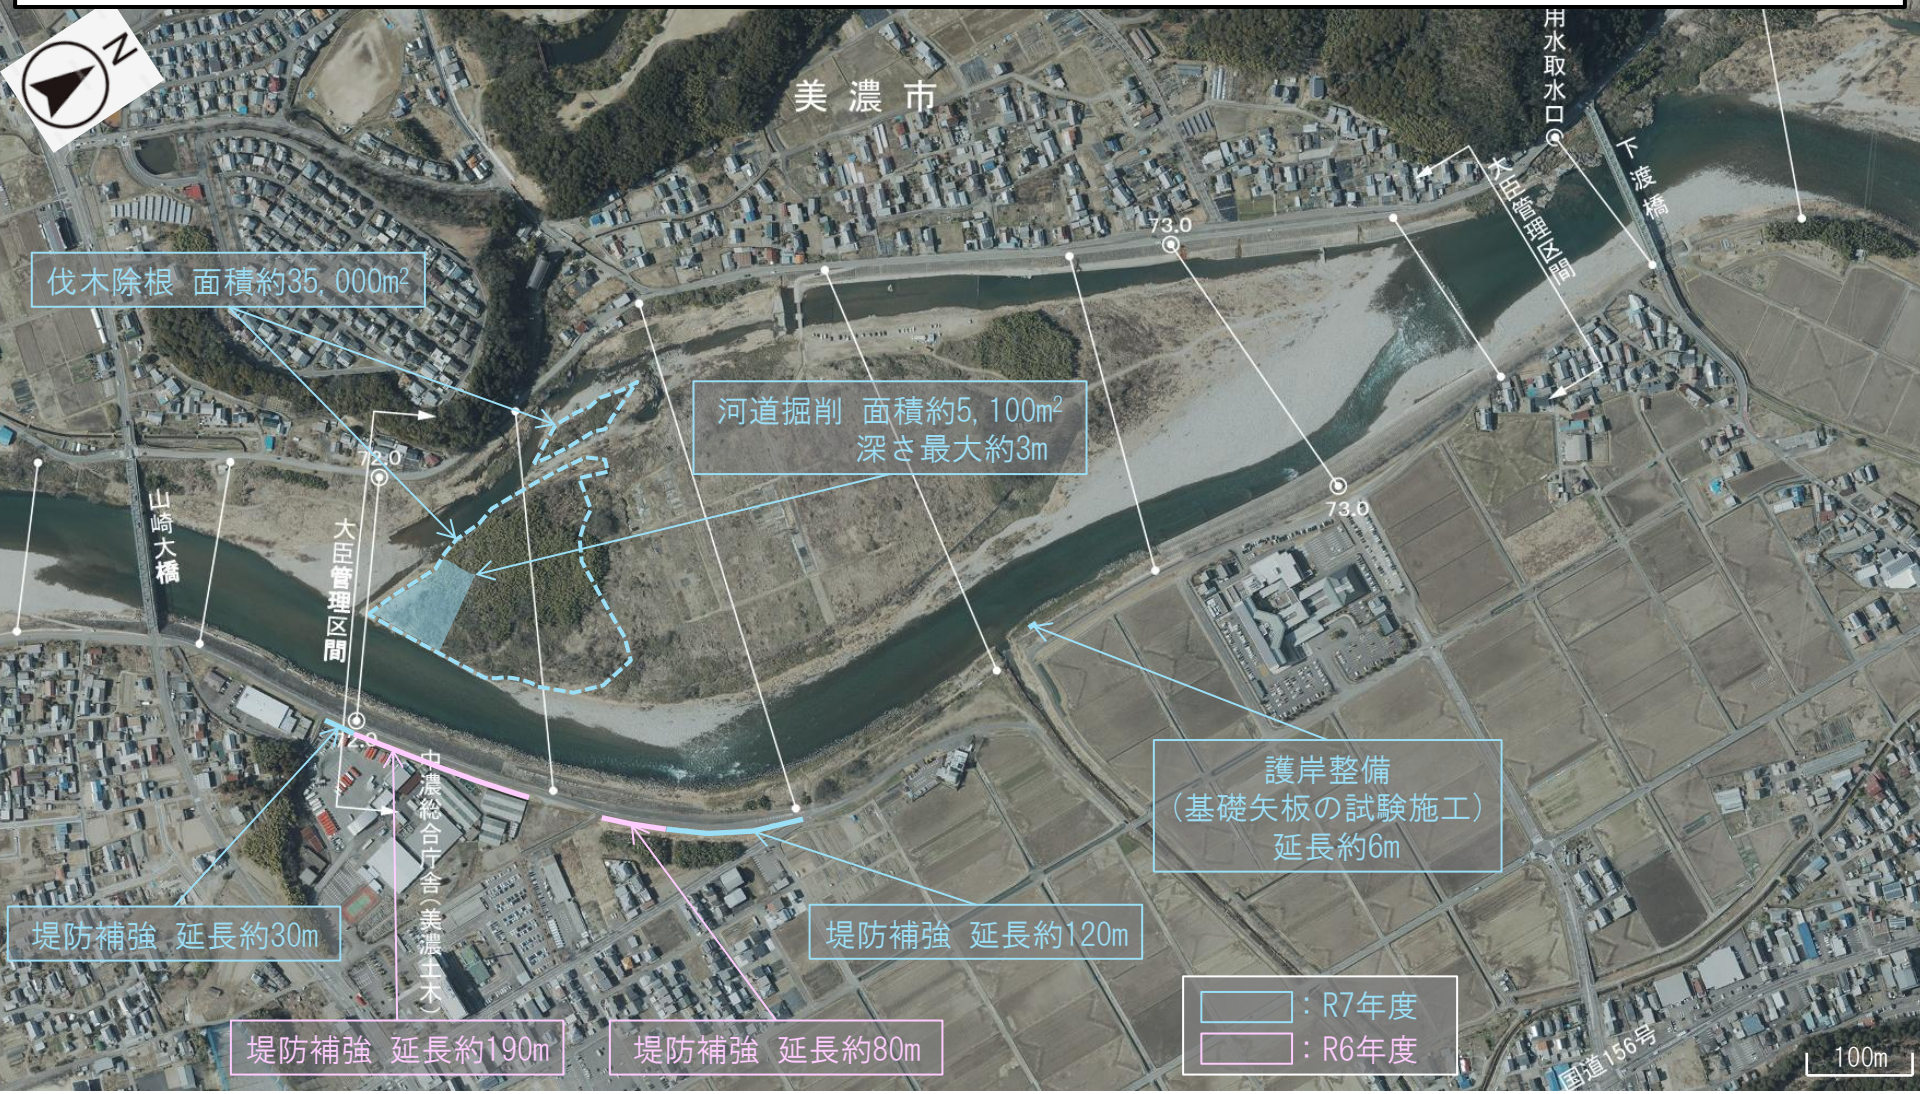


長良川遊水地（美濃市地区）の整備に係る動植物の保全対策について

国土交通省


○長良川遊水地（美濃市地区）の整備に係る動植物の保全対策について、下記2点を報告。

① 過年度工事（令和7年度まで）に伴う移植と移植後調査の結果

② 今年度予定工事（令和8年度）の「長良川遊水地事業における河川環境保全の基本的な考え方」に基づく工事前の調査や移植等保全対策の検討

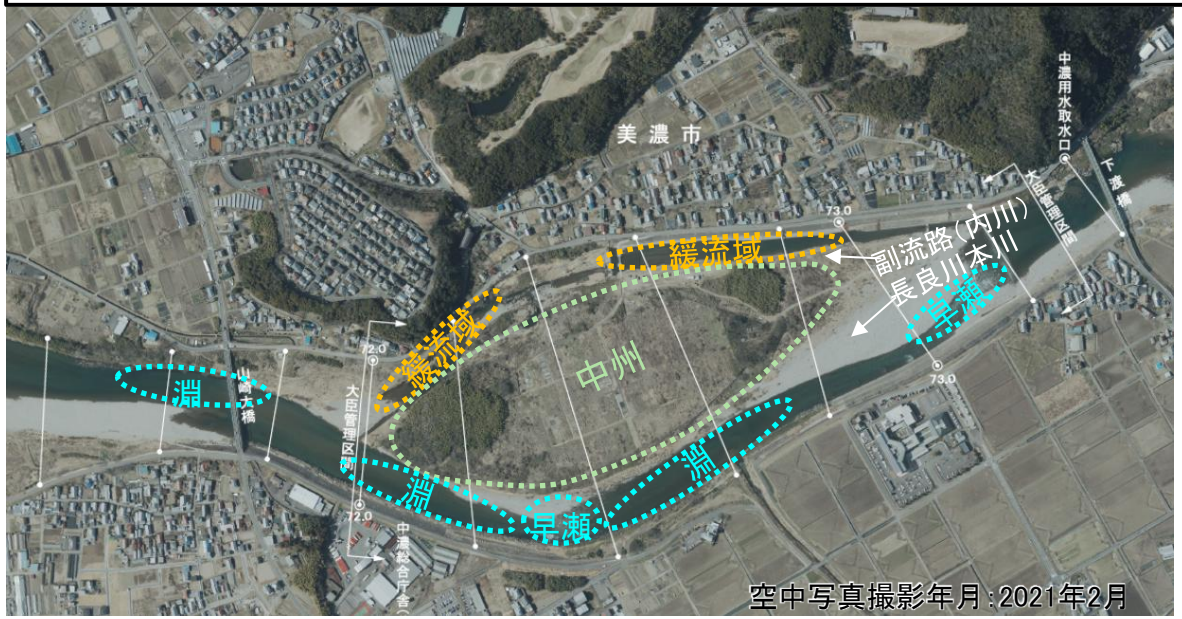

＜遊水地の工事実施にかかる調査の流れ＞

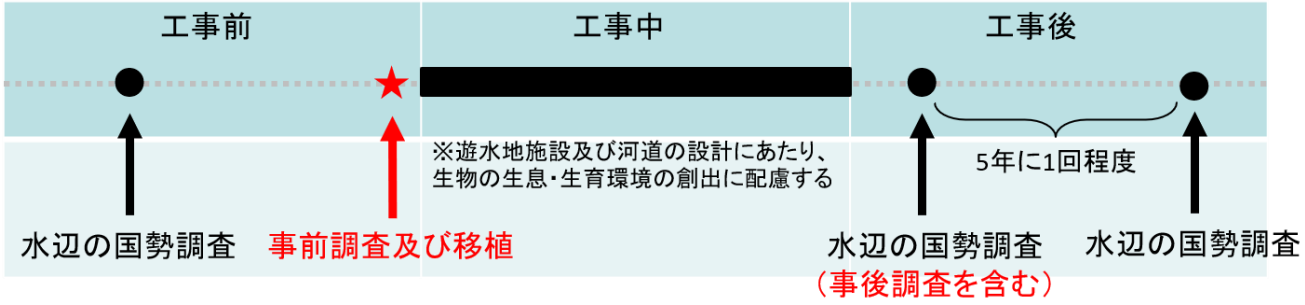


※1　遊水地施設及び河道の設計にあたり、生物の生息・生育環境の創出に配慮する。
※2　各段階における調査には河川水辺の国勢調査を含む。

今年度予定工事（令和8年度）【R8.9末時点】

国土交通省

○ 長良川左岸堤防では、堤防補強を完了させるとともに、護岸整備を開始。
○ 中島では引き続き、河道掘削を実施。

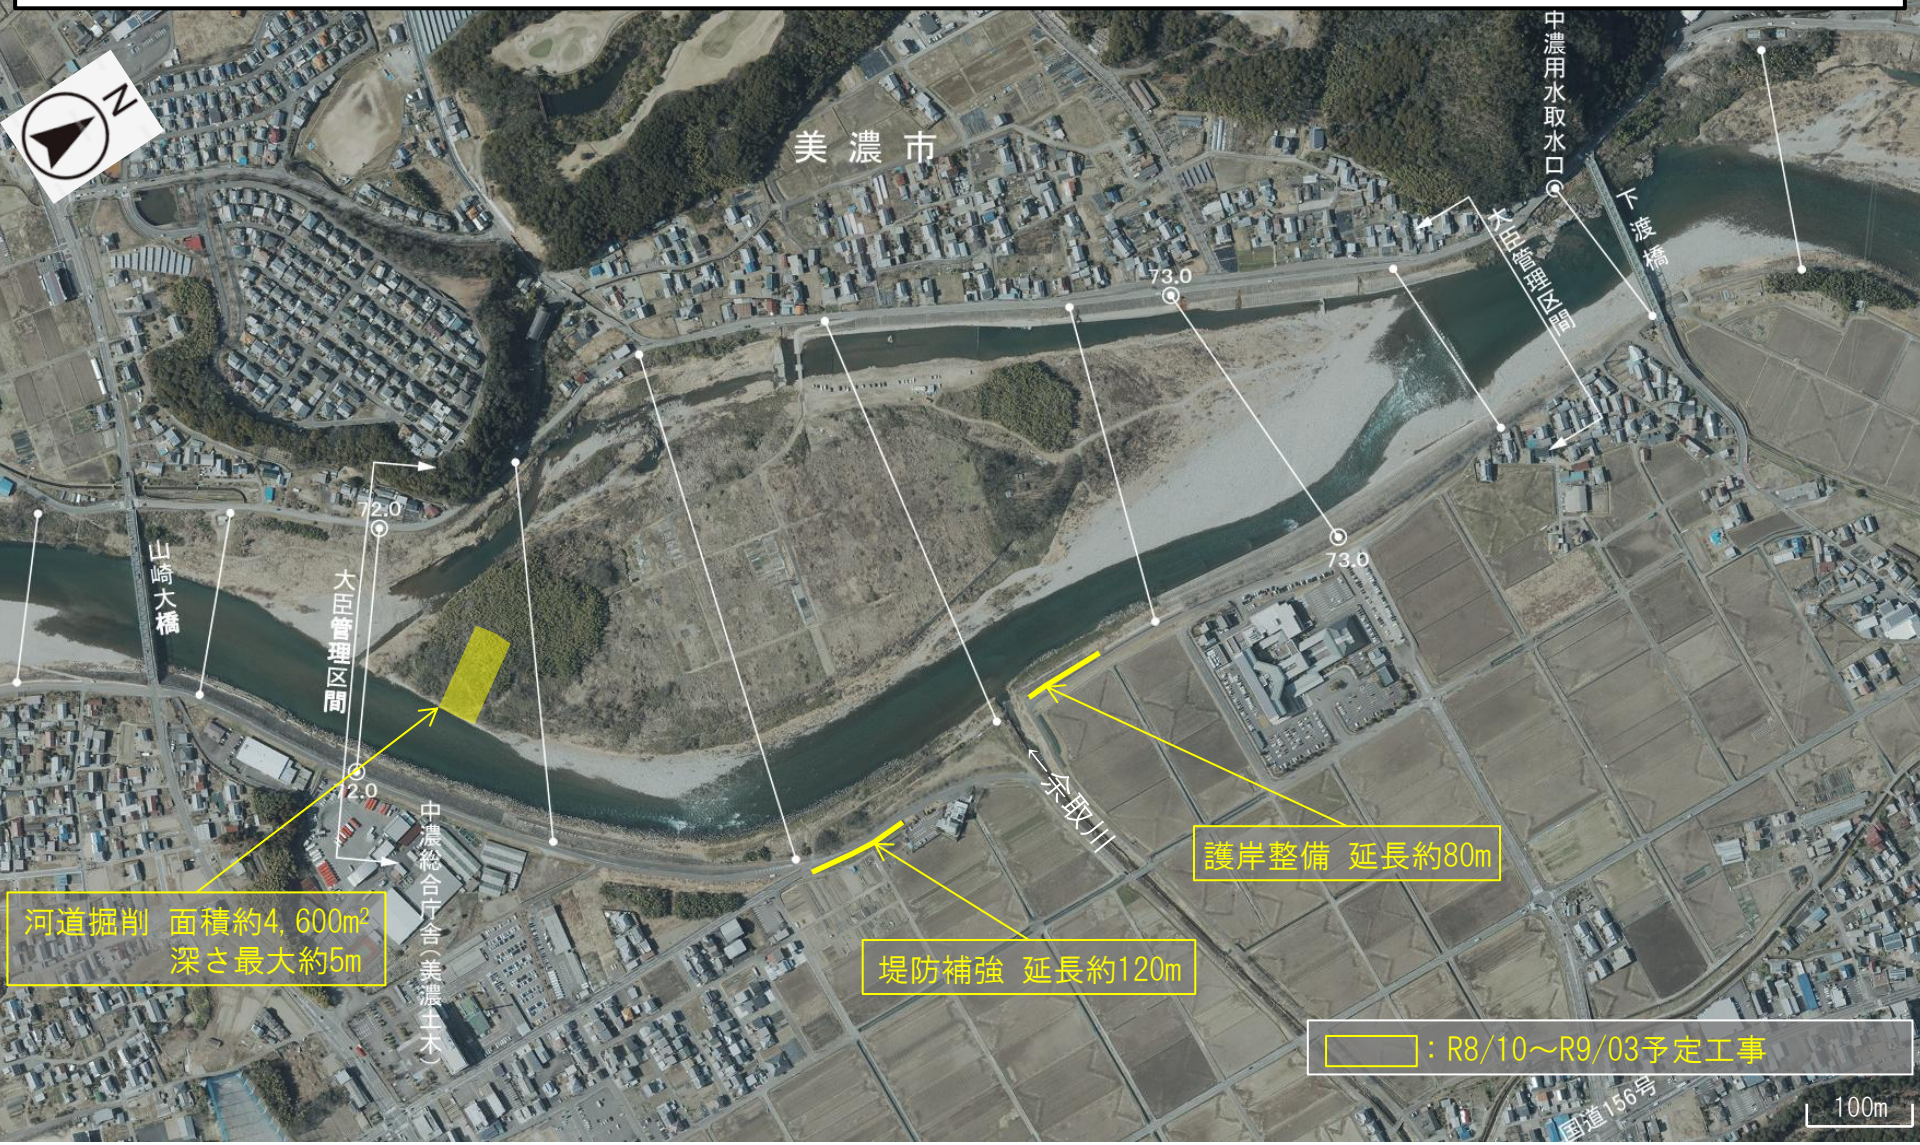


注）令和８年９月時点の検討状況を示したもので、今後変更となる場合がある。

堤防補強と護岸整備の概要

国土交通省

○ 堤防補強は、長良川左岸堤防の越水に対する補強策として、コンクリートブロックマットの整備を令和6年度から開始し、今年度の工事で完了の予定。

○ 護岸整備は、左岸堤防の老朽化した護岸を改修するもので、今年度から開始。なお、護岸基礎の形式は、昨年度の試験施工の結果を踏まえ、矢板式から直接式に見直し。

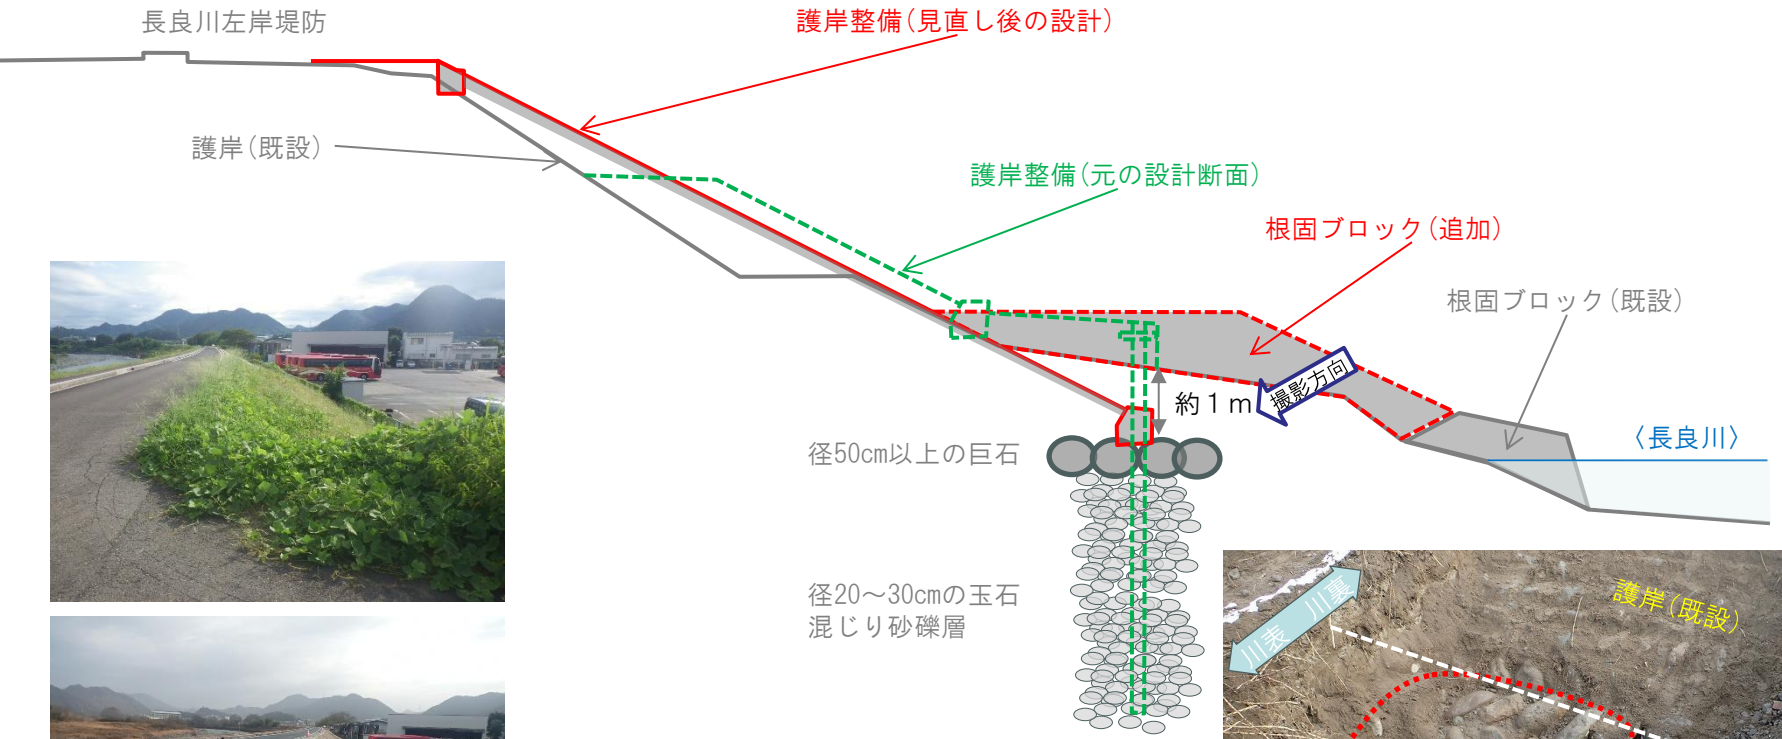



堤防補強　上：整備前、下：整備後
（下流側から上流方向を撮影）




河道掘削の概要

国土交通省

- ○ 河道掘削は、洪水流下時の河川水位低下を目的に、遊水地外側の幅約80mを対象として令和7年度から開始。
- ○ 令和7年度は最下流部の延長約50m(立積約9,000㎥)を実施し、令和8年度はその上流側の延長約50m(立積約12,000㎥)を予定。
- ○ 濁水発生の対策として、水際部を天端幅4m程度で残置し、内部には掘削で発生した0.3m程度以上の玉石の敷均を実施。





横断図


注）令和８年８月時点の検討状況を示したもので、今後変更となる場合があります。

長良川遊水地の整備に係る動植物の保全対策について
【関市地区】

長良川遊水地（関市地区）の整備に係る動植物の保全対策について


国土交通省

○長良川遊水地（関市地区）の整備に係る動植物の保全対策については、過年度工事の実績や今年度予定工事（令和8年度）が無いため、報告事項は無し。

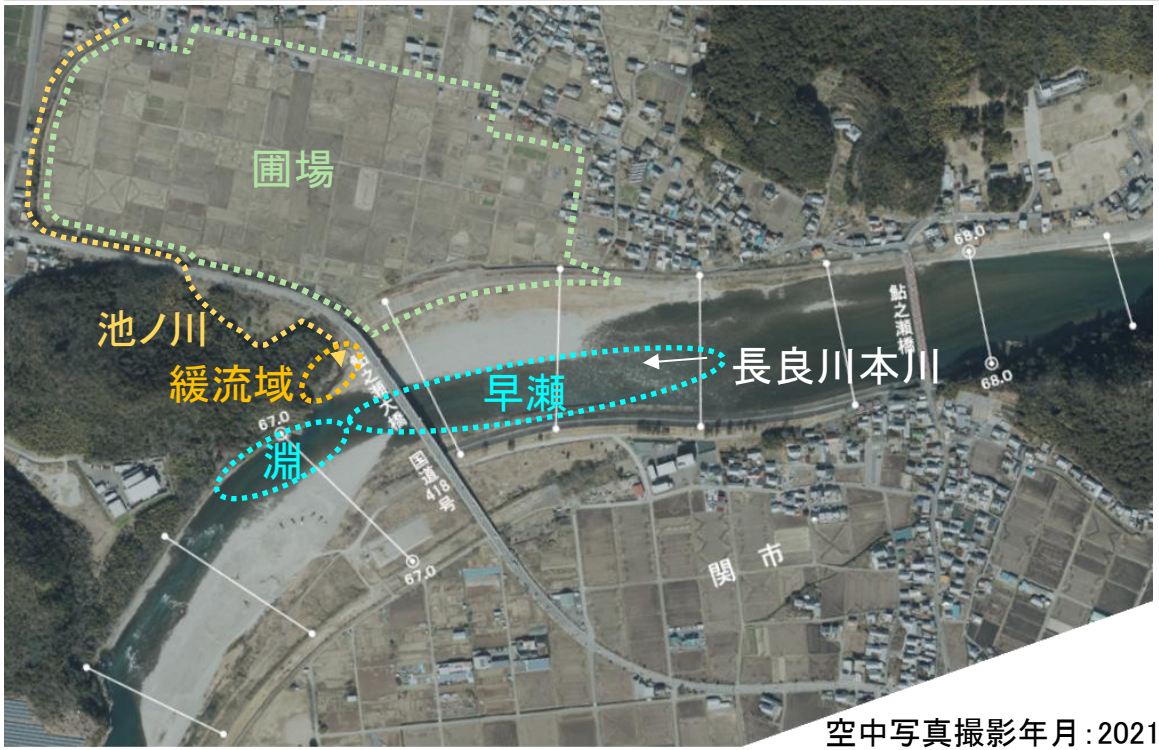

空中写真撮影年月：2021年2月

＜遊水地の工事実施にかかる調査の流れ＞

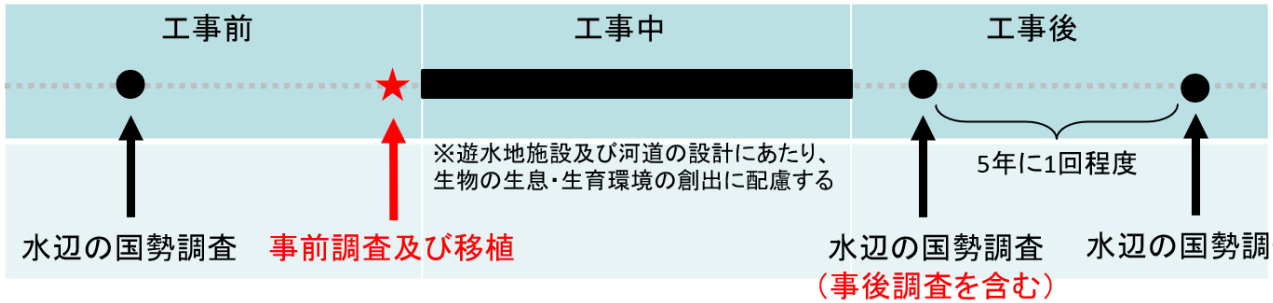

※1　遊水地施設及び河道の設計にあたり、生物の生息・生育環境の創出に配慮する。
※2　各段階における調査には河川水辺の国勢調査を含む。
