国道155号 豊田南バイパス・国道153号 豊田北バイパス　令和8年10月　工事便り　1/2





こちらのQRコードから
過去の工事便りもご覧に
なれます　↓

（名四国道事務所HP）





発刊　第77号　令和8年10月1日

豊田支部工事等安全協議会
編集長 ： 大有建設 株式会社
田町地区舗装 作業所
TEL　050-5865-7528
FAX　050-5865-7529

監修：名四国道事務所 豊田出張所
TEL　0565-32-7581
FAX　0565-32-7586

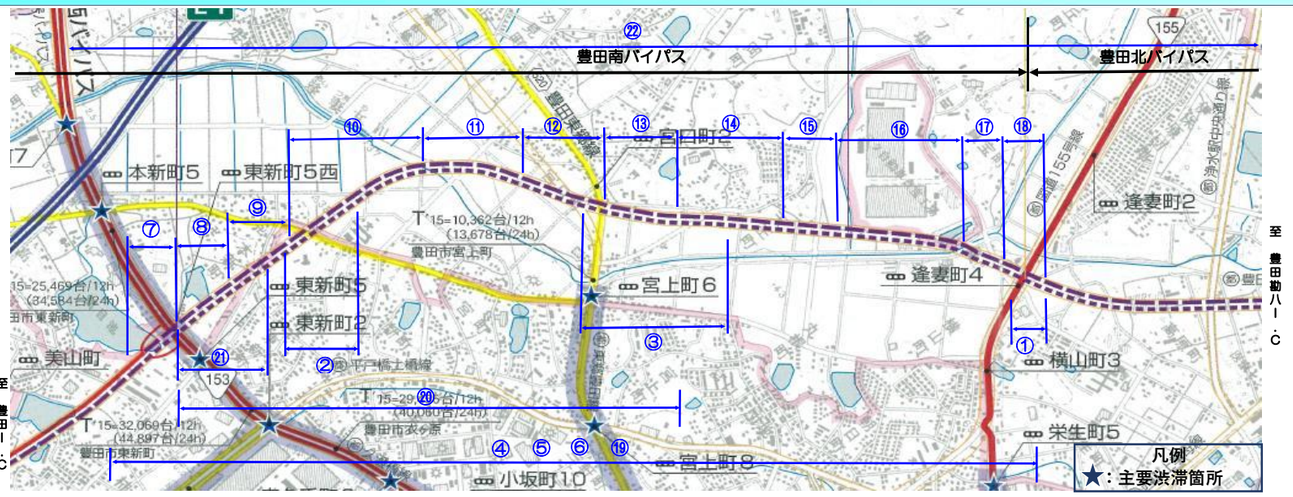

①　工事が完了しました

工事名	令和7年度　155号豊田南BP貞宝地区道路建設工事
工期	令和7年7月18日　～　令和8年9月30日
施工業者	株式会社光建 TEL 0565-41-8221　FAX 0565-41-8225
9月末時点進捗率	100%
10月作業予定	工事が完了しました。ご協力頂き誠にありがとうございました。
工事概要	豊田市貞宝町～逢妻町で国道155号の切り回し車線をまっすぐにもどし、歩道等を整備しています。




国道155号北側から南側を望む　　国道155号東側調整池を望む

②　工事が完了しました

工事名	令和7年度　155号豊田南BP田町地区道路建設工事
工期	令和7年9月8日　～　令和8年10月30日
施工業者	株式会社近藤組 TEL 0565-41-5068　FAX 0565-41-5068
9月末時点進捗率	100%
10月作業予定	工事が完了しました。ご協力頂き誠にありがとうございました。
工事概要	豊田市本新町～宮口町で豊田南バイパスの土台となる盛土を行っています。



豊田勘八I.C側から豊田IC側を望む

③　工事が完了しました

工事名	令和7年度　155号豊田南BP天王西地区道路建設工事
工期	令和7年9月8日　～　令和8年9月30日
施工業者	ヤハギ道路株式会社 TEL 0565-41-6105　FAX 0565-41-6105
9月末時点進捗率	100%
10月作業予定	工事が完了しました。ご協力頂き誠にありがとうございました。
工事概要	豊田市宮口町～天王町で豊田南バイパスの土台となる盛土、県道豊田東郷線との交差点をつくっています。




豊田IC側から豊田勘八I.C側を望む　　県道 豊田東郷線

④

工事名	令和7年度　155号豊田南BPCCTV設備工事
工期	令和7年10月1日　～　令和8年12月18日
施工業者	NDS株式会社 TEL 052-445-2133　FAX 052-445-2140
9月末時点進捗率	73%
10月作業予定	基礎設置、機器設置
工事概要	豊田市東新町～逢妻町で道路の様子を確認するためのカメラを取り付けています。




国道153号　本新町6丁目　　国道153号　東新町2丁目

⑤

工事名	令和7年度　１５５号豊田南BP通信設備工事
工期	令和7年11月4日　～　令和8年12月18日
施工業者	朝日電気工業株式会社 TEL 052-471-3263　FAX 052-486-2568
9月末時点進捗率	36%
10月作業予定	配管配線工
工事概要	豊田市東新町～逢妻町で道路情報を伝える表示板を取り付けています。



豊田勘八I.C側から豊田IC側を望む

⑥

工事名	令和7年度　１５５号豊田南BP電気設備工事
工期	令和7年11月18日　～　令和8年12月18日
施工業者	NDS株式会社 TEL 052-445-2133　FAX 052-445-2140
9月末時点進捗率	73%
10月作業予定	道路照明設備工
工事概要	豊田市東新町～逢妻町で道路照明を取り付けています。



国道153号　東新町5丁目

⑦

工事名	令和7年度　155号豊田南BP東新地区舗装工事
工期	令和8年4月1日　～　令和8年12月11日
施工業者	フジタ道路株式会社 TEL 0565-42-2771　FAX 0565-42-2772
9月末時点進捗率	37%
10月作業予定	舗装工、道路付属物工、道路土工
工事概要	豊田市柿本町～東新町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。



豊田勘八I.C側から豊田IC側を望む

⑧

工事名	令和7年度　155号豊田南BP本新南地区舗装工事
工期	令和8年4月1日　～　令和8年12月11日
施工業者	岐建株式会社 TEL 0565-85-0227　FAX 0565-85-0227
9月末時点進捗率	39%
10月作業予定	道路土工、擁壁工、排水構造物工
工事概要	豊田市東新町～本新町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。



豊田IC側から豊田勘八I.C側を望む

⑨

工事名	令和7年度　155号豊田南BP本新北地区舗装工事
工期	令和8年4月1日　～　令和8年12月11日
施工業者	岐建株式会社 TEL 0565-85-0227　FAX 0565-85-0227
9月末時点進捗率	29%
10月作業予定	排水構造物工、縁石工、情報ボックス工、標識工
工事概要	豊田市東新町～本新町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。



豊田IC側から豊田勘八I.C側を望む

⑩

工事名	令和7年度　155号豊田南BP田町地区舗装工事
工期	令和8年4月1日　～　令和8年12月11日
施工業者	大有建設株式会社 TEL 050-5865-7528　FAX 050-5865-7529
9月末時点進捗率	33%
10月作業予定	舗装工、排水構造物工、縁石工、踏掛版工、道路付属施設工、防護柵工
工事概要	豊田市田町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。



豊田IC側から豊田勘八I.C側を望む

⑪

工事名	令和7年度　155号豊田南BP宮口西地区舗装工事
工期	令和8年4月1日　～　令和8年12月11日
施工業者	東亜道路工業株式会社 TEL 050−5865-7270　FAX 050−5865-7271
9月末時点進捗率	52%
10月作業予定	舗装工、防護柵工、排水構造物工、道路付属物工
工事概要	豊田市宮口町～天王町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。



豊田IC側から豊田勘八I.C側を望む

⑫

工事名	令和7年度　155号豊田南BP宮口東地区舗装工事
工期	令和8年4月1日　～　令和8年12月11日
施工業者	大有建設株式会社 TEL 050-5865-7528　FAX 050-5865-7529
9月末時点進捗率	53%
10月作業予定	道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工
工事概要	豊田市田町～天王町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。



豊田勘八I.C側から豊田IC側を望む

国道155号 豊田南バイパス・国道153号 豊田北バイパス　令和8年10月　工事便り　2/2

⑬

工事名	令和7年度　155号豊田南BP天王西地区舗装工事
工期	令和8年4月1日　～　令和8年12月11日
施工業者	常盤工業株式会社 TEL　052−803−3431　FAX　052−803−4394
9月末時点進捗率	22%
10月作業予定	縁石工、排水工、舗装工
工事概要	豊田市宮口町～天王町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。



豊田IC側から豊田勘八IC側を望む

⑭

工事名	令和7年度　155号豊田南BP天王中地区舗装工事
工期	令和8年4月1日　～　令和8年12月11日
施工業者	大林道路株式会社 TEL　0565-24-3663　FAX　0565-24-8494
9月末時点進捗率	29%
10月作業予定	道路土工、舗装工、縁石工、防護柵工
工事概要	豊田市天王町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。



豊田IC側から豊田勘八IC側を望む

⑮

工事名	令和7年度　155号豊田南BP天王東地区舗装工事
工期	令和8年4月1日　～　令和8年12月11日
施工業者	日本道路株式会社 TEL　0566-62-6588　FAX　0566-62-6801
9月末時点進捗率	29%
10月作業予定	撤去工、道路土工、舗装工、道路付属施設工
工事概要	豊田市天王町～貞宝町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。



豊田IC側から豊田勘八IC側を望む

⑯

工事名	令和7年度　155号豊田南BP横山西地区舗装工事
工期	令和8年4月1日　～　令和8年12月11日
施工業者	東亜道路工業株式会社 TEL　050-5865-7270　FAX　050-5865-7271
9月末時点進捗率	58%
10月作業予定	舗装工、道路土工、防護柵工、道路付属施設工
工事概要	豊田市丸根町～貞宝町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。



豊田IC側から豊田勘八IC側を望む

⑰

工事名	令和7年度　155号豊田南BP豊田管内道路舗装工事
工期	令和8年4月1日　～　令和9年2月26日
施工業者	太啓建設株式会社 TEL　0560-37-7571　FAX　0560-37-7573
9月末時点進捗率	35%
10月作業予定	排水構造物工、ケーブル配管工、舗装工
工事概要	豊田市逢妻町で豊田南バイパスの土台となる盛土や擁壁をつくります。



豊田IC側から豊田勘八IC側を望む

⑱

工事名	令和7年度　155号豊田南BP逢妻東地区道路舗装工事
工期	令和8年4月1日　～　令和8年12月11日
施工業者	中部土木株式会社 TEL　0565-42-5610　FAX　0565-42-5611
9月末時点進捗率	36%
10月作業予定	擁壁工、排水構造物工
工事概要	豊田市逢妻町で豊田南バイパスの擁壁工事、アスファルト舗装工事をおこないます。



豊田勘八IC側から豊田IC側を望む　国道155号

⑲

工事名	令和7年度　155号豊田南BP標識設置工事
工期	令和8年3月30日　～　令和8年12月11日
施工業者	木村建設株式会社 TEL　0565-41-4931　FAX　0565-41-4932
9月末時点進捗率	39%
10月作業予定	工場製作、大型標識工
工事概要	豊田市東新町～逢妻町で豊田南バイパスをより安全にご利用していただくための大型標識を設置します。



県道 豊田東郷線　みよし市方面を望む

⑳

工事名	令和7年度　155号豊田南BP豊田西部道路建設工事
工期	令和8年4月1日　～　令和9年2月26日
施工業者	中日建設株式会社 TEL　0565-41-3492　FAX　0565-41-3493
9月末時点進捗率	32%
10月作業予定	擁壁工、情報ボックス工、橋梁付属物工
工事概要	豊田市東新町～天王町において豊田南バイパスを支えるための擁壁をつくります。



豊田勘八IC側から豊田IC側を望む

㉑

工事名	令和8年度　155号豊田南BP管内道路整備工事
工期	令和8年7月6日　～　令和9年2月26日
施工業者	ヤハギ道路株式会社 TEL　0565-41-6105　FAX　0565-41-6105
9月末時点進捗率	5%
10月作業予定	道路土工、排水構造物工、仮設工
工事概要	豊田市東新町～本新町で側道の整備を行っています。



豊田IC側から豊田勘八IC側を望む(右側側道)

㉒

工事名	令和8年度　豊田出張所整備工事
工期	令和8年7月31日　～　令和9年3月31日
施工業者	関興業株式会社 TEL　後日記載　FAX　後日記載
9月末時点進捗率	6%
10月作業予定	準備工、測量工、排水構造物工
工事概要	豊田市東新町～扶桑町で豊田南北バイパスの整備をしています。



豊田IC側から豊田勘八IC側を望む(田町地区右側側道)

国道155号豊田南バイパス 工事現場の一コマ



鉄筋の組立を行っています。



簡易発電機を設置しています。



ドローンを使って撮影。
上空から現場の進捗を
確認できます。

編集長からひと言

平素は、豊田南・北バイパス工事に関しまして、地域の皆様にはご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

令和８年10月度の工事便りの編集長になりました『令和７年度　155号豊田南BP田町地区舗装工事』を施工しております、大有建設㈱ 現場代理人です。

私どもの工事では、155号豊田南バイパスの田町地区において、豊田南バイパス本線の排水側溝、舗装を行っています。

工事期間中は地元の方々には何かとご負担をおかけしますが、引続き豊田南・北バイパス工事にご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

つなぎます、ハートとハート。
MEISHI

こちらのQRコードから
過去の工事便りもご覧に
なれます　↓

（名四国道事務所HP）
