一般国道２３号　中勢バイパス　現場情報　Vol.56
2015年度11月号

ちゅうばす通信

中勢ＢＰ連絡協議会

晩秋の候、皆様にはおかわりございませんでしょうか。先月に引き続き晴天が続いておりまして、工事は順調に進んでいます。中勢バイパスの鈴鹿市御薗町附近での新規工事の請負業者が新たに決まりました。また、詳細は次号に掲載します。既に施工を行っている工事同様、宜しくお願い致します。また何かお気付きの点がございましたら鈴鹿国道出張所までご連絡頂ければご対応致します。

１１月１２日（木）三重県総合文化センターにて「平成 27 年度工事安全衛生協議会総会」が行われました。
現在、国交省三重河川国道事務所内では、約１３０件余りの工事や業務を行っており、今回の総会には、総数約２５０名（うち受注者約２００名）の方にご参加頂きました。
三重県警察本部交通部交通企画課　課長補佐相馬進様、三重労働局労働基準部健康安全課課長　伊藤彰則様に講話を頂き、その後、鈴鹿国道支部からは、(株)アイケーディ「平成２６年度２３号鈴鹿地区道路建設工事」監理技術者　後藤博伸様より「工事現場における安全対策の工夫」の安全活動発表を行いました。
各工事担当者の皆様、お忙しい中ご参加頂きまして誠にありがとうございました。

後ろのページにも紹介させてもらっていますが、津市久居野村町～津市高茶屋(165 号線まで)間の側道及び歩道が１１月２４日より開通致します。本線が開通してから数ヶ月お待たせし、地元の方にはご不便をおかけしました。まだ、他の地区でも施工が残っております。今後も引き続き工事しますのでよろしくお願いします。

～～～

①　平成26年度　23号鈴鹿・津地区道路建設工事

側道及び歩道部分が開通致します！

津市久居野村町～津市高茶屋(165号線)　平面図

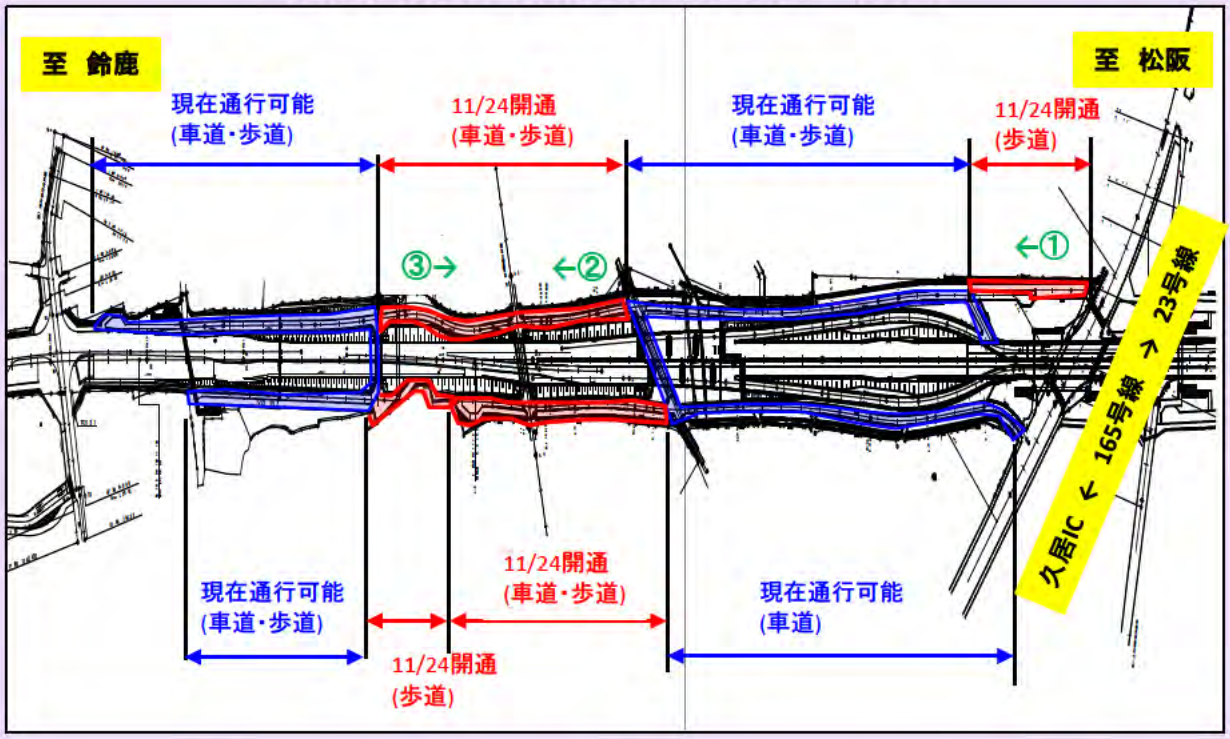

写真①

写真②

写真③

中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽの津市久居野村町～津市高茶屋(165号線まで)間の側道及び歩道が
１１月２４日より開通致します。（上記の平面図に示す、赤く着色された部分）
近隣住民の方々には大変ご迷惑をおかけしたかと存じます。ご協力ありがとうございました。
相川～野村工区の歩道舗装に関しましては、１１月中旬頃に完成予定です。
尚、10月下旬から鈴鹿市御薗地区において、場所打杭工を行っており、１１月下旬より
橋台・橋脚工の本体工事に着手してまいります。
引き続き近隣住民の方々にはご迷惑をおかけすると思いますが、ご協力お願いいたします。

施工者　三重農林建設㈱
TEL059-373-4525
(現場事務所)

現場代理人　大家　裕貴

監理技術者　小島　久典

3ヶ月予定工程

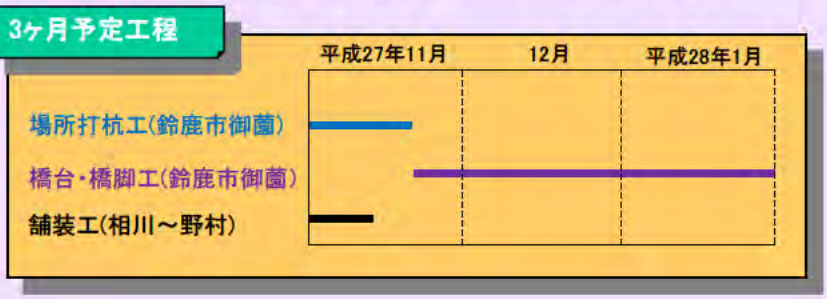

②　平成２６年度　２３号鈴鹿・津地区整備工事

本線NO.495付近（終点側）
11月11日現在

本線NO.467付近（起点側）
ボックスカルバート施工箇所

中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽの整備工事をします三重農林建設(株)です。工事は安全第一で進めていきますので、宜しくお願いします。
工事内容は三行地区で区間約0.6ｋｍの工事用道路作る作業していきます。
11月17日よりボックスカルバート下の地盤改良作業に入ります。改良作業完了後カルバート工に作業を進めていきます。11月18日よりに掘削・土の搬出作業を行います。

施工者　三重農林建設(株)
℡059-232-0555

現場代理人　内田　啓介

監理技術者　青木　則正

3ヶ月予定工程

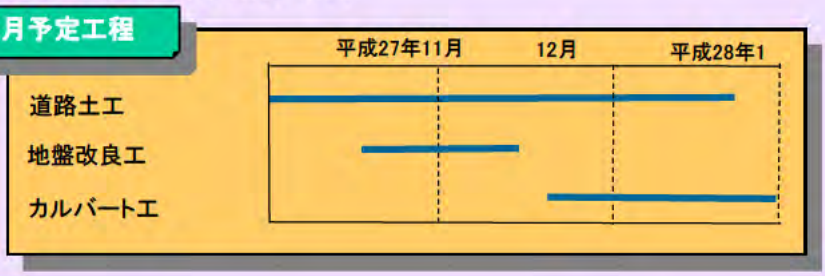

③　平成２６年度　２３号鈴鹿地区道路建設工事

地盤改良工

市道切替工

(株)アイケーディです。皆様のご協力のおかげで市道栄天名線(中ノ川の右岸堤防道路)切替え工事が完了し、現在開通しております。この道路は約２年間程度、通っていただくこととなりますのでご協力お願いします。
地盤改良工は現在高さ28mの大きな機械で深いところの改良を行っており、約8割が完了しております。
その後上部改良の構築に入っていく予定です。改良にあたっては粉塵の抑制等につとめて施工してまいります。

施工者　(株)アイケーディ
℡059-225-7117

現場代理人　石田　義信

監理技術者　後藤　博伸

3ヶ月予定工程

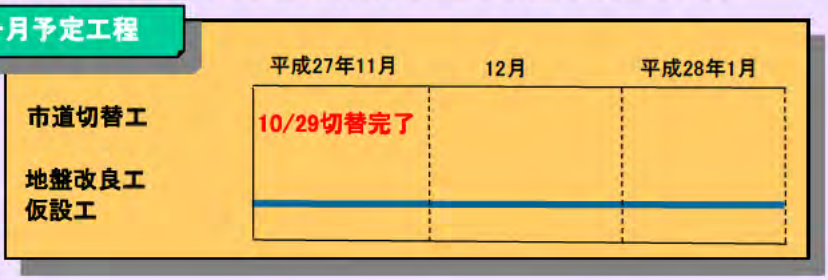

④　平成27年度　23号中勢道路整備工事

11工区県道久居線　（乗り入れ）

整備内容は、車道と歩道を分離するブロックを設置し
道路の整備を行います。
先月の予定より少し遅れましたが、
平成27年11月中旬に整備を行う予定です。

12工区相川高架橋下整備

整備内容は、農道及び高架橋の下の整備を行います。
平成27年11月中旬から準備作業に入り、引き続き
工事を行う予定です。

施工者　㈱松本組
TEL0598-42-2266

現場代理人　川口　直也

監理技術者　羽根　俊幸

3ヶ月予定工程

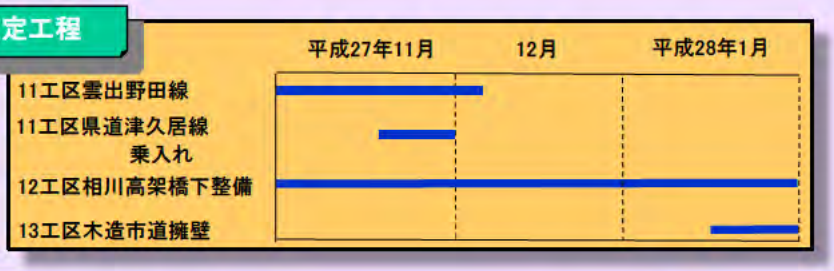

⑤　平成２７年度　２３号越知地区道路建設工事

中ノ川合流部

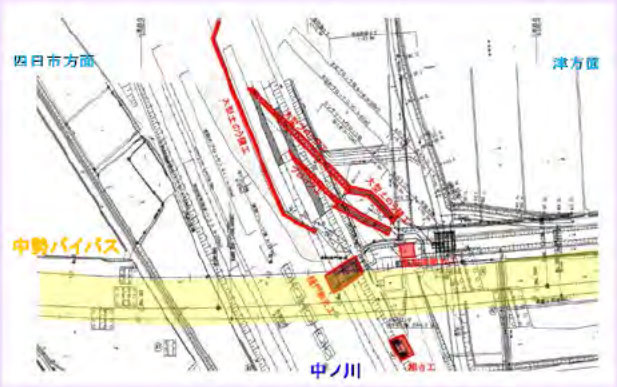

中ノ川合流部分に大型土のうを設置して、合流部分の護岸の施工をしていきます。

施工者　三重農林建設㈱
TEL059-395-6582
（現場事務所）

現場代理人　榊原　義之

監理技術者　西川　保

3ヶ月予定工程

⑥　平成２７年度　２３号中ノ川高架橋下部左岸工事

NO.３４６～NO.３５０付近（県道鈴鹿環状線～中ノ川）

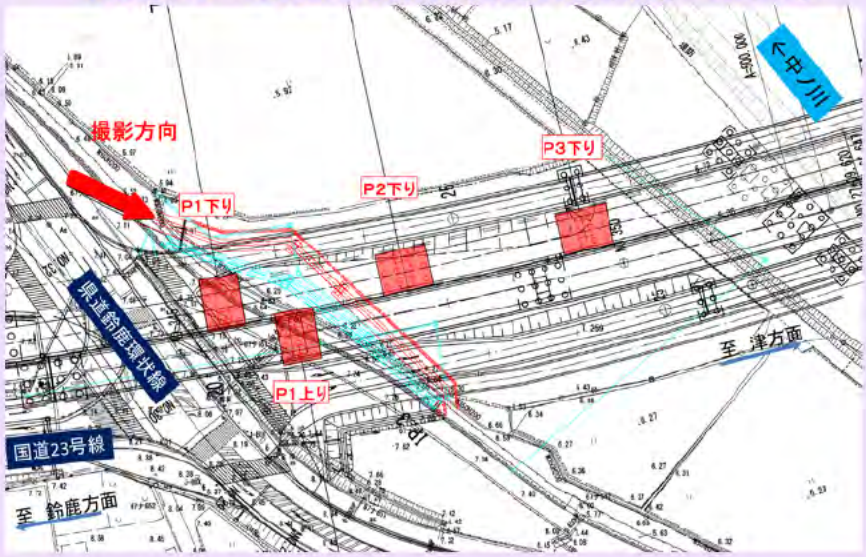

この度、中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽの中ノ川高架橋の下部工事をします日本土建㈱です。
工事は安全第一で進めていきますので、よろしくお願いします。
工事内容は中ノ川左岸部において現在の水路を仮設水路に切り回し後、
４橋脚の下部工事を作業していきます。
工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、
ご理解と御協力を賜りますようお願い致します。

施工者　日本土建(株)
TEL059-229-5656

現場代理人　山門　直樹

監理技術者　堀本　和宏

3ヶ月予定工程

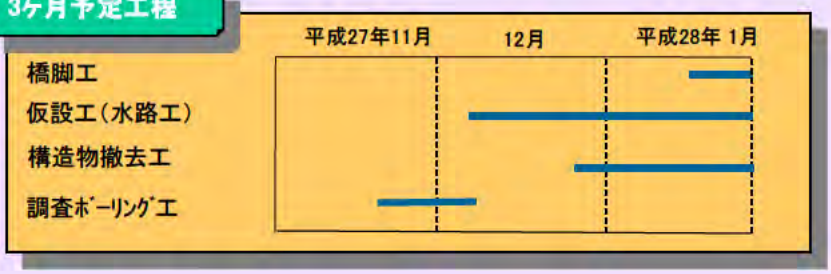

⑦　平成２７年度　２３号中勢BP整備工事

この度、中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽの整備工事を行うこととなりました東海土建㈱です。
施工範囲は、鈴鹿市北玉垣町～松阪市小津町（L=33.8km）となります。
施工期間中は、安全第一を考えて施工を進めていきますので、これから宜しくお願い致します。
現在は各所の準備を行っており、12月初旬から5工区(稲生)側道整備・12工区バイパス本線
歩道の側溝蓋設置を行っていく予定です。

５工区(稲生) 中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道整備

主な工事内容は、側道において張コンクリート(防草対策)、
排水工及び歩道・車道舗装です。
施工時期は、平成27年12月初旬からを予定しております。

６工区(御薗) 中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道 排水管設置

主な工事内容は、横断ボックス(トンネル）東側出入口に
おいて排水管設置です。
施工中、一時通行止めを行いますので、日程決まり次第
地域住民の方々に連絡させていただきます。
施工時期は、平成27年12月中旬からを予定しております。

12工区(野田～久居野村)中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽ歩道 蓋設

主な工事内容は、中勢バイパス本線歩道おいて側溝の
蓋設置です。
施工時期は、平成27年12月初旬からを予定しております。

12･13工区(木造)前田川排水機場 掘削

主な工事内容は、前田川排水機場において仮設道路撤去に
伴う掘削です。
施工時期は、平成27年12月中旬からを予定しております。

施工者　東海土建㈱
TEL059-227-6101

現場代理人　若林　孝幸

監理技術者　巾　勇次

3ヶ月予定工程

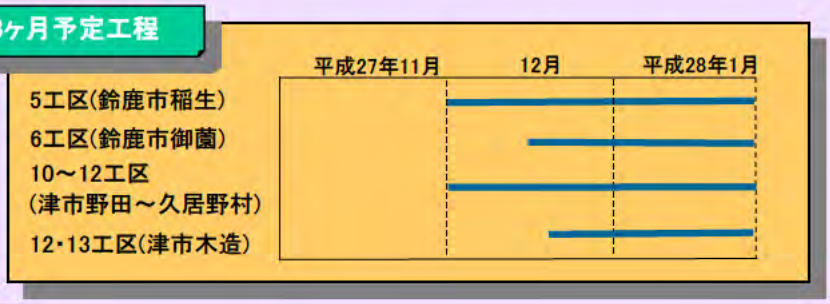

現場見学会のご案内

旬な現場をご案内します。

「土木技術の伝承を目指して！
～昴学園高校の学生が中勢バイパスの現場を見学～」

（一社）三重県建設業協会主催”平成２７年度　高校生建設現場見学会”第２弾が開催されました。

平成２７年１１月９日（月）に三重県立昴学園高等学校の総合学科・環境技術系列２、３年生36名が中勢バイパスの鈴鹿市御薗町から越知町地内で工事を行っている地盤改良工・場所打ち杭の現場を見学しました。
見学の様子について、建通新聞に掲載されました。また、FM三重の取材もお越し頂きました。FM三重の放送は来年早々になる予定です。

地盤改良工の説明を聞く学生

スランプ試験を体験する学生

三重河川国道事務所　鈴鹿国道出張所では、現場見学会を行っております。
普段は、なかなか目にする事の出来ない工事現場を公開します。
道路と皆さんの暮らしの関係を現場で実感してしませんか？
詳しい情報・お問い合わせは、三重河川国道事務所ホームページをご覧頂きますか、お電話下さい。

中部地方整備局　ホームページ「現場へ行こう　旬な現場」
http://www.cbr.mlit.go.jp

また、今後の予定は下記の通りとなっております。

平成27年10月20日	(火)	近畿大学工業高等専門学校　4年生　様	実施済
10月28日	(水)	東海工業専門学校　金山校　様	
10月30日	(金)	三重県市町工事検査担当者　様	
11月9日	(月)	三重県立昴学園高等学校　2・3年生　様	
11月19日	(木)	三重県立相可高等学校　2年生　様	
11月25日	(水)	建設ＩＣＴ現場見学会	
平成28年1月16日	(土)	鈴鹿市立天名小学校　様	

施工箇所見取図

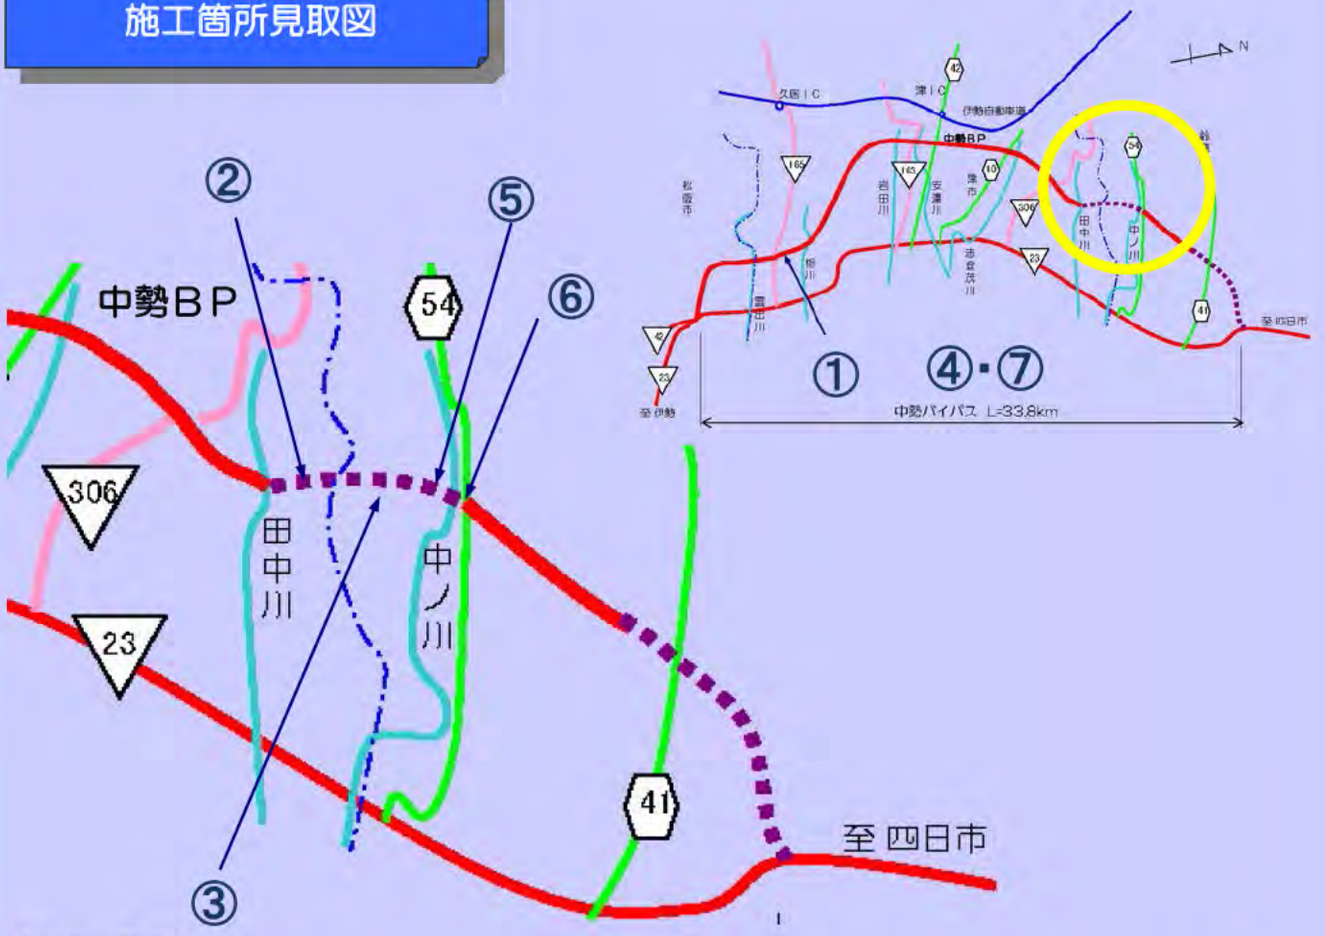

【工事一覧表】

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
1	H26 23号鈴鹿・津地区道路建設工事	H28.3.18	橋梁下部工･排水工・除草	三重農林建設㈱
2	H26 23号鈴鹿・津地区整備工事	H28.2.29	道路土工・ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	三重農林建設㈱
3	H26 23号鈴鹿地区道路建設工事	H28.2.29	地盤改良工	㈱アイケーディ
4	H27 23号中勢道路整備工事	H28.3.18	遮音壁工・排水工・土工	㈱松本組
5	H27 23号越知地区道路建設工事	H28.11.30	水路付替え工・歩道橋下部工	三重農林建設㈱
6	H27 23号中ノ川高架橋下部左岸工事	H28.12.15	橋梁下部工	日本土建㈱
7	H27 23号中勢ＢＰ整備工事	H28.3.25	法面工・排水工・防護柵工・除草	東海土建㈱

【連絡先】
三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
〒510-0234　鈴鹿市江島本町39-8
tel 059-387-8470 fax 059-387-8471
または
中勢ＢＰ工事連絡協議会事務局　（三重農林建設㈱内）
tel 059-232-0603

中部地方整備局 三重河川国道事務所 ホームページ
http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/

国土交通省

※本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、天候その他の事情により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
