一般国道２３号　中勢バイパス　現場情報
Vol.57
2015年度12月号

ちゅうばす通信

中勢ＢＰ連絡協議会

今年もいよいよ押し迫り、さぞお忙しい事と存じますが、皆様にはご健勝のこととお喜び申し上げます。工事の工程は相変わらずの晴天に恵まれまして、現場は順調に進んでおります。先月末には「平成27年度２３号御薗地区道路建設工事」の契約を信藤建設(株)と結びました。本格的に現場に入るのは、来年に入ってからになりますが準備工としまして草刈りなどを行っていきます。ご迷惑をおかけする事もありますがよろしくお願いします。

巨大オクラ以来、手を付けずにいたプランターですが、先月末にチューリップの球根を植え付けました。総数20個。4色を適当に配置したのでどんな風に咲くのか楽しみです。

できれば、クリスマス期間に合わせて葉ボタンなどをと思いましたが、春に咲くチューリップを想像すると冬の時期は我慢しようと思います。

その代わりに室内用に鉢植えを買いました。上の写真です。←鉢には入れていません。

左の写真はＵＳＪのハリーポッターのホグワーツ城です。よく見てもらうとわかりますが、上側の色の濃い方が池に映った画です。逆さまにしています。これほど綺麗に写るとは思いませんでした。
正しく「逆さ富士」のようですね。

下の2枚は大阪の名物！誰が撮っても絵になりますね。

①　平成２６年度　２３号鈴鹿・津地区道路建設工事

鈴鹿市御薗工区(中ノ川左岸)

鈴鹿市御薗工区(中ノ川左岸)

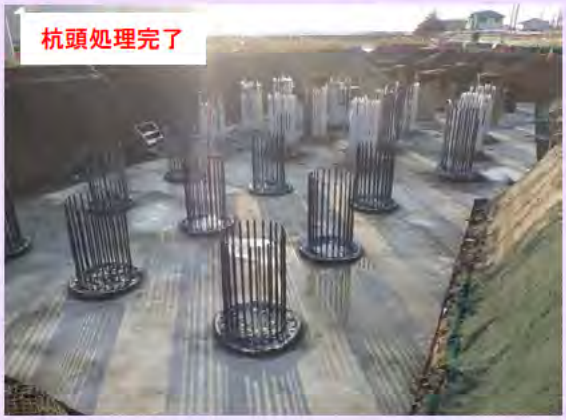

中勢バイパス鈴鹿市御薗工区において橋台工・橋脚工を行っております。
11月に場所打杭の施工が完了し、現在杭頭処理を行っています。12月から2月下旬まで橋台及び橋脚の施工を予定してます。ご協力よろしくお願いします。

施工者　三重農林建設㈱
℡059-232-0603

現場代理人　大家　裕貴

監理技術者　小島　久典

3ヶ月予定工程



②　平成２６年度　２３号鈴鹿・津地区整備工事

本線NO.495付近（終点側）
12月9日現在

本線NO.467付近（起点側）
ボックスカルバート施工箇所

中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽの整備工事をします三重農林建設(株)です。工事は安全第一で進めていきますので、よろしくお願いします。工事内容は三行地区で区間約0.6ｋｍの工事用道路作る作業していきます。
現在終点より工事用道路の掘削・土の搬出作業を進めていきます。12月8日に地盤改良作業が終わり、カルバート工の作業を進めて行います。

施工者　三重農林建設㈱
℡059-232-0555

現場代理人　内田　啓介

監理技術者　青木　則正

3ヶ月予定工程



③　平成２６年度　２３号鈴鹿地区道路建設工事

地盤改良工

㈱アイケーディです。
現在地盤改良工は深いところの改良が完了し、上部改良の構築準備を行っています。
上部の改良は1月中旬から2月にかけて行う予定です。改良にあたっては粉塵の抑制等につとめて施工してまいります。

断面図



施工者　㈱アイケーディ
TEL059-225-7117

現場代理人　石田　義信

監理技術者　後藤　博伸

3ヶ月予定工程



④　平成２７年度　２３号越知地区道路建設工事

中ノ川合流部

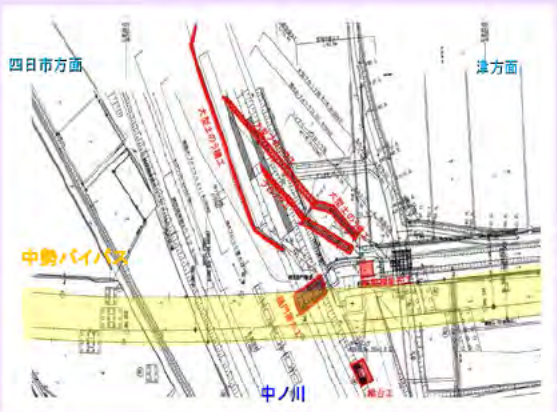

中ノ川合流部分に大型土のうを設置して、合流部分の護岸と歩道橋の橋台をつくっています。

施工者　三重農林建設㈱
TEL059-395-6582
（現場事務所）

現場代理人　榊原　義之

監理技術者　西川　保

3ヶ月予定工程

⑤　平成27年度　23号中勢道路整備工事

11工区県道久居線（乗り入れ）

作業は90%が完了しています。今後の作業は、コンクリートの型枠を撤去して、埋戻しを行って完了となります。通行された方々には、ご迷惑をお掛けしました事を厚くお礼申し上げます。

12工区相川高架橋下整備

11月末から作業を開始しました。現在は、流末の水路を先行し作業を行っております。年内は、排水構造物を中心に作業を行っていく予定です。

12工区野村街道交差点 遮音壁

交差点から側道へ向いて遮音壁を設置し、道路周辺の整備を行います。
平成28年1月末頃から施工を行う予定です。

13工区木造市道擁壁

バイパス建設工事の際、工事車両の通行に利用させていただいていた道路を整備します。
平成28年1月末頃から整備を行う予定です。
交通規制等を伴う工事で地域住民の方にご迷惑をおかけしますが、宜しくお願いします。

3ヶ月予定工程

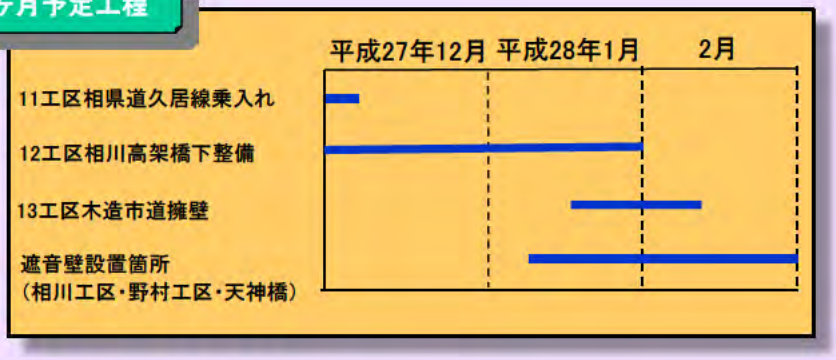

施工者　㈱松本組
TEL0598-42-2266

現場代理人　川口　直也

監理技術者　羽根　俊幸

⑥　平成２７年度　２３号中ノ川高架橋下部左岸工事

NO.３４６～NO.３５０付近（県道鈴鹿環状線～中ノ川）

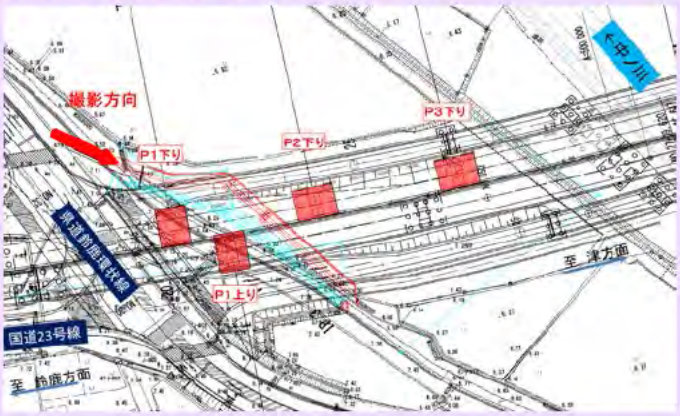

日本土建㈱です。工事は安全第一で進めていきますので宜しくお願いします。12月は仮設水路の埋設部分を施工します。
1月は残りの仮設水路関係を進め、1月末頃から場所打杭工を施工する予定です。
工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解と御協力を賜りますようお願い致します。

施工者　日本土建㈱
TEL059-229-5656

現場代理人　山門　直樹

監理技術者　堀本　和宏

3ヶ月予定工程

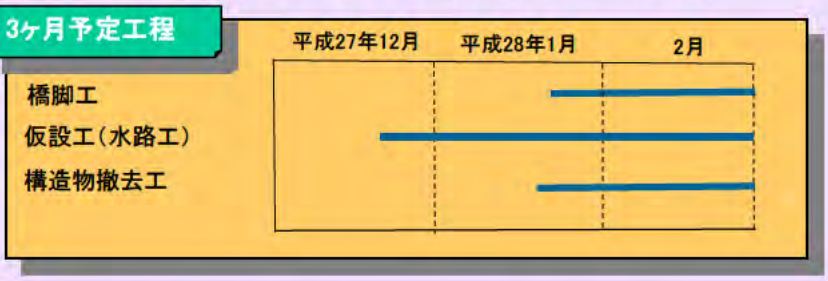

⑦　平成２７年度　２３号中勢BP整備工事

５工区(稲生) 中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道整備

側道各所において除草後、張コンクリート(防草対策)
排水工及び歩道・車道舗装です。
施工時期は、平成27年12月中旬からを予定して
おります。

６工区(御薗) 中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道 排水管設置

横断ボックス(トンネル）東側出入口において
排水管設置です。
施工時期は、平成28年1月中を予定しております。

施工者　東海土建㈱
TEL059-227-6101

現場代理人　若林　孝幸

監理技術者　巾　　勇次

3ヶ月予定工程

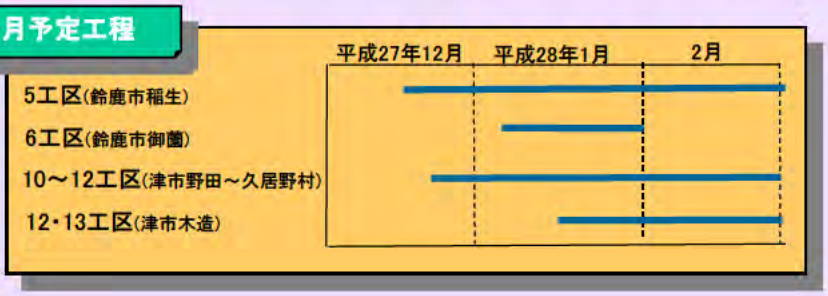

施工箇所見取図

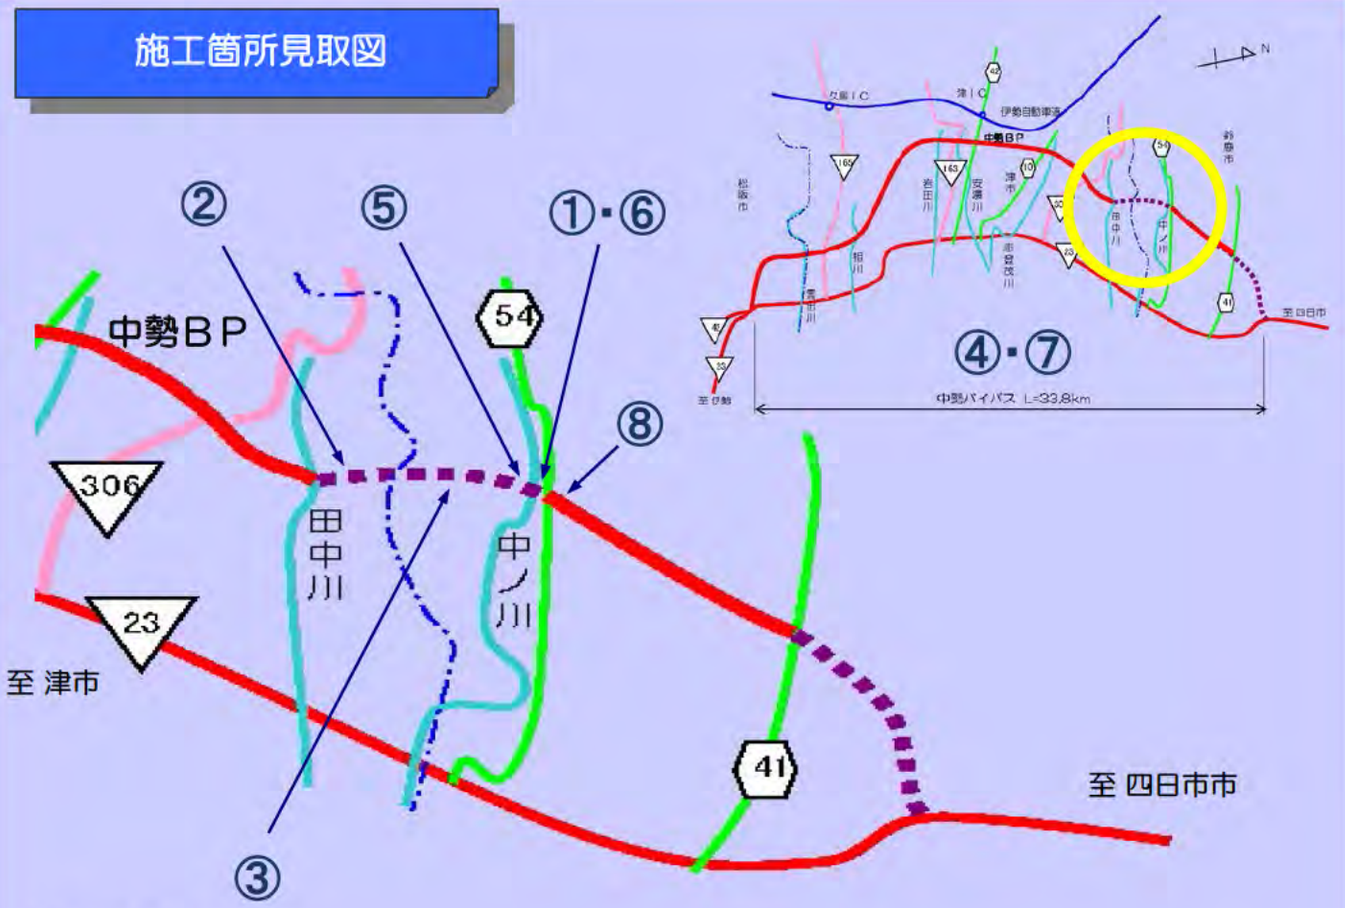

【工事一覧表】

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
1	H26 23号鈴鹿・津地区道路建設工事	H28.3.18	橋梁下部工･排水工・除草	三重農林建設㈱
2	H26 23号鈴鹿・津地区整備工事	H28.2.29	道路土工・ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	三重農林建設㈱
3	H26 23号鈴鹿地区道路建設工事	H28.2.29	地盤改良工	㈱アイケーディ
4	H27 23号中勢道路整備工事	H28.3.18	遮音壁工・排水工・土工	㈱松本組
5	H27 23号越知地区道路建設工事	H28.11.30	水路付替え工・歩道橋下部工	三重農林建設㈱
6	H27 23号中ノ川高架橋下部左岸工事	H28.12.15	橋梁下部工	日本土建㈱
7	H27 23号中勢ＢＰ整備工事	H28.3.25	法面工・排水工・防護柵工・除草	東海土建㈱
8	H27 23号御薗地区道路建設工事	H28.9.30	地盤改良工・擁壁工	信藤建設㈱

【連絡先】
三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
〒510-0234　鈴鹿市江島本町39-8
tel 059-387-8470　fax 059-387-8471
または
中勢ＢＰ工事連絡協議会事務局　（三重農林建設㈱内）
tel 059-232-0603

中部地方整備局 三重河川国道事務所 ホームページ
http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/

国土交通省

※本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、天候その他の事情により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
