一般国道２３号　中勢バイパス　現場情報

ちゅうばす通信

Vol.59
2015年度2月号

中勢ＢＰ工事連絡協議会

長い冬もいよいよ終りに近づいてきましたが、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

バレンタインデーの２月１４日は季節外れの記録的な暖かさでした。私も外に出るときには春のような格好で歩いていました。その陽気のせいなのか、庭の「わびすけ」の花が咲き始めていました。椿の一種みたいですが「わびすけ」というそうです。家人から教えてもらいました。

出張所でプランターに植えたチューリップも芽が出たのですが、２週間くらいたってもなかなか大きくなりません。まだまだ寒くなるからなのか・・・栄養が足りないからなのか・・・。来月号で綺麗に咲いた花を届けたいのですが､間に合わないみたいです。

工事は、いよいよ最後の追込みにはいりました。この１ヶ月の間、現場がフル稼働する工事がたくさんあります。交通事故や工事事故を起こすことのないように、気を引き締めて進めていきますのでご協力をお願いします。

珍風景

珍風景ではないですが､鈴鹿市役所に行った時に同行者から言われて気づいた事が！！

写真のようにエレベーターの押しボタンの３Ｆ表示がありませんでした。４階とか１３階といった「忌み数」はないエレベーターに乗ったことはあるのですが､飛ばしてあるのが多いです。このエレベーターにはボッチはついています。

早速聞いたところ「３階は書庫になっているから一般の人が使用しないので表示がない」との事でした。あっさり解決！

① 平成26年度　23号鈴鹿・津地区道路建設工事

鈴鹿市御薗工区(中ノ川左岸)

鈴鹿市御薗工区(中ノ川左岸)

中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽ鈴鹿市御薗工区において橋台工・橋脚工を行っております。
現在、橋台・橋脚の躯体工事が完了し、2月下旬から埋戻し作業となります。埋戻し完了後、
3月上旬に堤防道路の復旧を行い、工事完了となります。引き続き、ご協力宜しくお願いします。

施工者　三重農林建設㈱
TEL059-232-0603

現場代理人　大家　裕貴

監理技術者　小島　久典

3ヶ月予定工程



② 平成26年度　23号鈴鹿・津地区整備工事

本線NO.495付近（終点側）
2月10日現在

本線NO.467付近（起点側）
ボックスカルバート施工箇所

中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽの整備工事をします三重農林建設(株)です。工事は安全第一で進めていきますので、宜しく
お願いします。工事内容は三行地区で区間約0.6ｋｍの工事用道路作る作業していきます。現在終点側より
工事用道路の掘削・土の搬出作業を進めていきます。起点側で、カルバート工の作業を進めています。

施工者　三重農林建設㈱
TEL059-232-0555

現場代理人　内田　啓介

監理技術者　青木　則正

3ヶ月予定工程

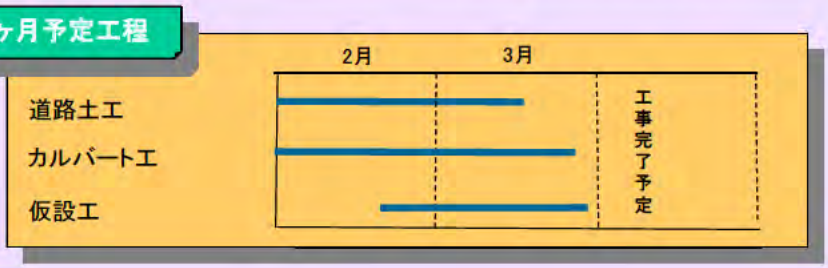

③ 平成26年度　23号鈴鹿地区道路建設工事

地盤改良工

NO.384付近
深いところの改良が済んだ様子

㈱アイケーディです。
深いところの地盤改良工の上部改良を2月に行い、完了となります。その後３月には整正および片付けを行い中旬に工事完了予定となります。関係各所および周辺近隣の皆様にはお世話になりました。最後まで安全作業で行いますのでよろしくお願いします。

断面図



施工者　㈱アイケーディ
TEL059-225-7117

現場代理人　石田　義信

監理技術者　後藤　博伸

3ヶ月予定工程

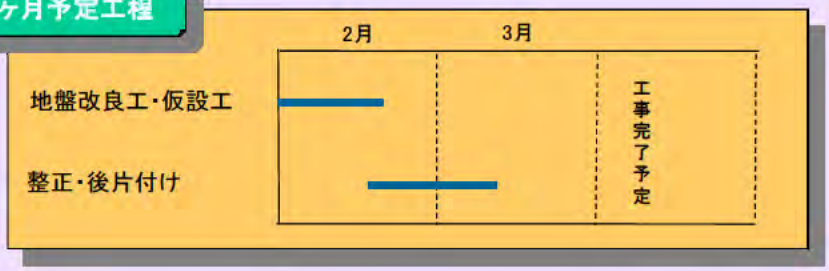

④ 平成27年度　23号中勢道路整備工事

12工区相川高架橋下整備

㈱松本組です。
この工区の工事も終盤に差し掛かってきました。
現在は、農道の復旧工事を先行し行っております。
今後も継続して資材を搬入するトラック等が現場周辺道路を通行し、地域住民の方にご迷惑をおかけする事があると思いますが、工事が完了するまでの間は、ご協力の程、宜しくお願い致します。

3ヶ月予定工程

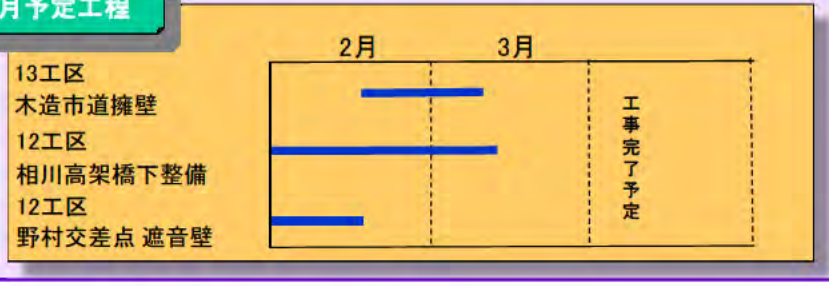

施工者　㈱松本組
TEL0598-42-2266

現場代理人　川口　直也

監理技術者　羽根　俊幸

⑤ 平成27年度　23号越知地区道路建設工事

中ノ川合流部

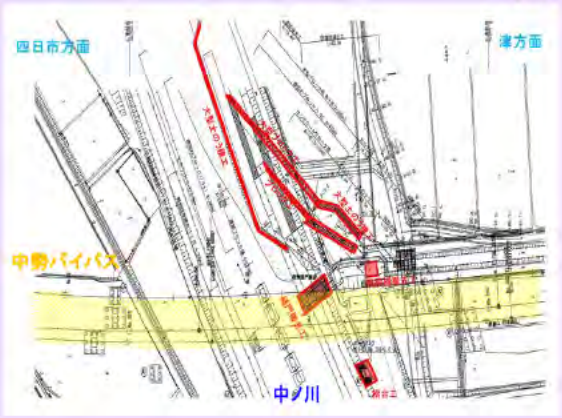

中ノ川合流部分に大型土のうを設置して、既設水路切り替えと歩道橋の橋台をつくっています。

施工者　三重農林建設㈱
℡059-395-6582
（現場事務所）

現場代理人　榊原　義之

監理技術者　西川　保

3ヶ月予定工程

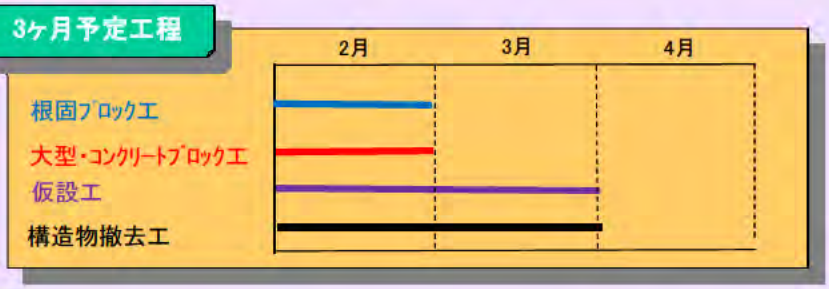

⑥ 平成27年度　23号中ノ川高架橋下部左岸工事

NO.３４６～NO.３５０付近（県道鈴鹿環状線～中ノ川）

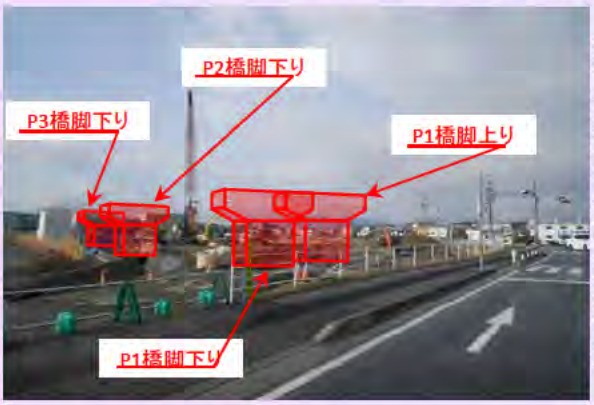

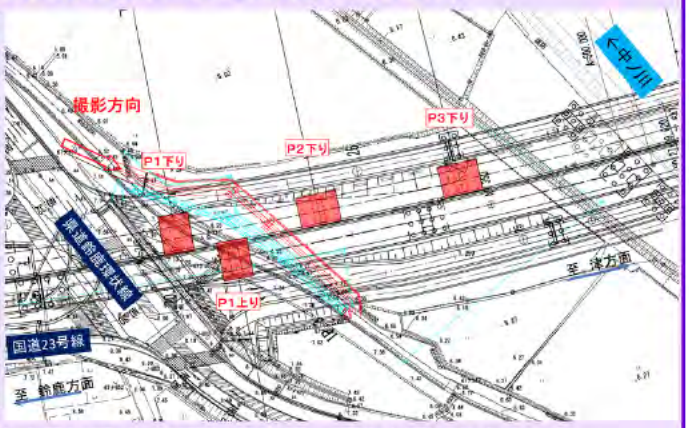

中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽの中ノ川高架橋の下部工事をします日本土建㈱です。工事は安全第一で進めていきますので、よろしくお願いします。仮設水路関係は完了し、場所打杭工を施工中です。3月中旬頃完了予定です。続いて、仮締切→掘削（橋脚）と進めて行きます。工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解と御協力を賜りますようお願い致します。

施工者　日本土建㈱
℡059-229-5656

現場代理人　中川　基司

監理技術者　堀本　和宏

3ヶ月予定工程

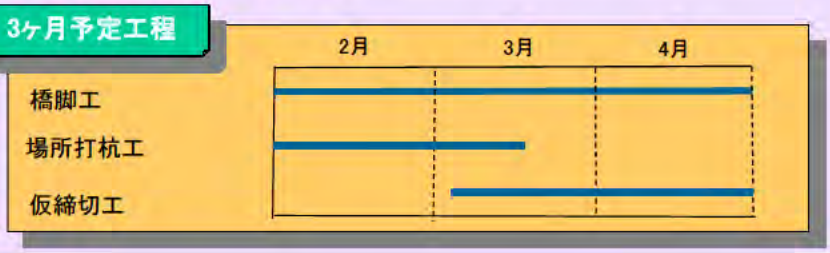

⑦ 平成27年度　23号中勢BP整備工事

5工区(鈴鹿市稲生) 中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道整備

側道各所において張コンクリート(防草対策)・
排水工・防護柵及び歩道・車道舗装です。
平成28年1月下旬から引き続き施工しております。

12工区(久居野村)中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽ横断歩道橋 柵・照明設置

中勢バイパス横断歩道橋おいて、投下防止柵及び
照明設備設置です。施工時期は、平成28年2月下旬
からを予定しております。

施工者　東海土建㈱
℡059-227-6101

現場代理人　若林　孝幸

監理技術者　巾　勇次

3ヶ月予定工程

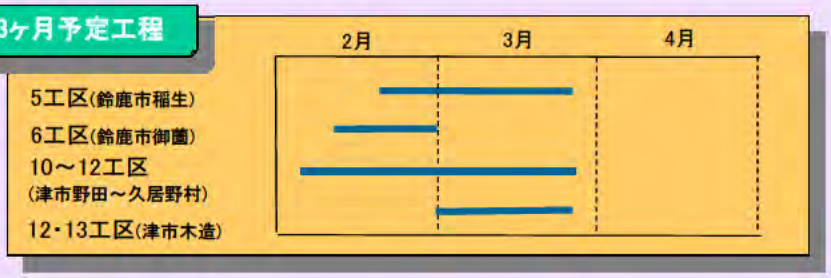

⑧ 平成27年度　23号御薗地区道路建設工事

御薗地区の道路建設工事をしています信藤建設㈱です。
現在現場の方は調査工が完了しまして修正設計中です。修正設計が終わり次第(2月末予定)
地盤改良仮設工(土工)を行い、3月末頃から地盤改良の施工を行っていく予定です。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

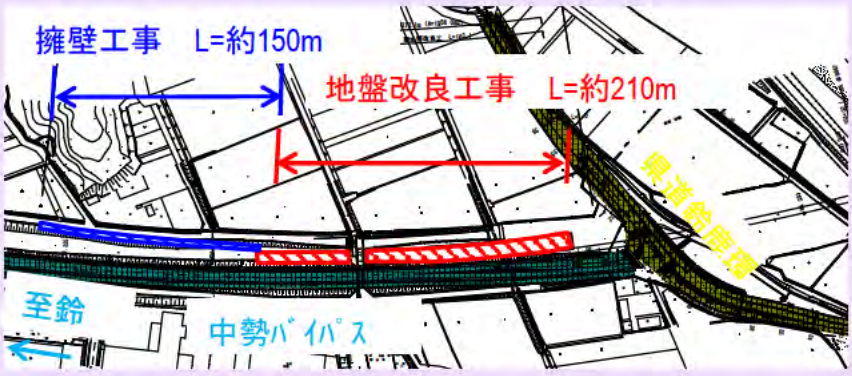

施工者　信藤建設㈱
℡059-345-3171

現場代理人　岡田　憲彦

監理技術者　岡田　憲彦

3ヶ月予定工程

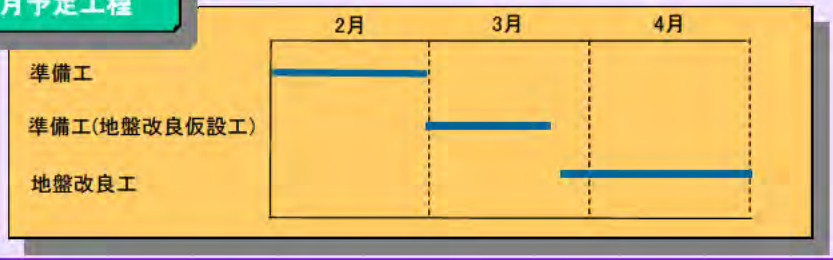

施工箇所見取り図

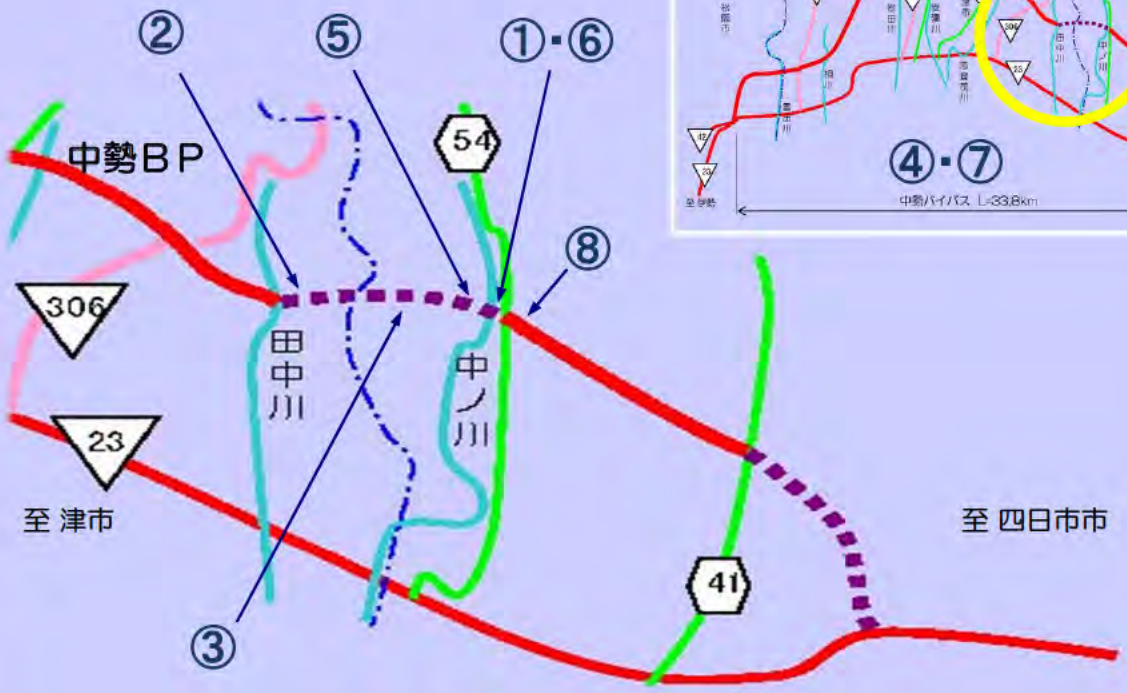

【工事一覧表】

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
1	H26 23号鈴鹿・津地区道路建設工事	H28.3.18	橋梁下部工･排水工・除草	三重農林建設㈱
2	H26 23号鈴鹿・津地区整備工事	H28.3.29	道路土工・ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	三重農林建設㈱
3	H26 23号鈴鹿地区道路建設工事	H28.3.22	地盤改良工	㈱アイケーディ
4	H27 23号中勢道路整備工事	H28.3.18	遮音壁工・排水工・土工	㈱松本組
5	H27 23号越知地区道路建設工事	H28.11.30	水路付替え工・歩道橋下部工	三重農林建設㈱
6	H27 23号中ノ川高架橋下部左岸工事	H28.12.15	橋梁下部工	日本土建㈱
7	H27 23号中勢ＢＰ整備工事	H28.3.25	法面工・排水工・防護柵工・除草	東海土建㈱
8	H27 23号御薗地区道路建設工事	H28.9.30	地盤改良工・擁壁工	信藤建設㈱

【発行】【連絡先】
国土交通省　三重河川国道事務所　鈴鹿国道出張所
〒510-0234　鈴鹿市江島本町39-8
tel：059-387-8470　fax：059-387-8471
または
中勢ＢＰ工事連絡協議会事務局（三重農林建設(株)内）
tel：059-232-0603

国土交通省

国土交通省　中部地方整備局 三重河川国道事務所 ホームページ
http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/

道路の異常を発見したら・・・
*道路緊急ダイヤル　**＃9910**（通話料無料・２４時間受付）*

※本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、天候その他の事情により
変更となる場合がありますので 、あらかじめご了承願います。
